



Gobernación de
NARIÑO



Gobernación de
NARIÑO

Seguimiento al cumplimiento de metas
de Plan de Desarrollo Departamental
y ejecución del presupuesto de
inversión.

Vigencia 2025 con corte a Octubre sin
cierre.



Gobernación de
NARIÑO

PDD 2024 - 2027

\$ PF
PPI

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

VIGENCIA: 2024-2027

TOTAL DE METAS: 623

\$ PPI

PLAN INDICATIVO

VIGENCIA

TOTAL METAS
PROGRAMADAS

2024

540

2025

606

2026

601

2027

584

Presupuesto

POAI

PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA

TOTAL METAS
PROGRAMADAS

% EJECUCIÓN

2024

540


81,9%

2025


606

61,62%

INDICATIVO (METAS PROGRAMADAS)

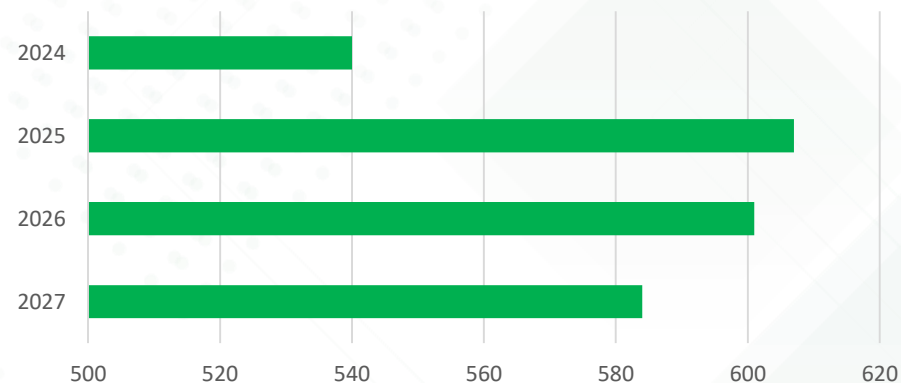

Metas programadas para la vigencia 2025 por Dependencia




PDD - METAS 2025

Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Metas programadas 2025	% de ejecución física
606	67,36%



Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025 AVANCE PLAN DE DESARROLLO POR NUMERO DE METAS


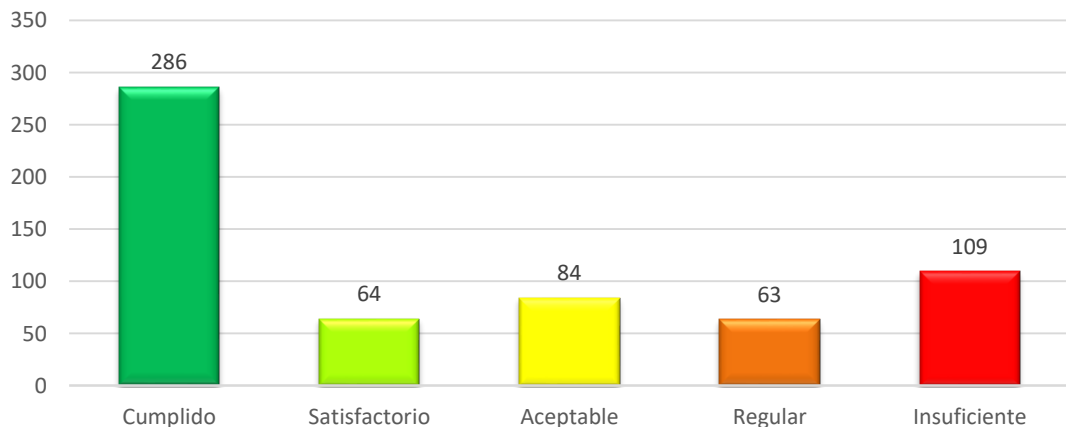


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

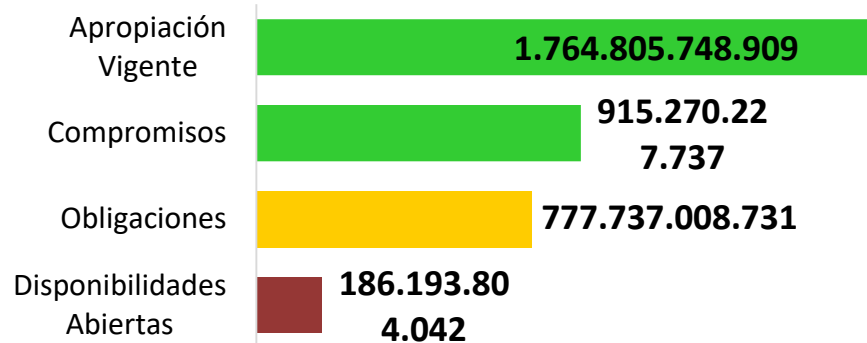

Ejecución Presupuestal Octubre

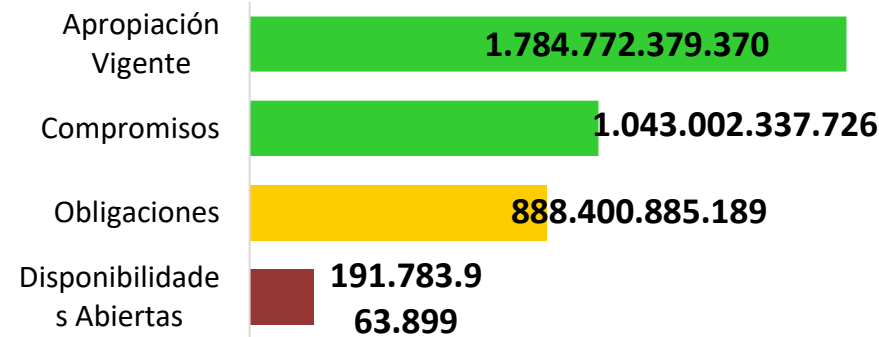

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Avances de las metas en la vigencia 2025 Corte a Octubre (sin cierre).

Reporte por dependencias y entidades departamentales.



Gobernación de
NARIÑO

Programa Educación Superior

Programa Educación Superior


Corte a Octubre (sin cierre) de 2025

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
15	0%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SECRETARIA DE EDUCACION - SUPERIOR


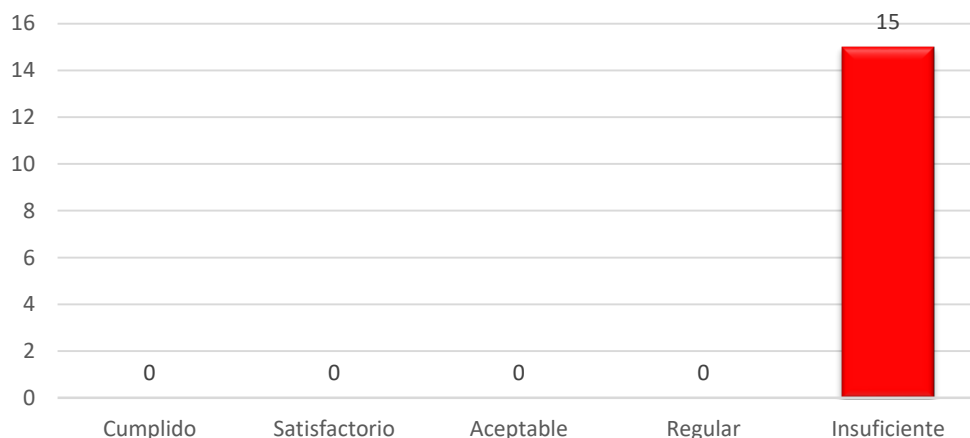


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

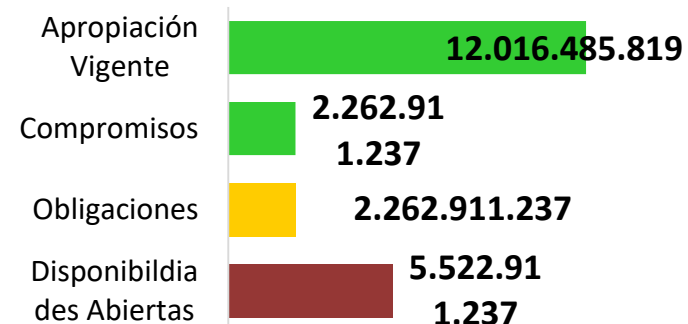

Ejecución Presupuestal Octubre

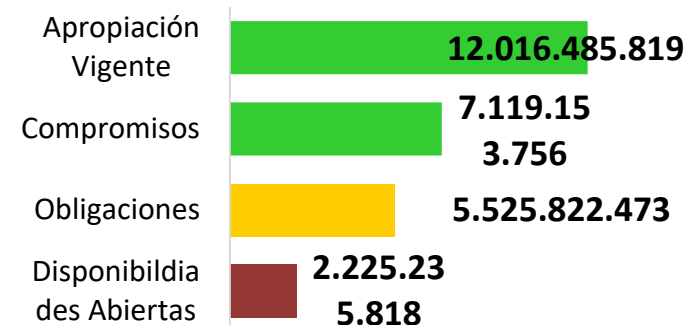

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Infraestructura – Oficina Vivienda

Secretaría de Infraestructura – Oficina Vivienda


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
12	16,19%

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025


Estado de las metas 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE VIVIENDA

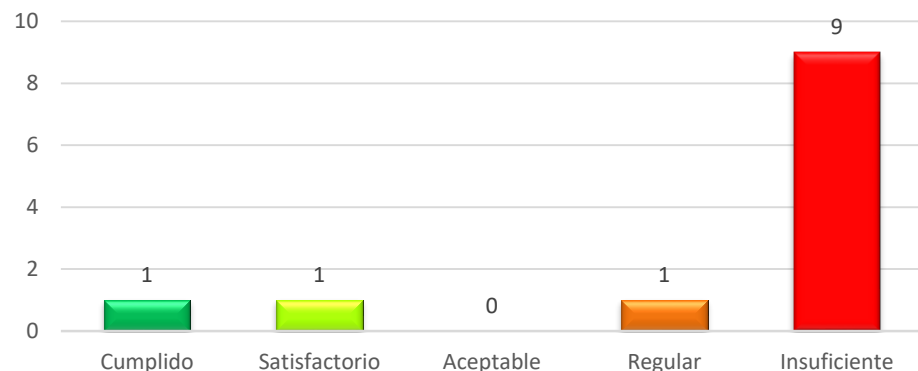


Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

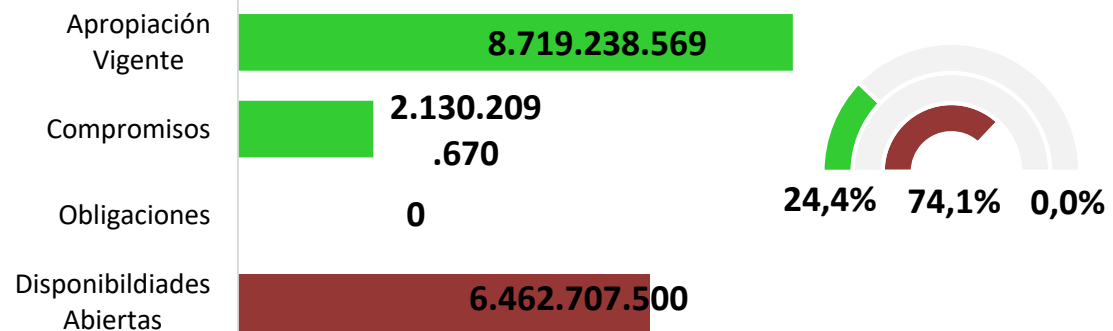

Ejecución Presupuestal Octubre

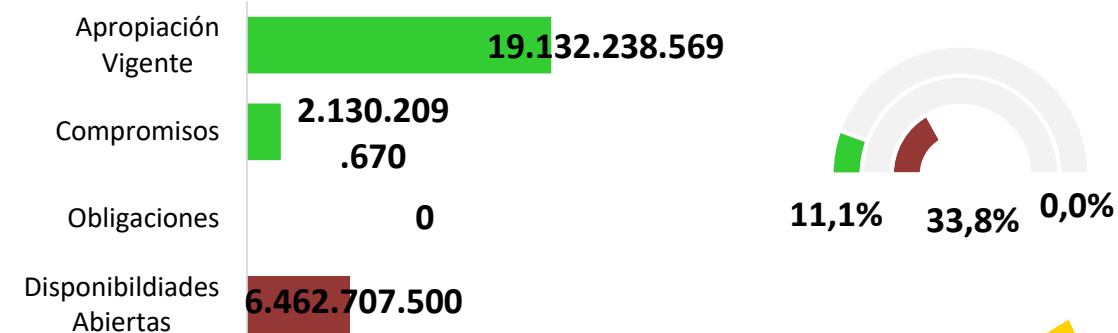

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Infraestructura




Secretaría de Infraestructura

Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
26	25,50%




Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



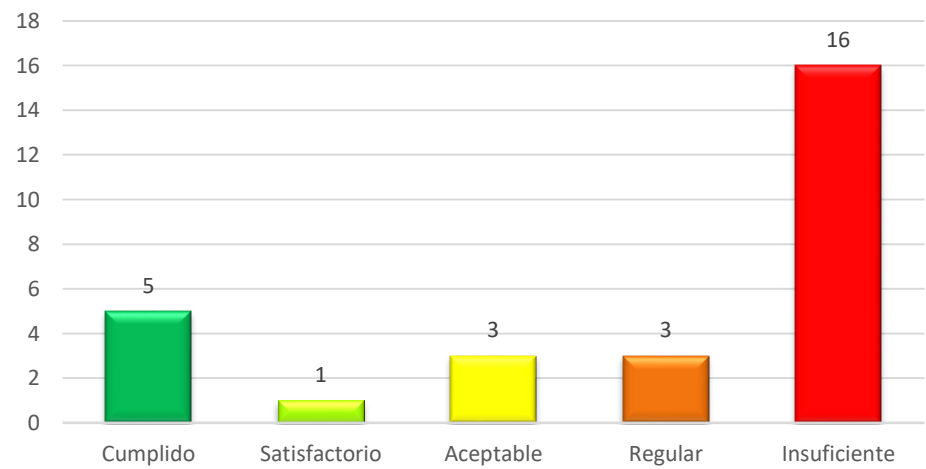


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

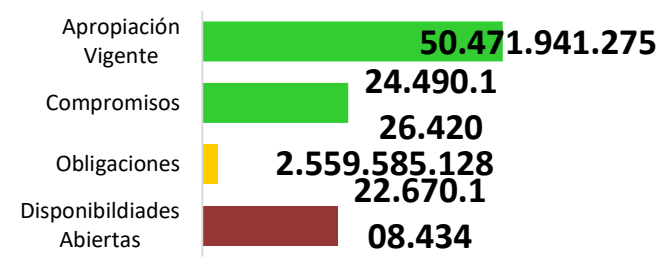

Ejecución Presupuestal Octubre

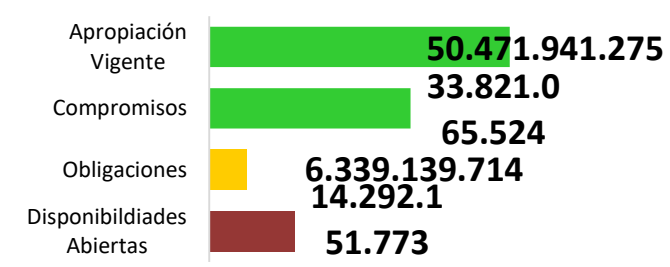

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Despacho


Despacho

Corte a Octubre (sin cierre) de 2025


SECTOR	BPIN	NOMBRE PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES
Agua Potable	2024003520140	Mejoramiento del suministro de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Nariño	\$2.500.000.000,00	\$237.247.963,83	\$2.443
Salud	2024003520141	Mejoramiento de la política sanitaria en el departamento de Nariño	\$2.500.000.000,00	0,00	\$650.000.000
Educación	2024003520142	Construcción , mejoramiento, adecuación de infraestructura educativa y dotación de los establecimientos educativos del Departamento de Nariño	\$4.290.000.000,00	\$3.056.925.000,00	\$865.872.699
Educación	2024003520152	Construcción de infraestructura educativa en los establecimientos educativos del Departamento Nariño	\$13.794.953.881,37	\$3.787.779.752,27	0,00
Deportes	2024003520143	Adecuación , reparación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos para el 2025 en el departamento de Nariño	\$13.894.874.712,01	\$699.999.996,00	\$10.330.302.155
TOTALES			\$36.979.828.593,4	\$7.781.952.712,10	\$20.644.370.902

Fuente: POAI,
2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

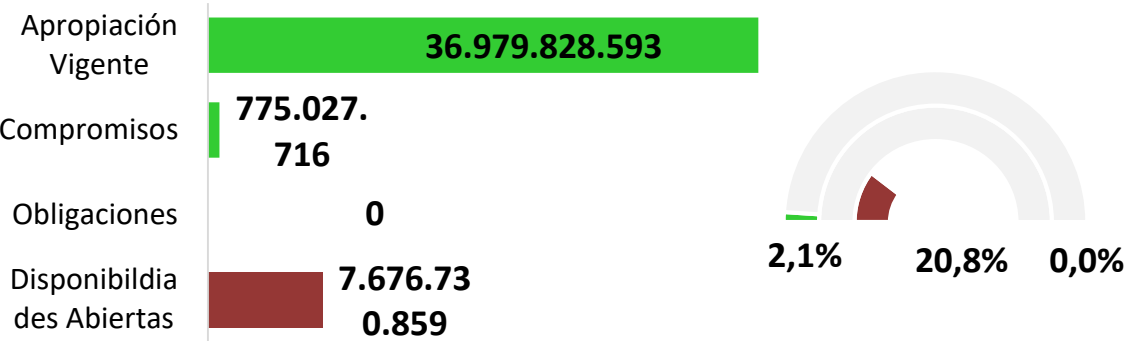

Ejecución Presupuestal Octubre

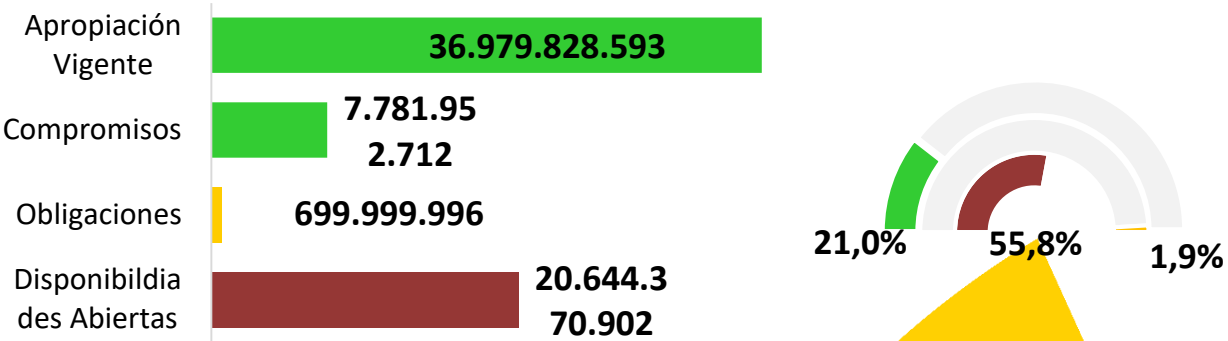

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre
2025



Gobernación de
NARIÑO

Subsecretaría de Minas y Energías

Subsecretaria de Minas y Energías


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
15	32,89%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025


Estado de las metas 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - SUBSECRETARÍA MINAS Y ENERGÍA

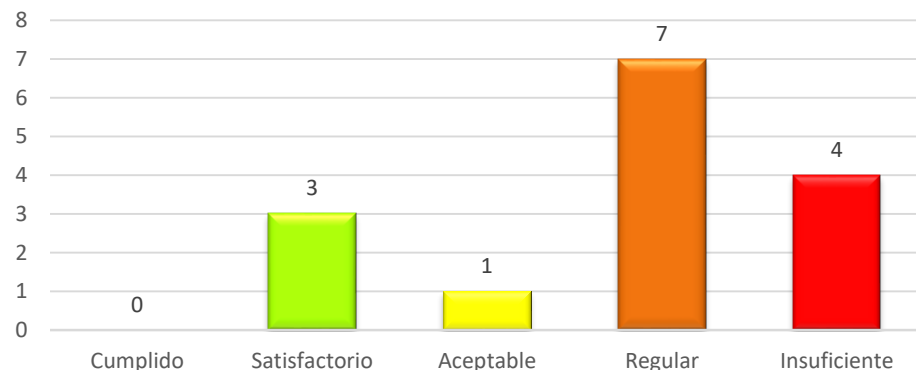


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

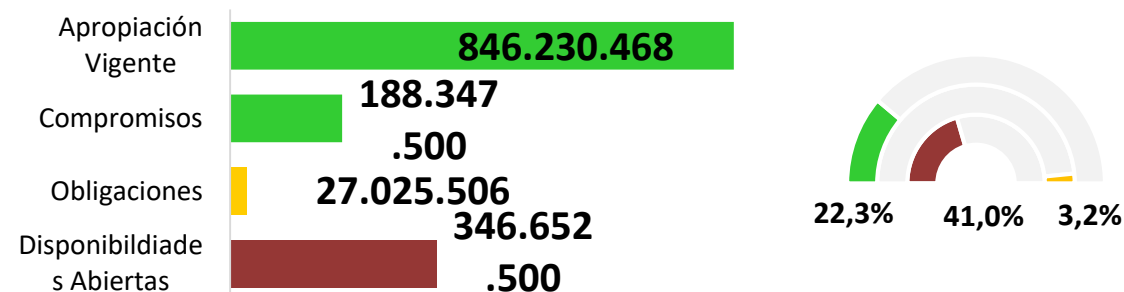

Ejecución Presupuestal Octubre

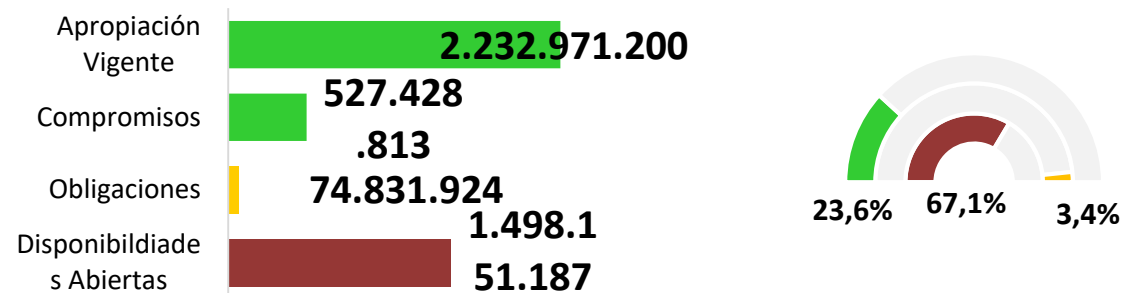

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Tránsito



Subsecretaría de Tránsito


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
5	40%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SUBSECRETARIA DE TRANSITO


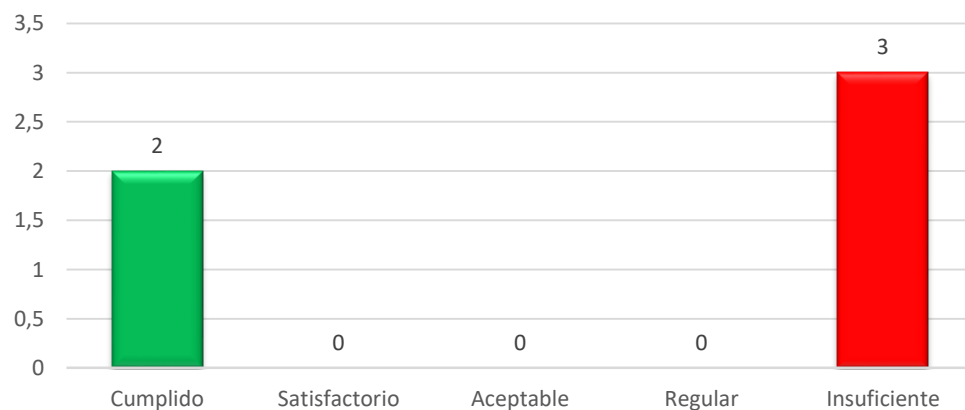


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

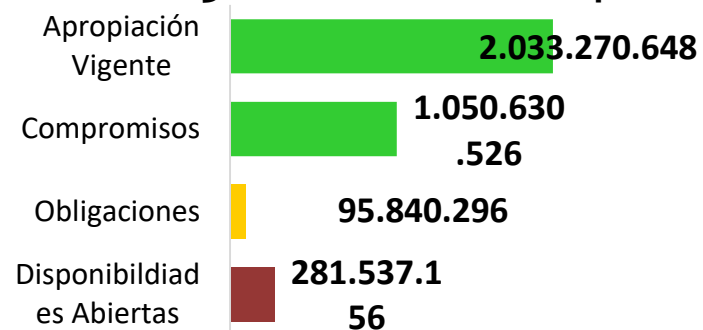

Ejecución Presupuestal Octubre

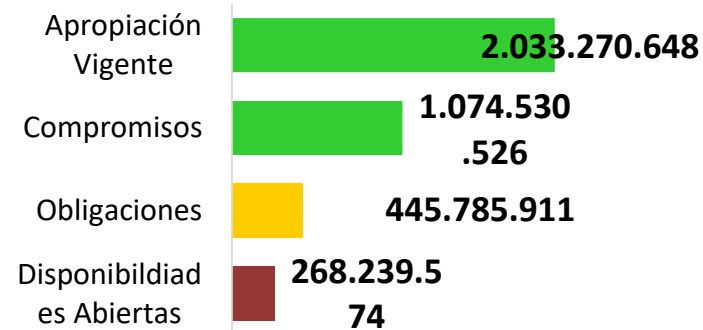

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
26	40,98%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE


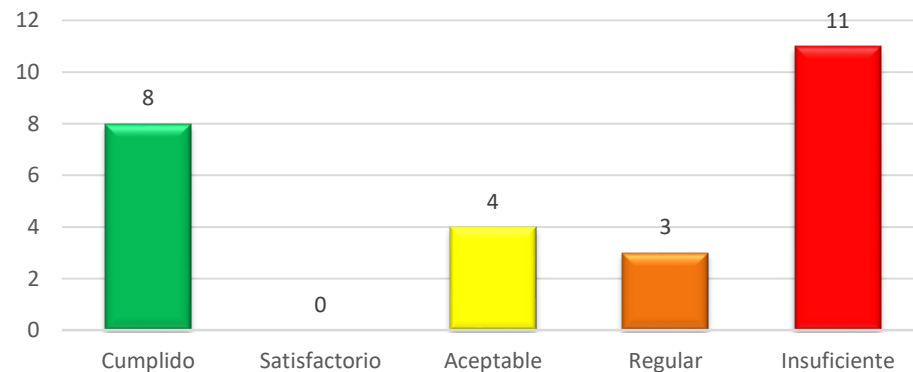


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

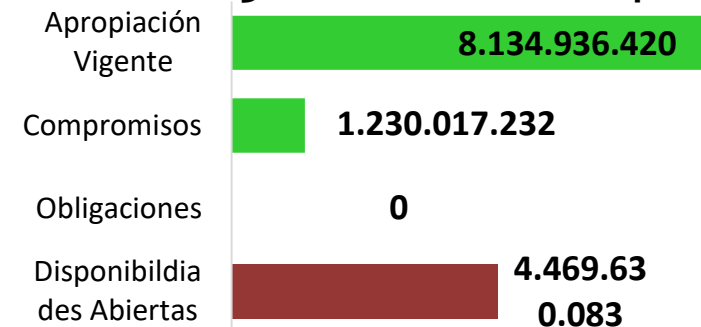

Ejecución Presupuestal Octubre

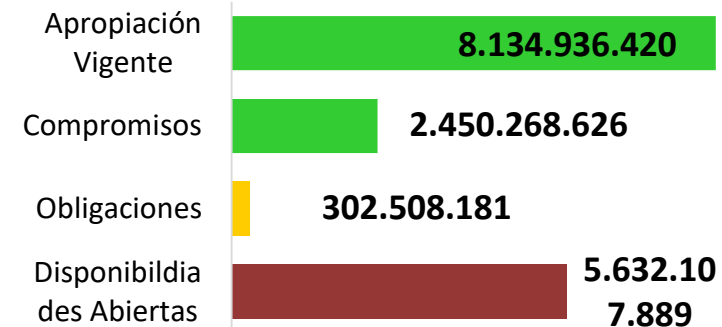

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Dirección Junín – Barbacoas



Dirección Junín – Barbacoas


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
6	48,70%

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - JUNIN

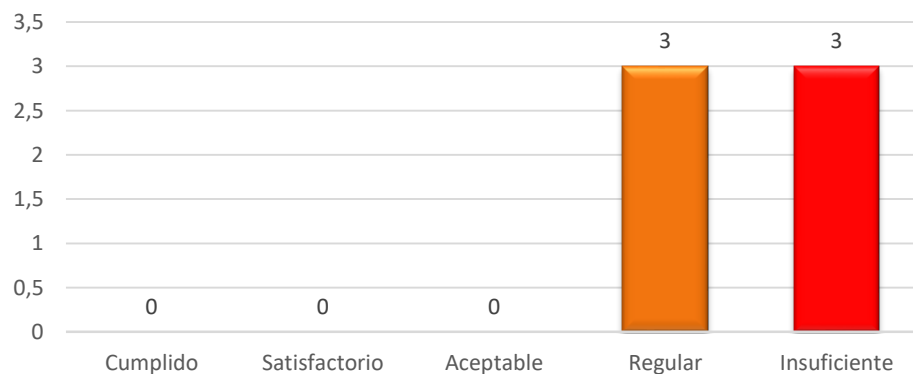

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025


Ejecución Presupuestal Septiembre

Apropiación Vigente	61.409.266.698
Compromisos	1.119.757.764
Obligaciones	639.239.765
Disponibilidades Abiertas	3.351.976.689



Ejecución Presupuestal Octubre

Apropiación Vigente	61.409.266.698
Compromisos	1.129.757.764
Obligaciones	665.082.596
Disponibilidades Abiertas	3.341.976.689



Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Dirección de Cultura




Dirección de Cultura

Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
19	49,73%



Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025


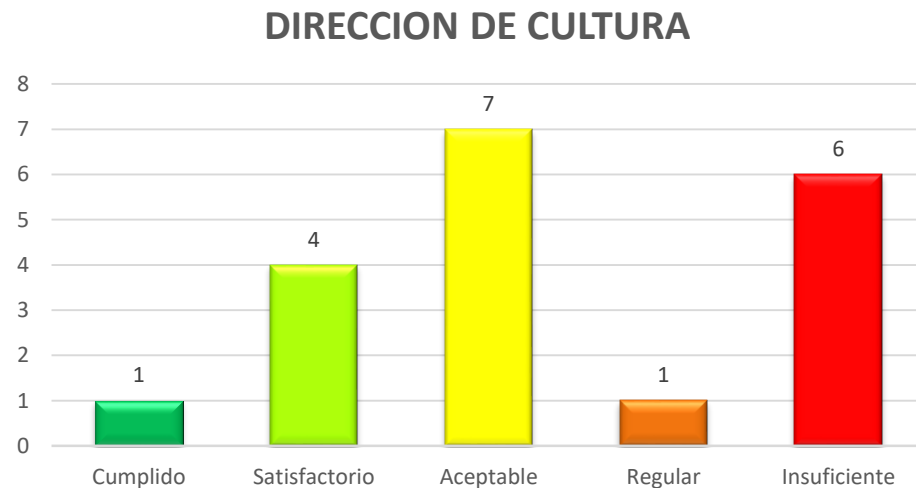


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

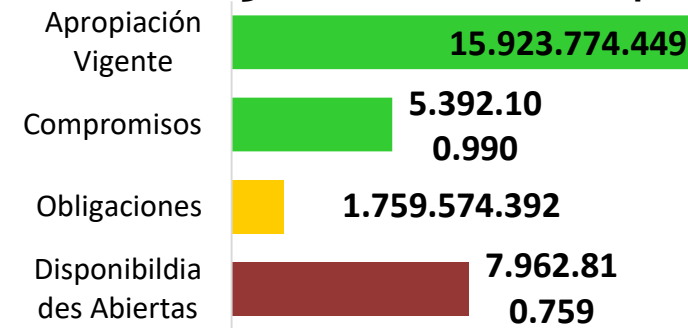

Ejecución Presupuestal Octubre

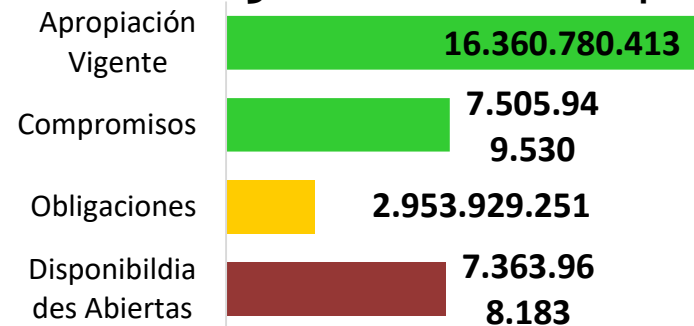

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
1	50%

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SECRETARIA DE GOBIERNO


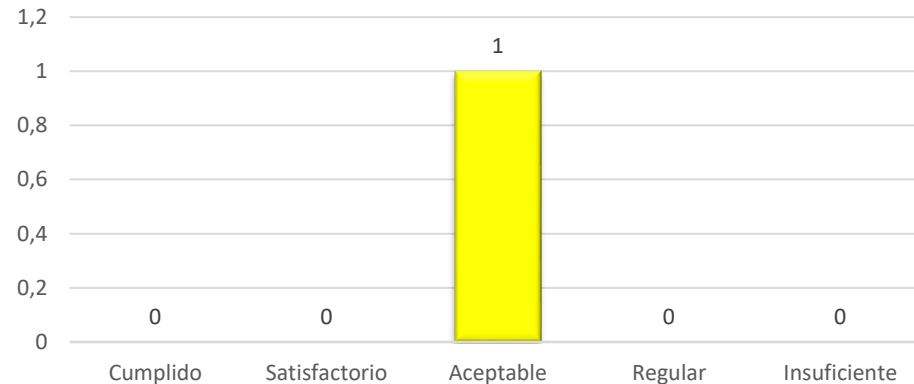


Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

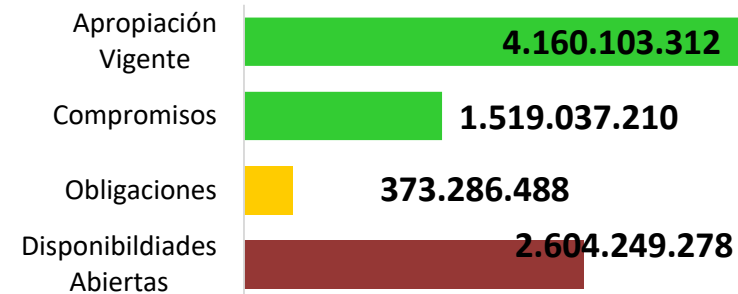

Ejecución Presupuestal Octubre

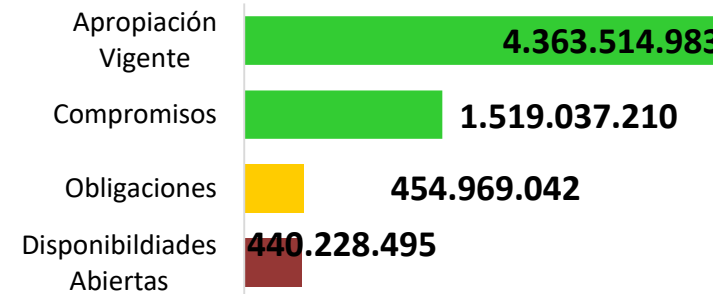

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural


Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Corte a Octubre (sin cierre) de 2025

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
23	51,33%



Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL


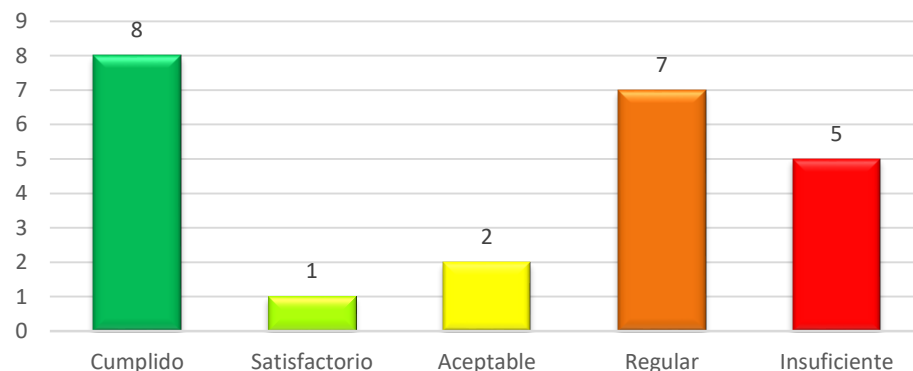


Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

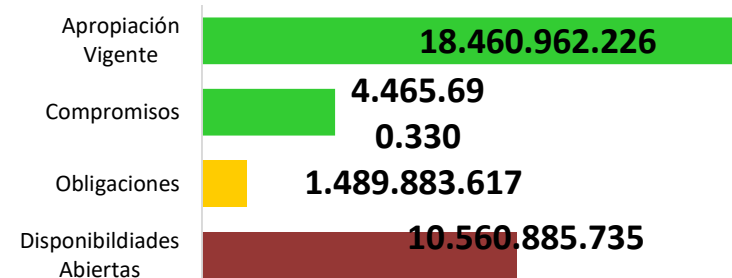

Ejecución Presupuestal Octubre

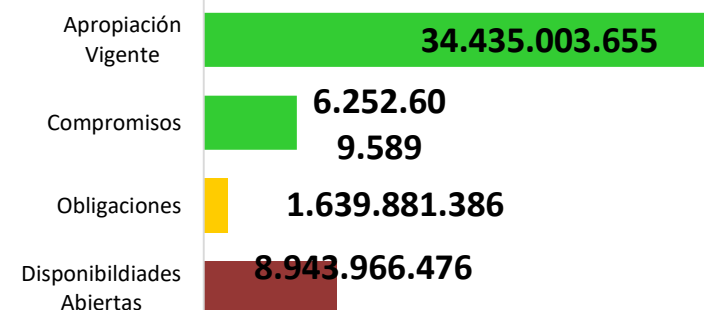

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres

Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
24	51,50%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

DAGR


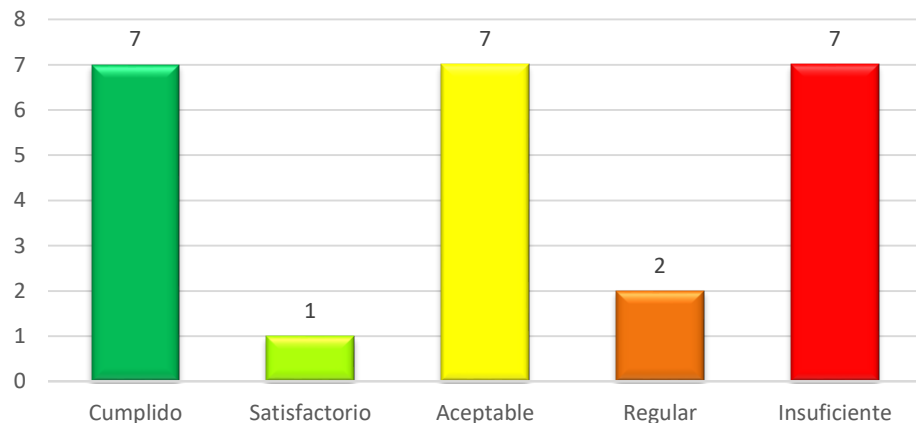


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

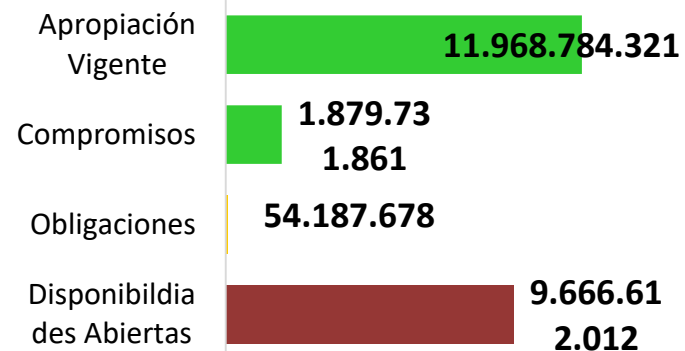

Ejecución Presupuestal Octubre

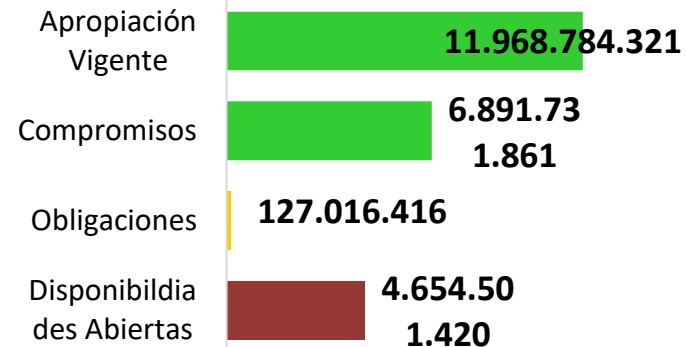

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Recreación y Deporte



Secretaría de Recreación y Deporte


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
16	60,28%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE


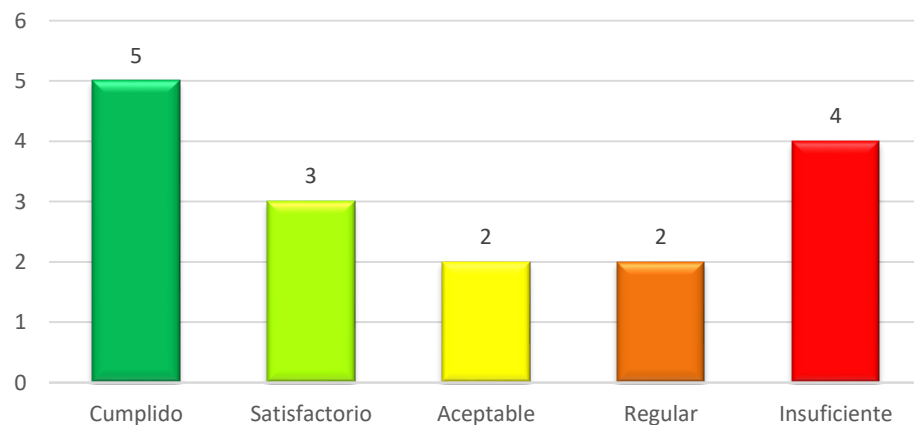


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

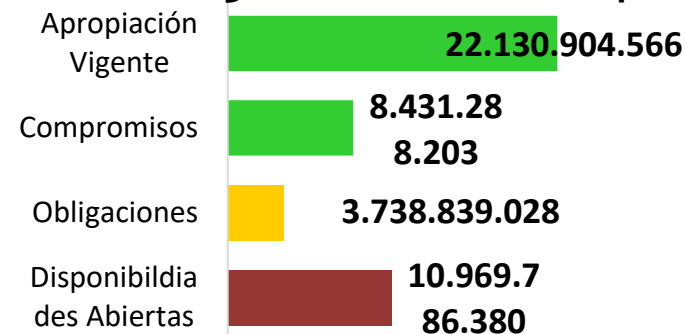

Ejecución Presupuestal Octubre

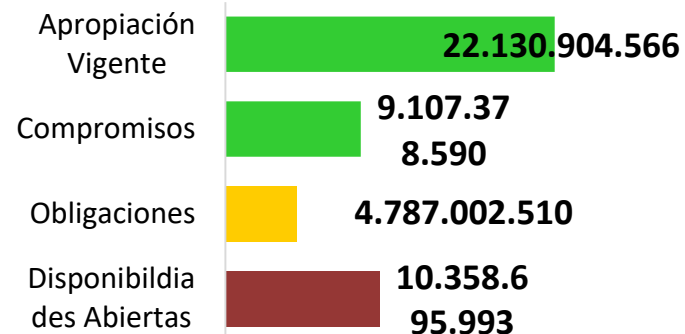

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025 Sin Proyecto de Despacho



Gobernación de
NARIÑO

Oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
7	60,78%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025


Estado de las metas 2025

OFICINA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

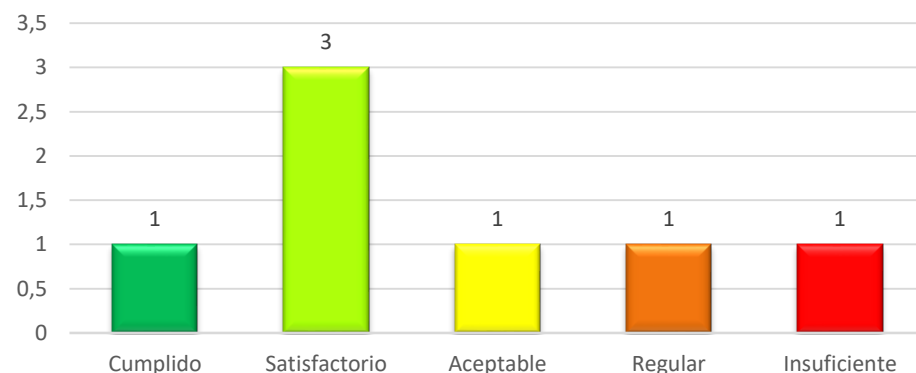


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

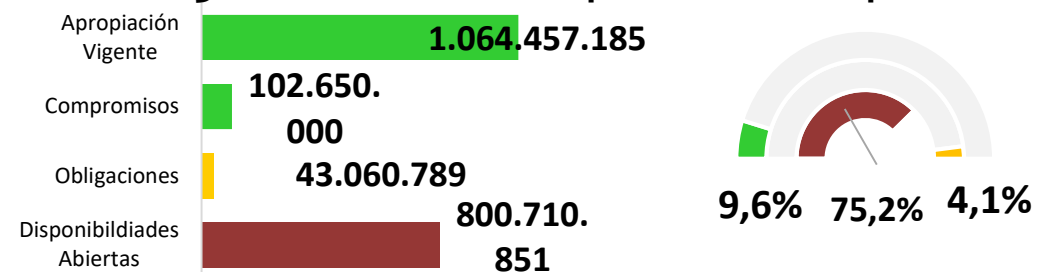

Ejecución Presupuestal Octubre

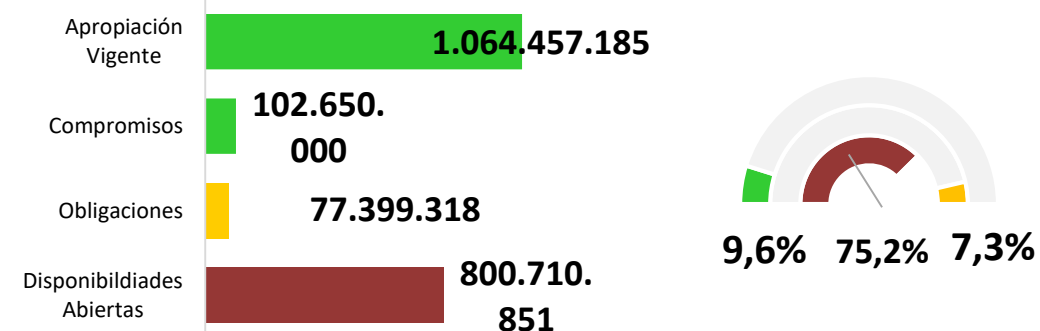

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría General




Secretaría General

Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
9	61,71%



Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025 SECRETARIA GENERAL


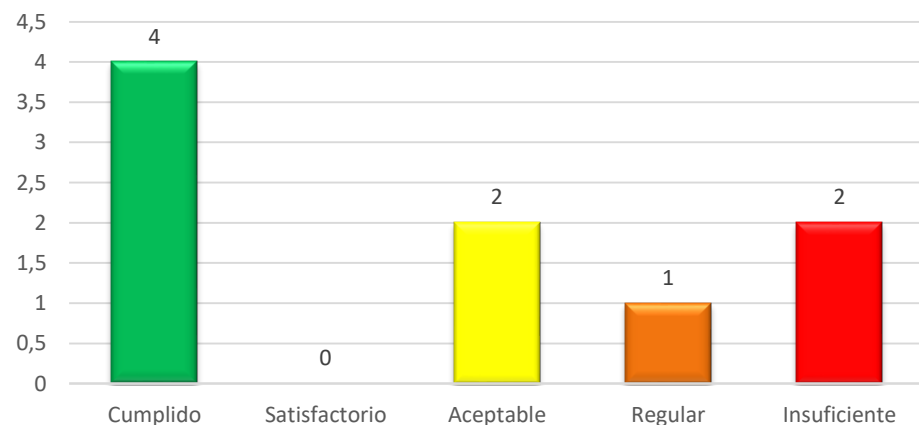


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

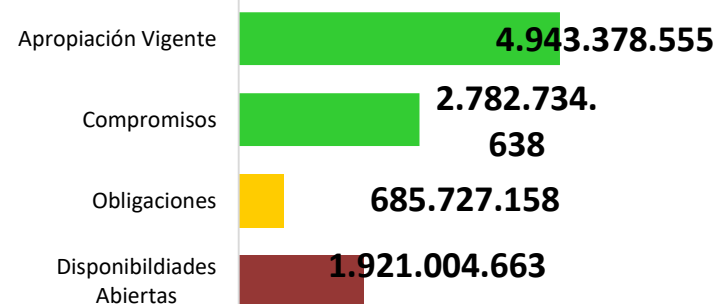

Ejecución Presupuestal Octubre

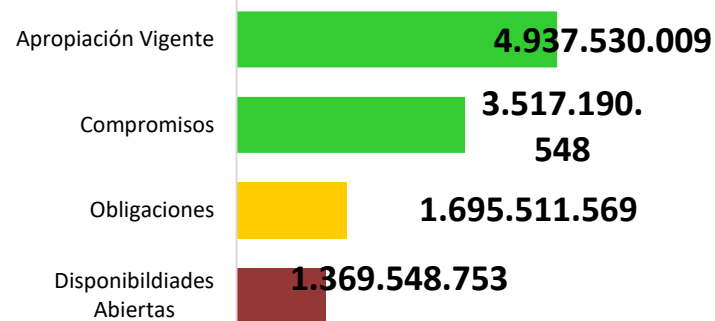

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Hacienda



Secretaría de Hacienda


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Metas programadas 2025	Avance Físico
8	62,07%

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025


Estado de las metas 2025

SECRETARIA DE HACIENDA

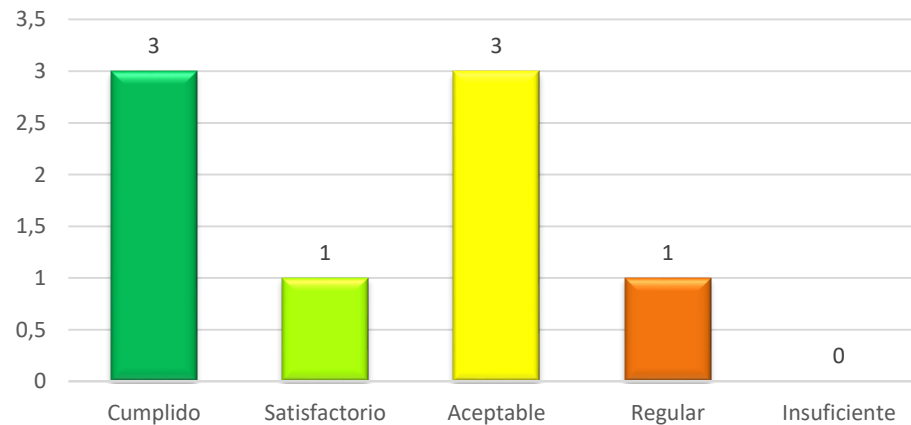


Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

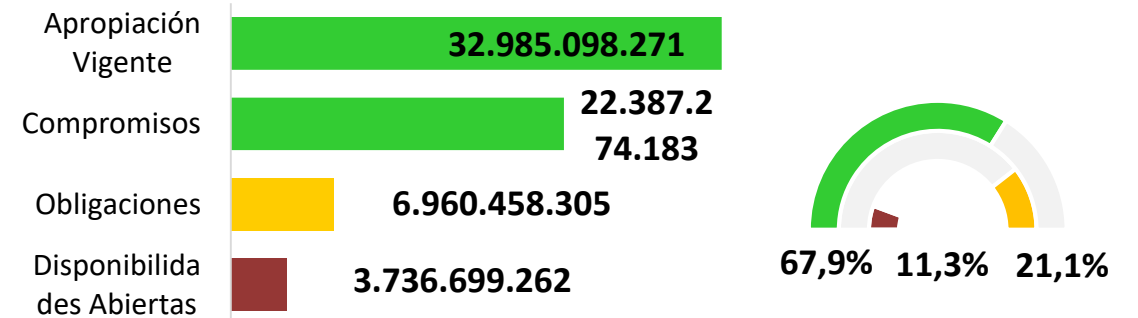

Ejecución Presupuestal Octubre

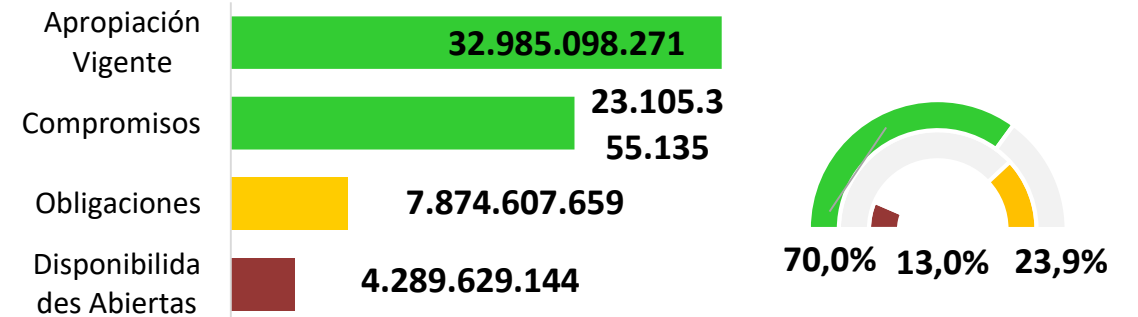

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos



Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
57	70,02%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025


Estado de las metas 2025

SECRETARÍA DE GOBIERNO - SUBSECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

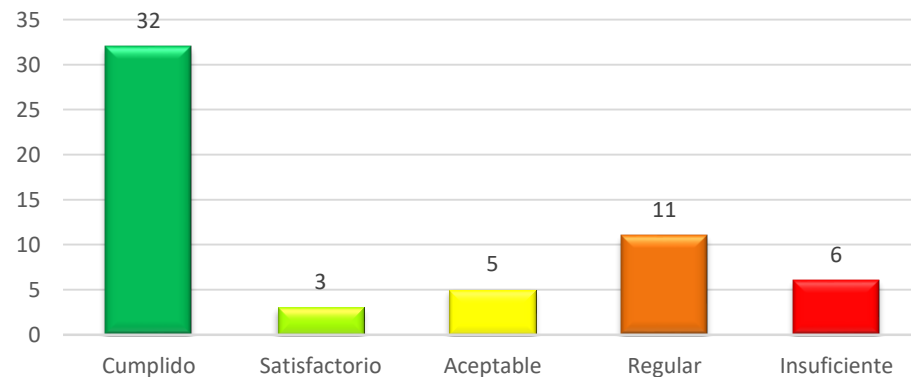


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

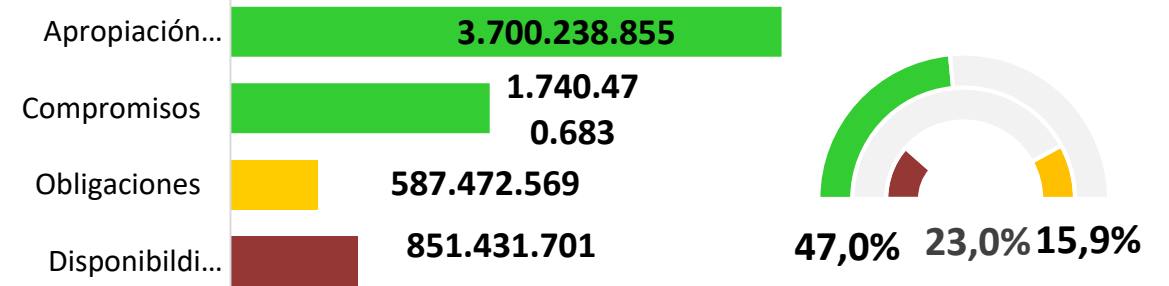

Ejecución Presupuestal Octubre

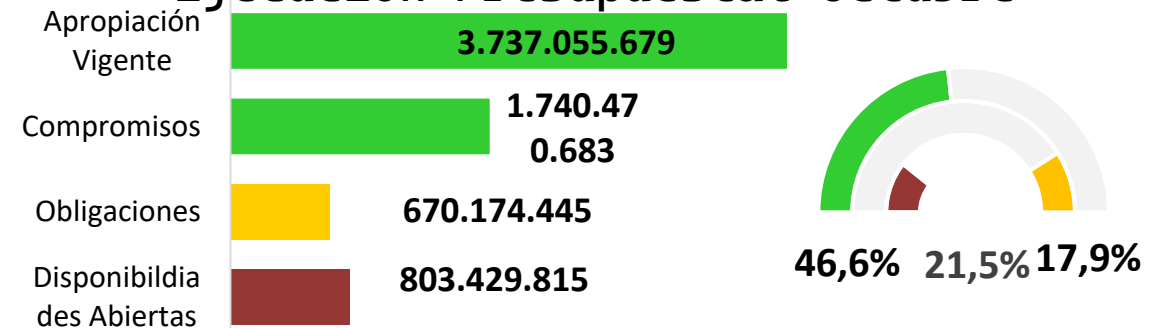

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Dirección de Turismo



Dirección de Turismo


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
9	70,43%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

DIRECCION DE TURISMO


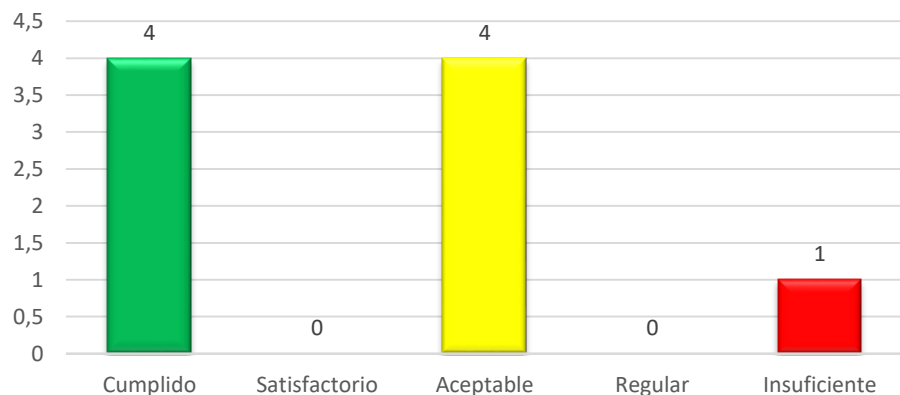


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

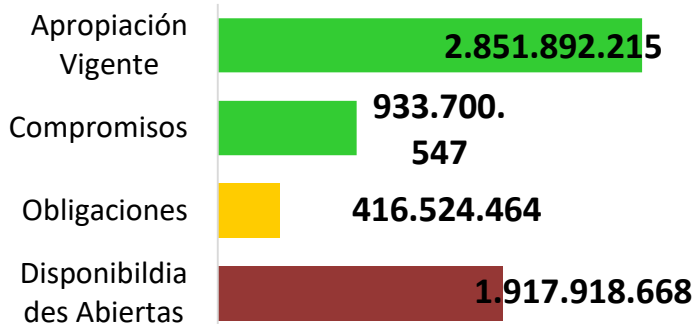

Ejecución Presupuestal Octubre

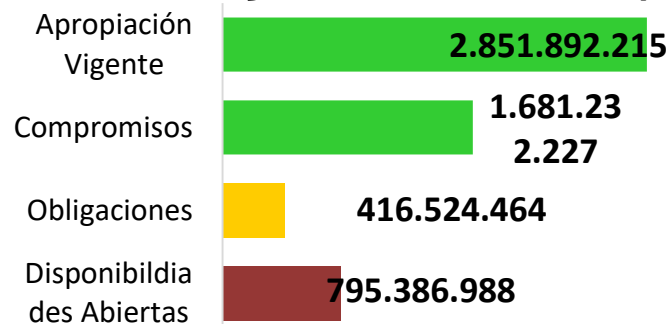

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Desarrollo Comunitario



Subsecretaría de Desarrollo Comunitario


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
24	73,48%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SECRETARÍA DE GOBIERNO -
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
COMUNITARIO


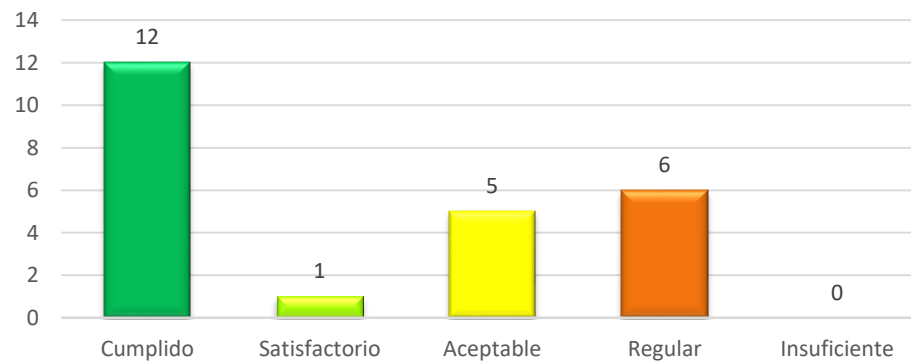


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

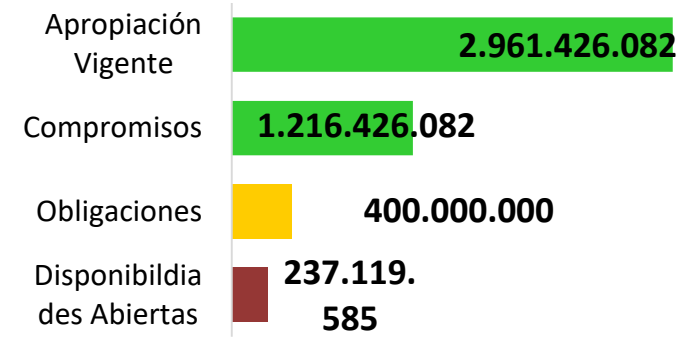

Ejecución Presupuestal Octubre

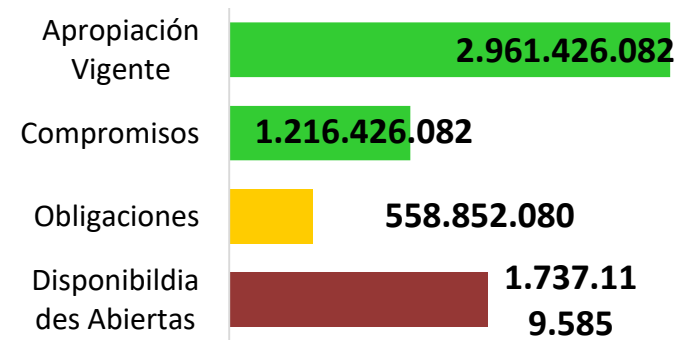

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Oficina de Prensa




Oficina de Prensa

Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
4	75,38%



Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025 OFICINA DE PRENSA


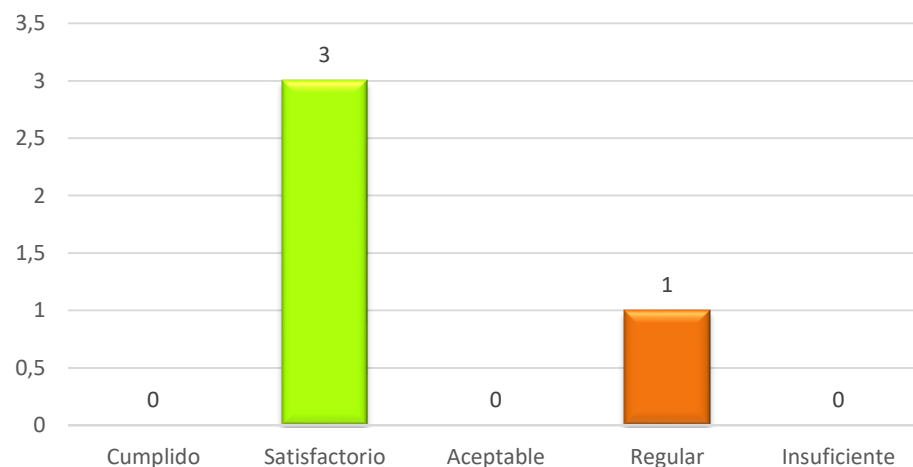


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

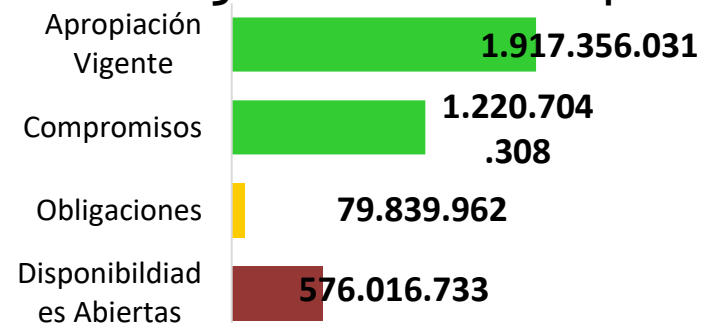

Ejecución Presupuestal Octubre

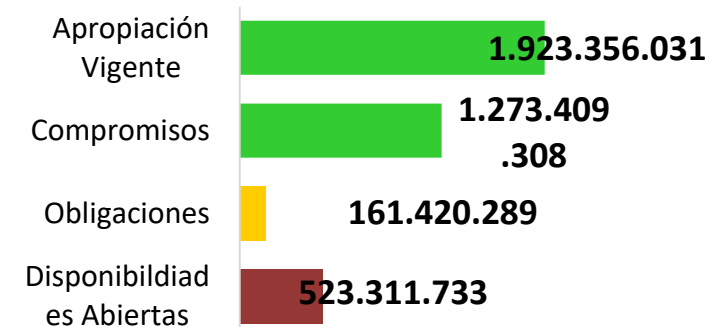

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Gestión Pública

Subsecretaría de Gestión Pública


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
21	78,33%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025


Estado de las metas 2025

SECRETARÍA DE GOBIERNO - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

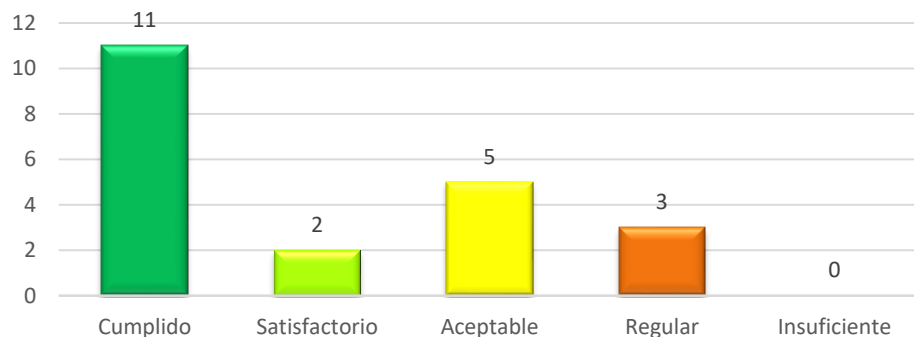


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025


Ejecución Presupuestal Septiembre




FONSET



Ejecución Presupuestal Octubre



FONSET



Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Educación



Secretaría de Educación


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
40	80,60%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SECRETARIA DE EDUCACION


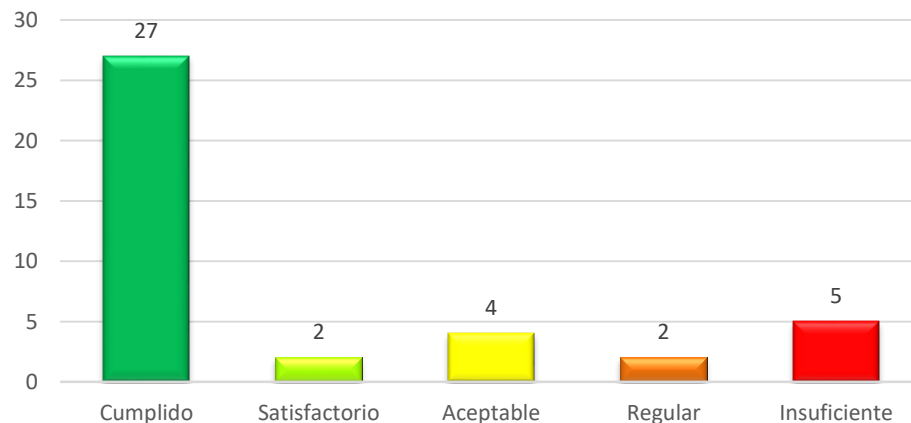


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

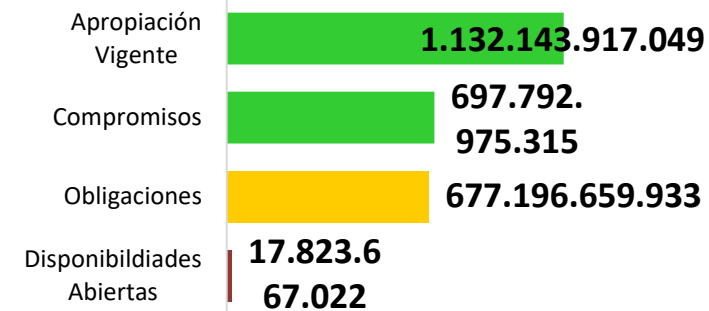

Ejecución Presupuestal Octubre

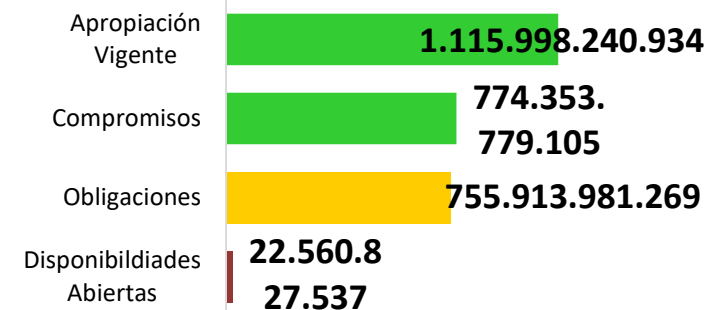

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría TICs Subsecretaría de Innovación Social



Secretaría TICs – Subsecretaría de Innovación Social


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
7	82,14%

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025


Estado de las metas 2025

SUBSECRETARIA DE INNOVACION SOCIAL

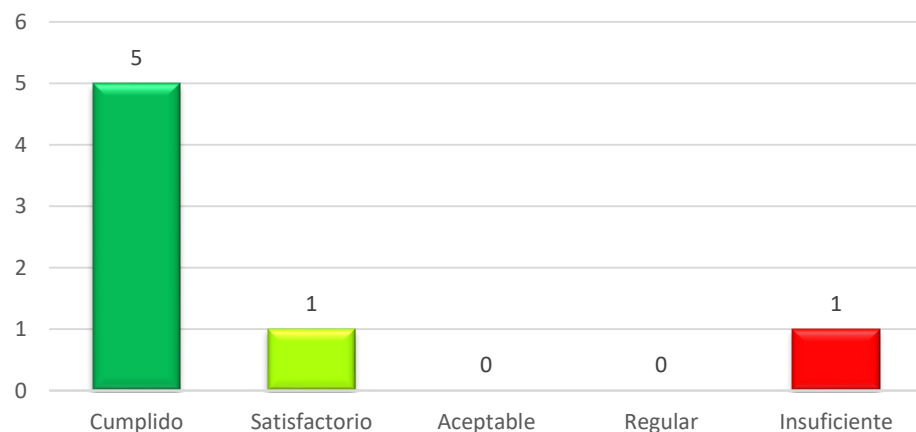


Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

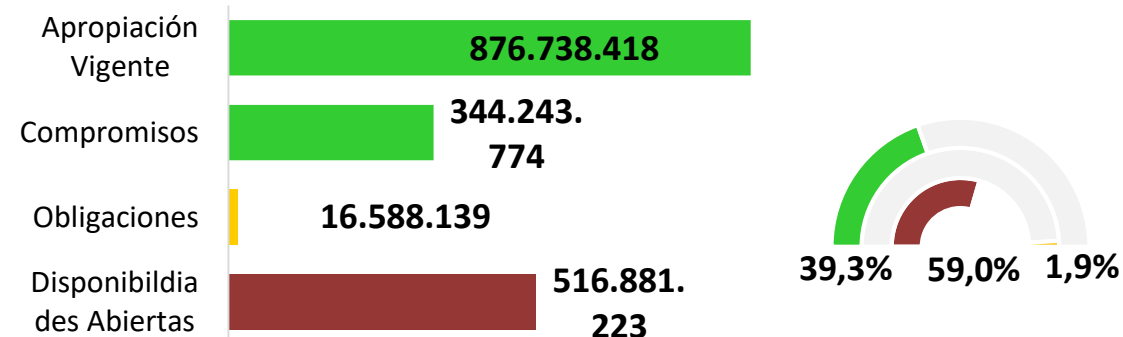

Ejecución Presupuestal Octubre

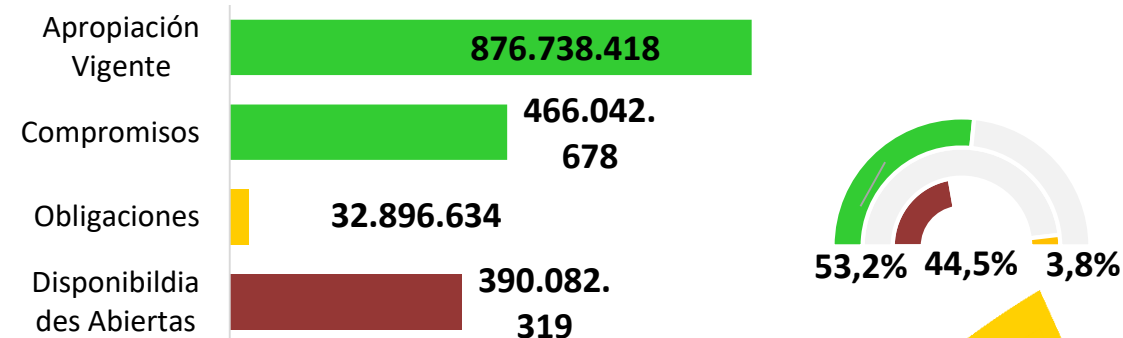

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social



Secretaría de Equidad, Género e Inclusión Social


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
65	87,56%

Fuente: Reporte Dependencias -
BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SEGIS


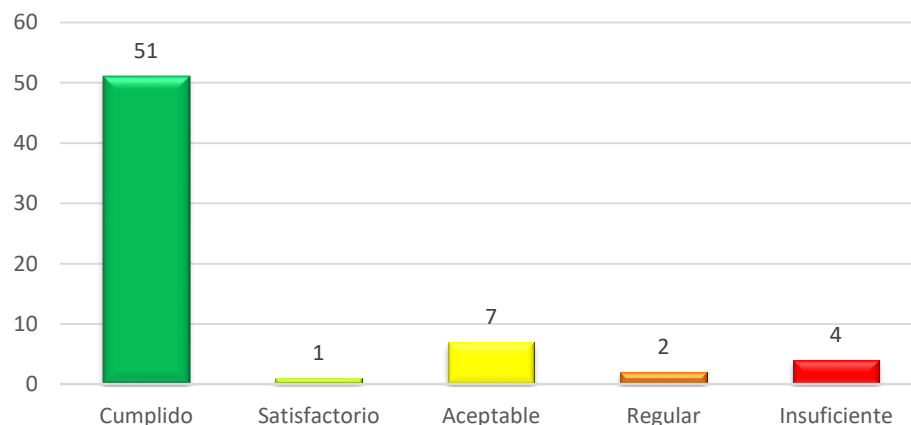


Fuente: Reporte Dependencias - BPID,
Octubre 2025



Ejecución Presupuestal Septiembre

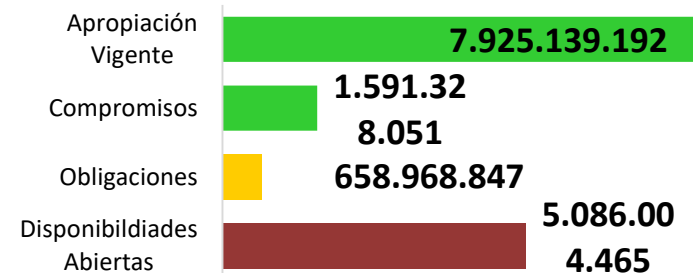

Ejecución Presupuestal Octubre

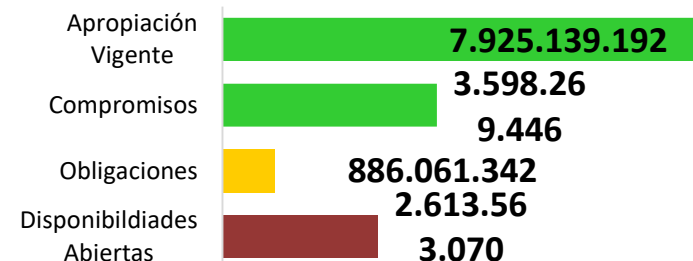

AECID



Fuente: Secretaría de Hacienda,
Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Instituto Departamental de Salud de Nariño


Instituto Departamental de Salud de Nariño

Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
105	89,42%



Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025 IDSN


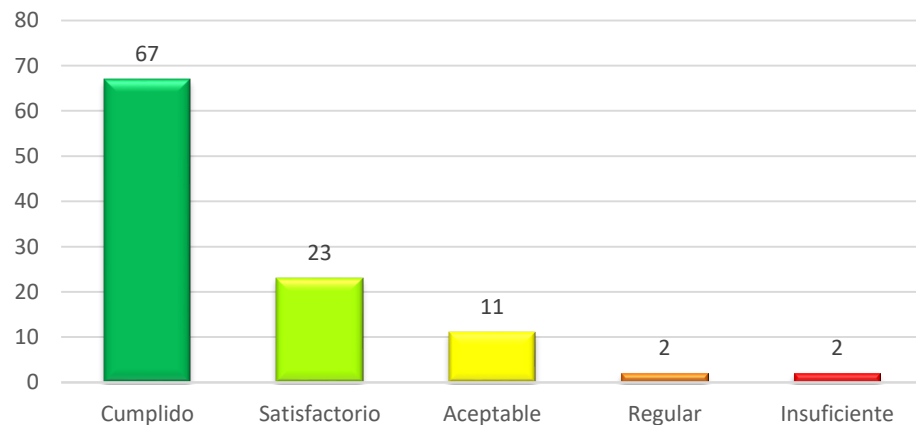


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

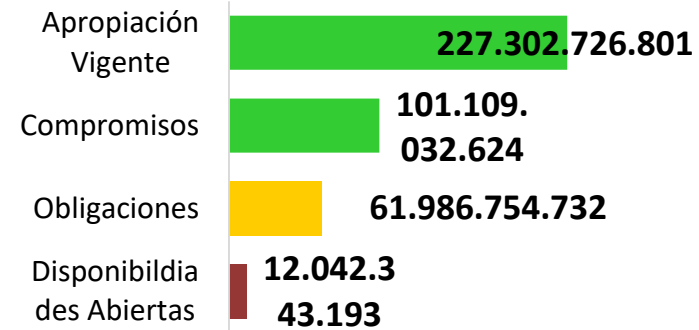

Ejecución Presupuestal Octubre

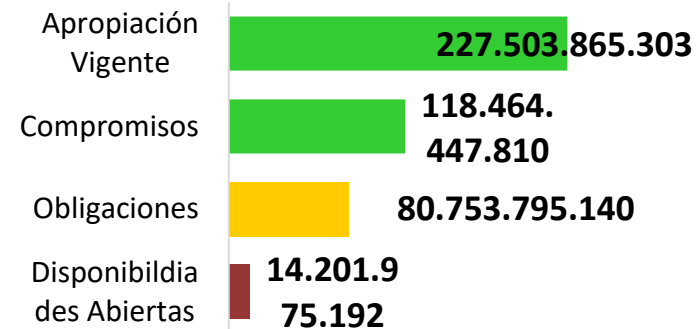

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación



Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
4	90%

Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN


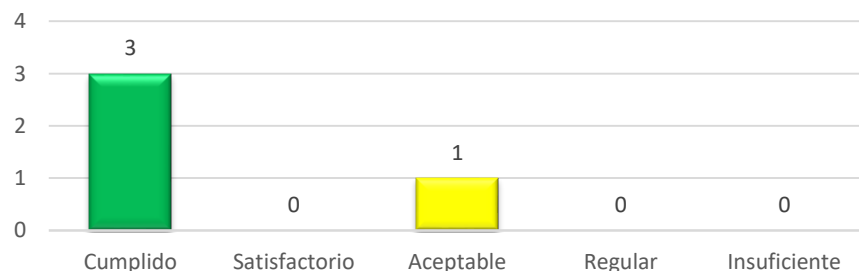


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

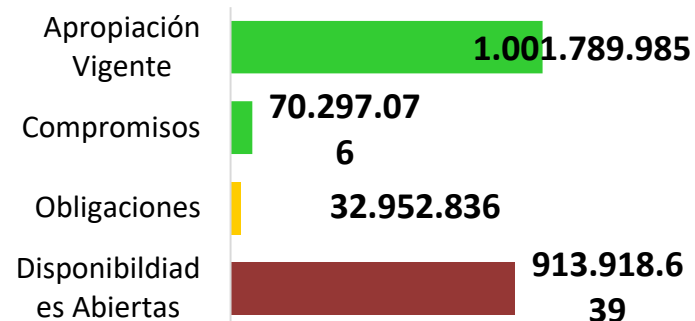

Ejecución Presupuestal Octubre

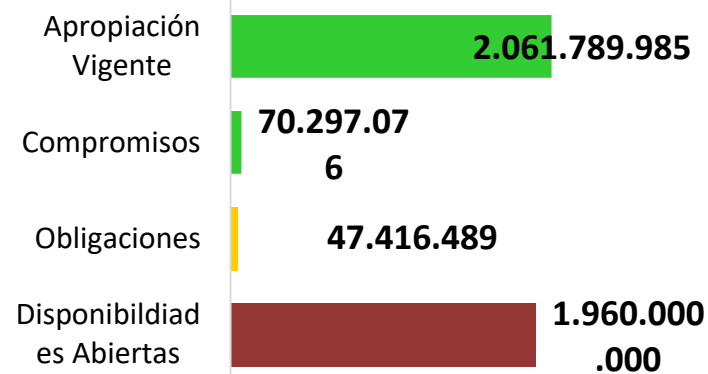

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Oficina de Asuntos Fronterizos

Oficina de Asuntos Fronterizos


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
4	95%

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

OFICINA DE FRONTERAS


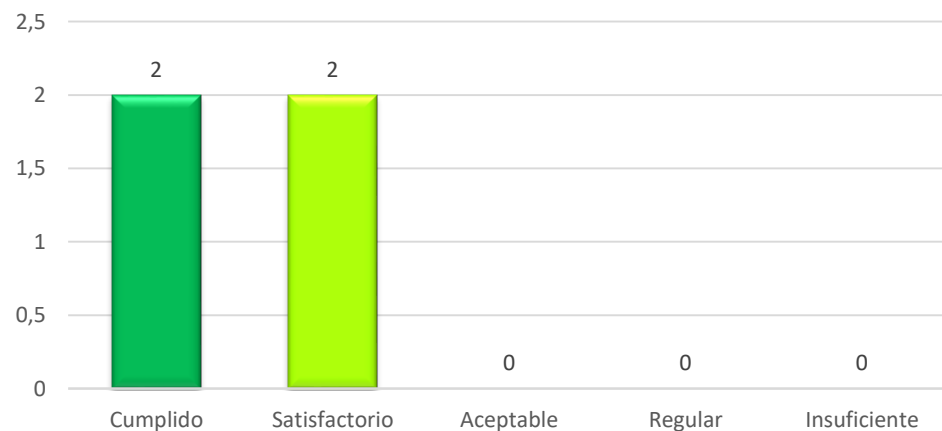


Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

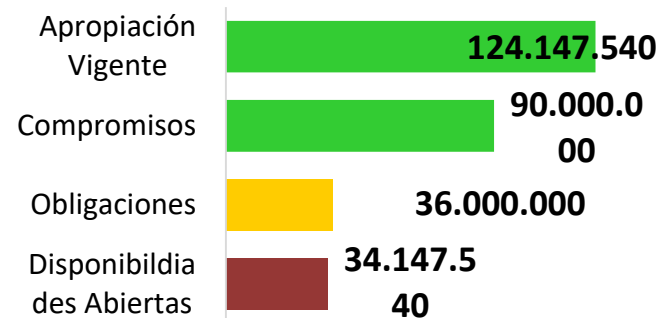

Ejecución Presupuestal Octubre

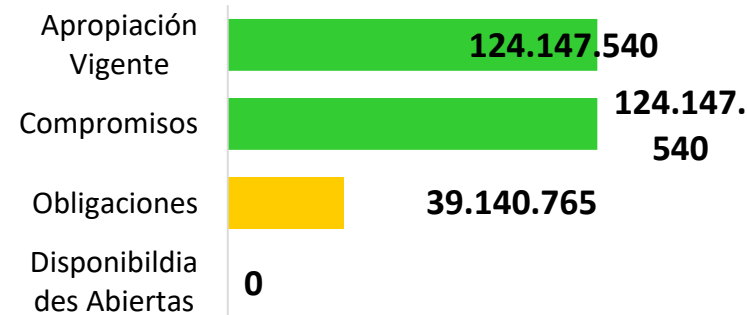

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de las TIC, Innovación Social y Gobierno Abierto

Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
9	100%

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025


Estado de las metas 2025

SECRETARIA TIC




Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

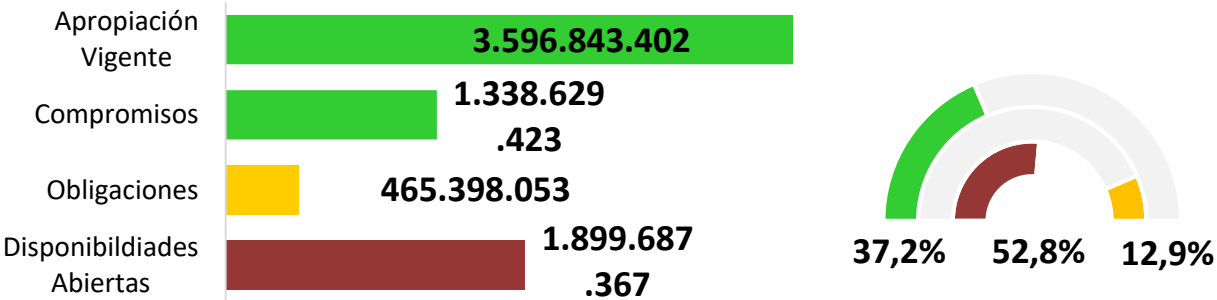

Ejecución Presupuestal Octubre

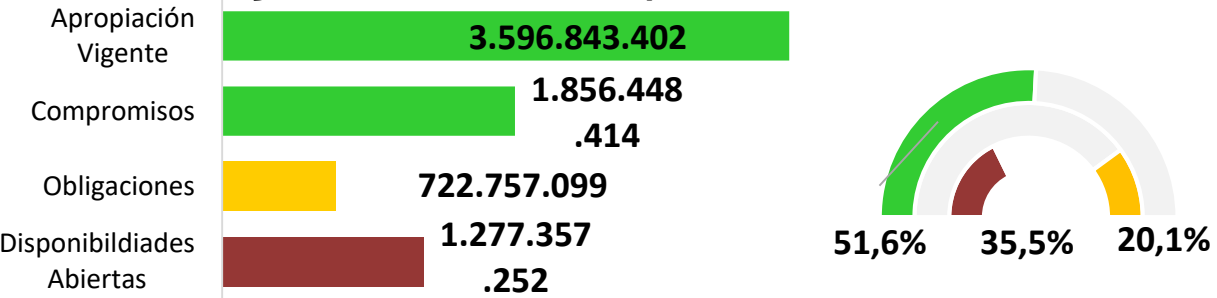

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Planeación Departamental


Secretaría de Planeación

Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
28	63,57%



Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Estado de las metas 2025


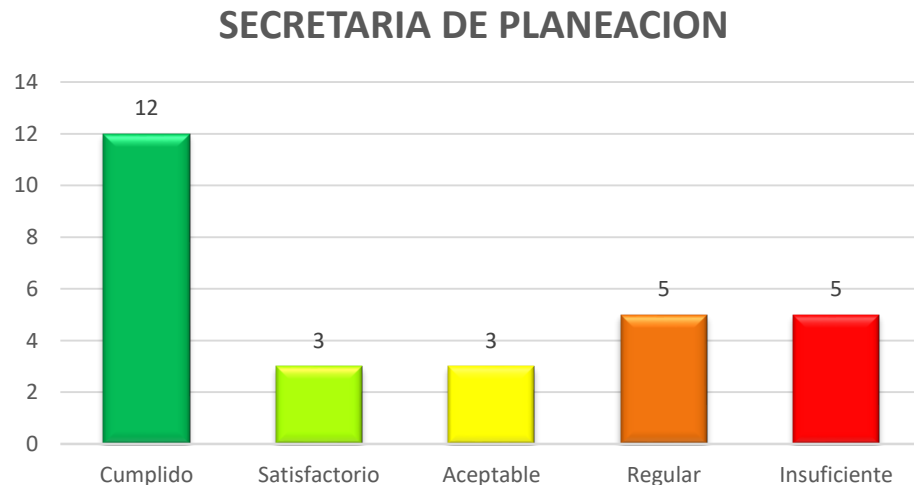


Fuente: Reporte Dependencias - BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

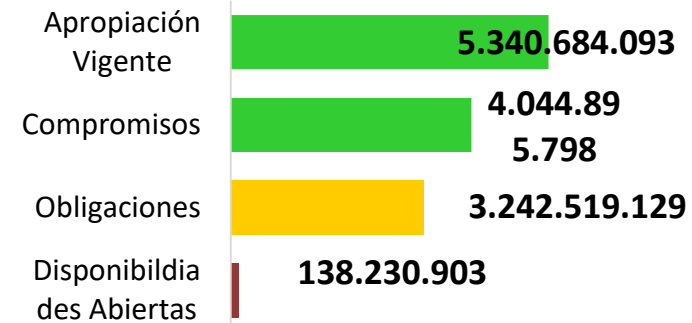

Ejecución Presupuestal Octubre

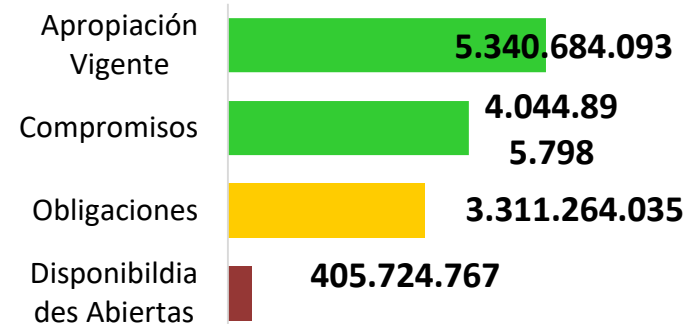

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría de Planeación Departamental Plan Departamental de Agua



Secretaría de Planeación Plan Departamental de Agua


Corte a Octubre de 2025 (sin cierre)

Total productos (Metas) programados 2025	Promedio de % de Avance
23	63,50%

Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025



Estado de las metas 2025

SECRETARIA DE PLANEACION PDA


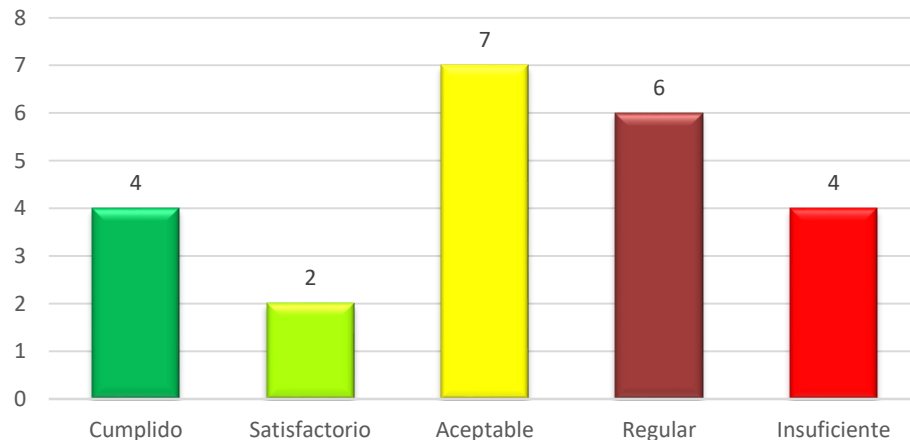


Fuente: Reporte Dependencias – BPID, Octubre 2025

Ejecución Presupuestal Septiembre

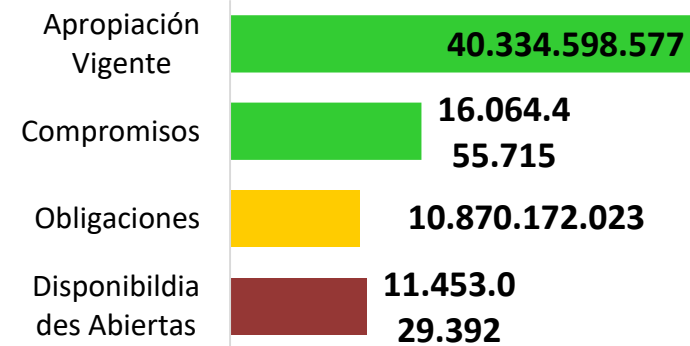

Ejecución Presupuestal Octubre

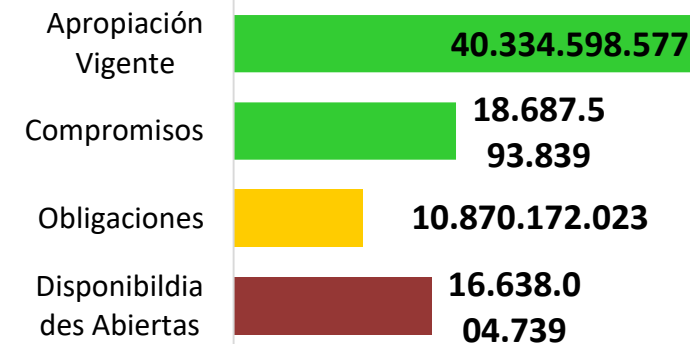

Fuente: Secretaría de Hacienda, Octubre 2025



Gobernación de
NARIÑO




Gobernación de
NARIÑO

Informe de Aprobación de Proyectos

Secretaría de Planeación



PROYECTOS APROBADOS 2024-2025

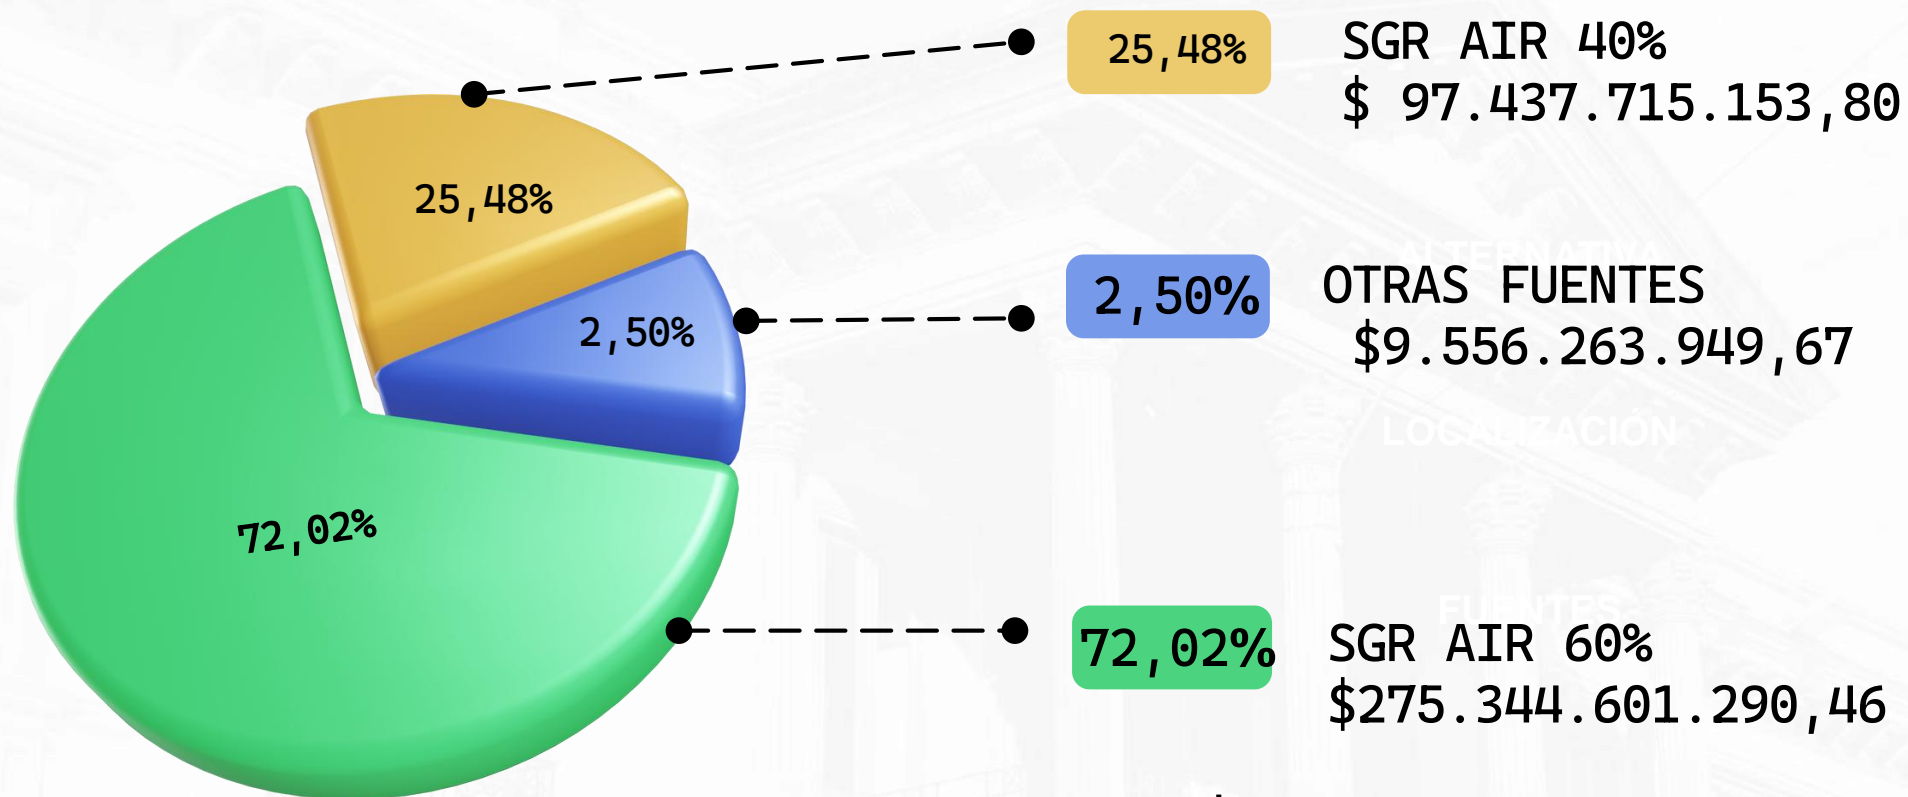

TOTAL : \$382.338.580.394,13



Proyectos Aprobados por Sectores



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

SECTORES	NO. PROYECTOS	VALORES	%
 TRANSPORTE	20	\$ 158.188.099.530,22	41,37%
 EDUCACIÓN	5	\$ 121.857.726.449,10	31,87%
 AGRICULTURA	6	\$ 38.837.917.916,00	10,16%
 VIVIENDA	2	\$ 23.625.941.957,44	6,18%
 COMERCIO, IND Y TURISMO	1	\$12.038.396.716,10	3,15%
 DEPORTE	2	\$11.308.330.330,34	2,96%
 CULTURA	1	\$ 9.080.383.429,53	2,37%
 AMBIENTE	1	\$ 7.401.784.065,00	1,94%
 TOTAL	38	\$ 382.338.580.394,13	100%



Turismo



Transporte



Agricultura
y Desarrollo
Rural



Educación



Vivienda,
ciudad y
territorio y
transporte



Deporte



Cultura



Ambiente y
Desarrollo
Sostenible



Gobernación de
NARIÑO

Recursos Invertidos Subregiones



SUBREGIÓN	VALOR TOTAL	%
✓ EXPROVINCIA DE OBANDO	\$ 72.531.865.754,81	18,97%
✓ CORDILLERA	\$ 44.458.639.648,68	11,63%
✓ PACIFICO SUR	\$ 39.991.960.216,45	10,46%
✓ RÍO MAYO	\$ 27.577.275.495,13	7,21%
✓ CENTRO	\$ 24.561.629.180,56	6,42%
✓ TELEMBÍ	\$ 19.990.635.960,20	5,23%
✓ SANQUIANGA	\$ 16.086.012.377,81	4,21%
✓ OCCIDENTE	\$ 15.851.787.369,14	4,15%
✓ JUANAMBU	\$ 12.714.615.233,90	3,32%
✓ LA SABANA	\$ 8.501.938.617,53	2,22%

PROYECTOS CON IMPACTO POBLACIONAL EN DIFERENTES TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

\$ 82.284.772.963,80 21,52%

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE JÓVENES EMPRENDEDORES EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

\$ 12.038.396.716,1 3,15%

FORMACION DE ALTO NIVEL A TRAVÉS DE LA MAESTRÍA EN INTERCULTURALIDAD, DESARROLLO Y PAZ TERRITORIAL PARA LÍDERES, LÍDERESAS Y ACTORES SOCIALES QUE APORTAN A LA PAZ TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

\$2.381.502.421,82 0,62%

TOTAL: \$ 382.338.580.394,13
100%




Gobernación de
NARIÑO

Estado de los Proyectos



ESTADO DE LOS PROYECTOS

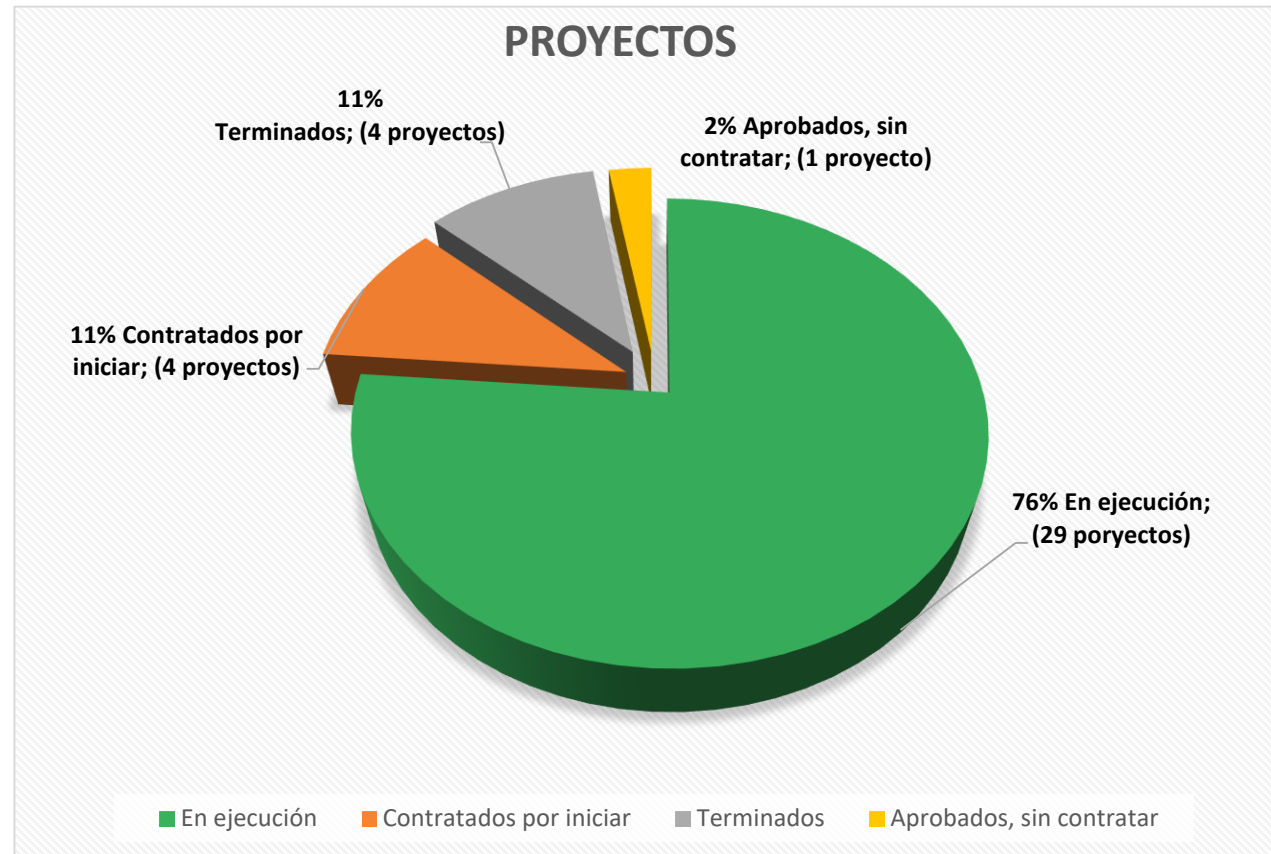

TOTAL PROYECTOS: 38



Gobernación de
NARIÑO

4 Proyectos Terminados

Sistema General de Regalías



CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PALAFÍTICOS PEATONALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$ 6.337.996.252
SGR-AIR 60%



EJECUTOR
FONER



BENEFICIARIOS
126.987



ALCANCE

Construcción de 11 puentes palafíticos en concreto, ubicados en sectores de Chajal y las Mercedes, zona rural del municipio de Tumaco



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Tumaco



VALOR OBRA

\$5.919.586.897,00



VALOR INTERV

\$418.409.355,00



TIEMPO DE
EJECUCION

6 Meses



CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PALAFÍTICOS PEATONALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$5.919.586.897
No Contrato: 032-OB-2024
Contratista: J & D INGENIERIAS
S.A.S



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$418.409.355
No Contrato: 028-IN-2024
Contratista: Biodiversidad
Ingeniería De
Proyectos S.A.S



OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se encuentra en estado TERMINADO. Los contratos derivados están en proceso de liquidación para cierre del proyecto.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

15/10/2024



AVANCE FÍSICO

100%



AVANCE FINANCIERO

99,17%



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PALAFÍTICOS PEATONALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico





MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN FLUVIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN LAS VEREDAS SAN PEDRO DEL VINO Y VUELTA EN EL GALLO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, NARIÑO.

**SECTOR
TRANSPORTE**



VALOR TOTAL
\$3.316.796.577,88
SGR-AIR 60%



**EJECUTOR
FONER**



BENEFICIARIOS
126.987



ALCANCE

Mejoramiento de la intercomunicación fluvial mediante la construcción de dos muelles en las veredas San Pedro del Vino y Vuelta En El Gallo del Municipio de Francisco Pizarro, Nariño



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

Francisco Pizarro



VALOR OBRA

\$2.963.442.904,48



VALOR INTERV

\$353.353.673,40



**TIEMPO DE
EJECUCION**

7 Meses



MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN FLUVIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN LAS VEREDAS SAN PEDRO DEL VINO Y VUELTA EN EL GALLO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO NARIÑO

CONTRATOS

	CONTRATO OBRA	Valor: \$2.963.442.904,48 No Contrato: 030-OB-2024 Contratista: Construcción Y Consultoría Luz A&J S.A.S
	CONTRATO INTERVENTORÍA	Valor: \$353.353.673,4 No Contrato: 026-IN-2024 Contratista: ARQUICAM S.A.S.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	FECHA ACTA DE INICIO	08/10/2024
	AVANCE FÍSICO	100%
	AVANCE FINANCIERO	100%

	OBSERVACIÓN GENERAL	EL proyecto esta en estado PARA CIERRE. El contrato de obra y el de interventoría se encuentran liquidados. No se ha cargado el acto administrativo de cierre a la plataforma, se encuentran en la elaboración y gestión de firmas del mismo.
--	----------------------------	---

MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN FLUVIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN LAS VEREDAS SAN PEDRO DEL VINO Y VUELTA EN EL GALLO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO NARIÑO



Registro Fotográfico





GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS EN LA POBLACIÓN DE MADRES CABEZA DE FAMILIA RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE NORTE Y SUR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL



VALOR TOTAL
\$16.837.742.190,0

AIR 40% (\$15,152 Mill)



ESPECIE (\$1,684 Mill)



ALCANCE

El proyecto beneficia a 750 madres rurales cabeza de familia, en la producción de cuyes de reproducción y engorde.

EJECUTOR
SIIESS



BENEFICIARIOS

750



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Córdoba, Tangua, Contadero,
Guachucal, Chachagüí y
Taminango



VALOR OBRA

\$ 16.098.798.600,00



VALOR INTV

\$ 738.943.590,00



GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS EN LA POBLACIÓN DE MADRES CABEZA DE FAMILIA RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE NORTE Y SUR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$16.091.634.079
No Contrato: 093-2024
Contratista: Fundación Para
El Desarrollo
Integral Andino

CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$738.145.125
No Contrato: 094-2024
Contratista: Fundación
Mercajusto

OBSERVACIÓN GENERAL

Se evidencia acta de liquidación del contrato No. 093 -2024 y acta de liquidación de Interventoría No. 094-2024. Sin embargo, en la plataforma Gesproy se registra como Terminado y no cerrado. Se solicitó al Supervisor la actualización de la plataforma.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 **FECHA
ACTA DE INICIO** 12/09/2024

 **AVANCE
FÍSICO** 100%

 **AVANCE
FINANCIERO** 100%

 **TIEMPO DE
EJECUCION** 10 Meses

GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS EN LA POBLACIÓN DE MADRES CABEZA DE FAMILIA RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE NORTE Y SUR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Registro Fotográfico





IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN 57 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (2024)

SECTOR

EDUCACIÓN



VALOR TOTAL

\$ 22.523.304.046,80



SGR-AIR 40%



ALCANCE

Prestación del servicio de alimentación escolar en 57 municipios no certificados del Departamento de Nariño, por el término de 40 días calendario escolar y equivale a 4.383.360 de raciones/complementos alimentarios.

EJECUTOR

DEPARTAMENTO
DE NARIÑO



BENEFICIARIOS

103.878 Estudiantes



MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

57 municipios no certificados del Departamento de Nariño



VALOR CONTRATO

\$ 14.236.832.942,40



IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN 57 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (2024)

CONTRATOS



CONTRATO

Valor: \$14.236.832.942,40
No Contrato: GN 3380-2024
Contratista: CONSORCIO
NUTRICION PAE II

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

26/09/2024



AVANCE FÍSICO

100%



AVANCE FINANCIERO

57,10%



OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizo la resolución de No continuidad, la cual se encuentra en tramite de firmas, para posteriormente cargarla en la plataforma y continuar con los tramites de liquidación del contrato, devolución de recursos no ejecutados y cierre del proyecto.



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN 57 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (2024)




Registro Fotográfico de Ejecución



Municipio: Los Andes Sotomayor (N)



Sandoná, Institución educativa Nuestra señora de Fátima sede 6 La Loma



Municipio: Buesaco



Gobernación de
NARIÑO



29 Proyectos en ejecución

Secretaría de Planeación



MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
DEPORTE Y
RECREACION



VALOR TOTAL
\$5.377.636.906
SGR-AIR 60%



EJECUTOR
FONER



BENEFICIARIOS
13.947



ALCANCE

Mejoramiento de la cancha deportiva (estadio municipal) del municipio de la tola, a través de la construcción de una zona de juego, franjas de protección lateral, circulaciones y graderías.



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

La Tola



VALOR OBRA

\$5.006.517.794



VALOR INTERV

\$371.119.112



TIEMPO DE
EJECUCION

12 Meses



MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$5.006.517.794,0
No Contrato: 029-OB-2024
Contratista: Ingeniería de
Proyectos Stanford
SAS



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$371.119.112
No Contrato: 025-IN-2024
Contratista: Proyectos Integrales
De Occidente SAS



OBSERVACIÓN GENERAL

El ejecutor presentó un ajuste, se reenvió respuesta el 9 de septiembre, se esta a la espera de la radicación de las subsanaciones. Para el contrato No. 029-OB-2024, se aprobó una prorrogas por el termino de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, a partir del 10 de agosto de 2025.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

11/10/2024



AVANCE FÍSICO

55,97%



AVANCE FINANCIERO

91,98% (incluye
anticipo del 50%)



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 Registro Fotográfico de avance de obra





FORMACIÓN DE ALTO NIVEL A TRAVÉS DE LA MAESTRÍA EN INTERCULTURALIDAD, DESARROLLO Y PAZ TERRITORIAL PARA LÍDERES, LIDERESAS Y ACTORES SOCIALES QUE APORTAN A LA PAZ TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
EDUCACIÓN



VALOR TOTAL

\$2.381.502.421,82



SGR: 1.458.892.886,11

PUJ: 922.609.535,71



ALCANCE

45 Becas de maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali

EJECUTOR



**DEPARTAMENTO
DE NARIÑO**



BENEFICIARIOS

45



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

24 municipios con mayor incidencia en conflicto:
El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Iscuandé, Tumaco, Francisco Pizarro, Magüi Payan, Roberto Payan, Mallama, El Rosario, Policarpa, Cumbitara, Los Andes, Samaniego, Providencia, Santacruz, Barbacoas, Cumbal, Ipiales, La Llanada, Leiva, Linares y Ricaurte.



FORMACIÓN DE ALTO NIVEL A TRAVÉS DE LA MAESTRÍA EN INTERCULTURALIDAD, DESARROLLO Y PAZ TERRITORIAL PARA LÍDERES, LIDERESAS Y ACTORES SOCIALES QUE APORTAN A LA PAZ TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONVENIO



CONVENIO

Valor: \$2.320.729.535,12
No Covenio: GN4086
Contratista: Pontificia
Universidad
Javeriana -
Seccional Cali

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

26/02/2025



AVANCE FÍSICO

19%



AVANCE FINANCIERO

50% (Anticipo)



OBSERVACIÓN GENERAL

Se avanza en la evaluación de las postulaciones y en el cumplimiento de requisitos para la selección de los beneficiarios definitivo.



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

FORMACIÓN DE ALTO NIVEL A TRAVÉS DE LA MAESTRÍA EN INTERCULTURALIDAD, DESARROLLO Y PAZ TERRITORIAL PARA LÍDERES, LIDERESAS Y ACTORES SOCIALES QUE APORTAN A LA PAZ TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico de avance



Se amplía el plazo para postularse la Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial

La Pontificia Universidad Javeriana Cali, la Gobernación de Nariño y la Universidad de Nariño informan a la comunidad que se ha dispuesto la ampliación del plazo de postulación a la **Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial**, a las personas residentes en los municipios de **Francisco Pizarro, Linares, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Roberto Payán, El Rosario, Providencia, Mosquera, Cumbitara y Mallama**, hasta el **6 de octubre de 2025**.

De igual forma, se solicita de manera especial a las personas que ya iniciaron su postulación, completar el diligenciamiento del formulario y el envío de la documentación requerida, a más tardar hasta el **29 de septiembre de 2025**.

La publicación de los resultados se realizará el **24 de octubre de 2025**.

Para más información y para consultar los términos de referencia, se invita a visitar el siguiente enlace oficial:

<https://narino.gov.co/narino-superior>





MEJORAMIENTO DE TRAMO VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA VÍA BUESACO - EL TABLÓN - LAS MESAS, EN EL SECTOR DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$4.100.073.526,94
SGR-AIR 60%



EJECUTOR
TABLON DE
GOMEZ



BENEFICIARIOS
15,092



ALCANCE

1182 metros de pavimento
adoquinado, cuenta con
muros de contención y
estructura de drenaje



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Tablón De Gómez , Buesaco
Alban, La Cruz



VALOR OBRA

\$3.855.724.876,94



VALOR INTV

\$244.348.650,00



MEJORAMIENTO DE TRAMO VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA VÍA BUESACO - EL TABLÓN - LAS MESAS, EN EL SECTOR DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$3.770.790.139
No L.P 001 DE 2025
Contrato: QUALITE
Contratista CONSTRUCTORA S.A.S





CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$243.420.450
No C.M 001 DE2025
Contrato: CONSORCIO GC
Contratista INGENERIA
:

OBSERVACIÓN GENERAL

El valor ejecutado acumulado es de 42,14% el cual está por encima del acumulado programado con un valor porcentual de 0,09%, que equivale a \$ 3,251,278.07, es decir que a la fecha del presente reporte no se presenta retraso en la ejecución de la obra.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	03/07/2025
 AVANCE FÍSICO	42,14%
 AVANCE FINANCIERO	51% (Incluye anticipo del 30%)
 TIEMPO DE EJECUCION	8 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE TRAMO VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA VÍA BUESACO - EL TABLÓN - LAS MESAS, EN EL SECTOR DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, NARIÑO

Registro Fotográfico de avance de obra





MEJORAMIENTO DE LA VÍA IPIALES – PUPIALES EN EL TRAMO DE VIA DESDE LA INTERSECCION CON LA CRA 1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTOTAL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$ 7.603.036.452,16
SGR-AIR 60%



EJECUTOR
INTY-QUILLA



BENEFICIARIOS
146.358



ALCANCE

1,5 km de pavimento
rígido, Ancho de calzada
de 7,5 metros,
Alcantarillas, Box
Culvert, Estabilización de
taludes



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Ipiales, Pupiales
Gualmatán



VALOR OBRA

\$ 7.135.068.952,16



VALOR INTV

\$ 467.812.800



MEJORAMIENTO DE LA VÍA IPIALES – PUPIALES EN EL TRAMO DE VIA DESDE LA INTERSECCION CON LA CRA 1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTORAL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$7.135.068.952,16
No Contrato: 008-2025
Contratista: Consorcio
Conexión Vial
Ipiales 2020



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$467.812.800
No Contrato: 007-2025
Contratista: Constructora
Ingeniería
Galeras S.A.S



OBSERVACIÓN GENERAL

Se realiza la fundición de placa de concreto 4.0 MPA en carril derecho y carril izquierdo desde abscisa K0+800 - K0+890, además se realiza la construcción de bordillo en las abscisas mencionadas lo que incluye el acero de refuerzo. Se realiza excavación hasta nivel de subrasante y la conformación de la calzada y la proyección de tubería de 10" para sumideros y el relleno de los mismos.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

09/06/2025



AVANCE FÍSICO

45,29%



AVANCE FINANCIERO

20% (Anticipo)



TIEMPO DE EJECUCION

8 Meses



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA VÍA IPIALES – PUPIALES EN EL TRAMO DE VIA DESDE LA INTERSECCION CON LA CRA 1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTOTAL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 Registro Fotográfico de avance de obra





IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS RÍO GUÁITARA, JUANAMBÚ Y MAYO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
AMBIENTE



VALOR TOTAL

\$7.401.784.065,00

AIR 60%(\$ 7.000 mil)

AILA (\$401.784.065)



EJECUTOR
LA FLORIDA



BENEFICIARIOS

21.683



ALCANCE

Intervención de 388 predios, restauración asistida en 193.45 Ha, instalación de 381 estufas ecoeficientes y entrega de 381 huertos dendroenergéticos.

La Florida, Belen,
Nariño



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**



**VALOR
CONTRATISTA**

\$ 7.194.608.575,00



**VALOR
INTERVENTORÍA**

\$76.077.557,00






**VALOR
SUPERVISOR**

\$131.097.933,00



IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS RÍO GUÁITARA, JUANAMBÚ Y MAYO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO


CONTRATOS

 CONTRATO OPERADOR	Valor: \$7.193.766.489,00 No Contrato: LP 001-2025 Contratista: Consorcio de Florida Ambiental
 CONTRATO INTERVENTORÍA	Valor: \$ 76.077.557,00 No Contrato: CMA-001-2025 Contratista: Union Temporal Interventoria del Campo
 CONTRATO SUPERVISIÓN	Valor: \$ 131.097.933 No Contrato: CMA-003-2025 Contratista: BLOWAVE SAS

OBSERVACIÓN GENERAL

Se desarrollaron eventos de difusión, se completó la entrega total de posteadura en los municipios de Belén y Nariño, y se finalizó el aislamiento de los predios públicos en el municipio de Belén. Asimismo, se avanza en el aislamiento de los predios privados en ambos municipios y se llevó a cabo la entrega total de los huertos Dendroenergéticos en Belén y Nariño.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	30/07/2025
 AVANCE FÍSICO	3,50%
 AVANCE FINANCIERO	39,29% (Anticipo)
 TIEMPO DE EJECUCIÓN	20 Meses




Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS RÍO GUÁITARA, JUANAMBÚ Y MAYO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Registro Fotográfico

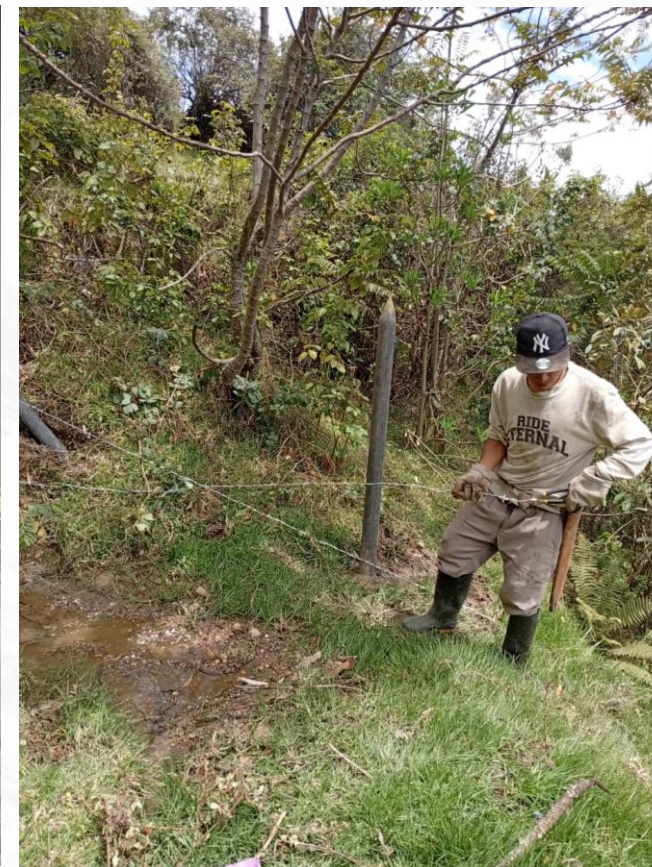



FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CUYÍCOLAS COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUMBAL, CÓRDOBA Y GUALMATÁN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
Agricultura y
Desarrollo Rural



VALOR TOTAL
\$2.500.000.000
SGR-AIR 60%



EJECUTOR
INTYQUILLA



BENEFICIARIOS
120



ALCANCE

120 PRODUCTORES CUYÍCOLAS
CON CONDICIONES MEJORADAS
PARA LA PRODUCCIÓN
PECUARIA



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

CUMBAL - CÓRDOBA -
GUALMATÁN



VALOR OBRA

\$ 2.421.366.807,00



VALOR INTV

\$ 78.633.193,00



FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CUYÍCOLAS COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUMBAL, CÓRDOBA Y GUALMATÁN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$ 2.421.366.807,00
No Contrato: RE-IQ-013-2025
Contratista: ASOCIACION KIMSA





CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 78.633.193,00
No Contrato: RE-IQ-014-2025
Contratista: FUNDACIÓN INGENIERÍA
Y MEDIO AMBIENTE
FUDAM NARIÑO

OBSERVACIÓN GENERAL

La entidad ejecutora KIMSA, realizó visitas técnicas en los municipios de Córdoba, Cumbal y Gualmatán, de igual manera adelanto las gestiones con los proveedores de cuyes para realizarla entrega de los pies de crías de cuyes en el municipio de Córdoba, para el mes de noviembre, tal y como esta establecido en el cronograma de ejecución.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	FECHA ACTA DE INICIO	24/06/2025
	AVANCE FÍSICO	71%
	AVANCE FINANCIERO	60% (Incluye anticipo del 40%)
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	8 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CUYÍCOLAS COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUMBAL, CÓRDOBA Y GUALMATÁN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico





FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COSECHA Y POSCOSECHA PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES EN MUNICIPIOS DE LA ZONA ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR

**Agricultura y
Desarrollo Rural**



VALOR TOTAL

\$ 6.807.394.703

SGR-AIR 60%



EJECUTOR

SAN LORENZO



BENEFICIARIOS

140



ALCANCE

140 PRODUCTORES DE CAFÉS
ESPECIALES APOYADOS EN LOS
MUNICIPIOS DE SAN LORENZO
Y CHACHAGÜI



MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

SAN LORENZO Y CHACHAGÜI



VALOR OBRA

\$ 6.551.548.308,00



VALOR INTV

\$ 247.364.334,00



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COSECHA Y POSCOSECHA PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES EN MUNICIPIOS DE LA ZONA ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$ 6.551.548.308,00
No Contrato: LP-002-2025
Contratista: CONSORCIO DE CAFÉ SAN LORENZO

CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 247.364.334,00
No Contrato: CMA-003-2025
Contratista: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES DEL SUR

OBSERVACIÓN GENERAL

De acuerdo con las actividades reportadas por el operador se avanza con normalidad con el cronograma de trabajo sin presentar observaciones que pueden afectar la normal ejecución del proyecto. Se realizaron 17 visitas de asistencia técnica a los beneficiarios, abordando la temática "Visita 4: Manejo del Sombrío"; 36 visitas de asistencia técnica, abordando la temática "Visita 5: Gestión de Registros en el Cultivo de Café; y 8 talleres (4 en Chachagüí y 4 en San Lorenzo) bajo la metodología "Aprender Haciendo".

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	29/07/2025
 AVANCE FÍSICO	8,54%
 AVANCE FINANCIERO	0%
 TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COSECHA Y POSCOSECHA PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES EN MUNICIPIOS DE LA ZONA ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico





MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA Terciaria EL ROSARIO - EL REMOLINO, ETAPA 6. MUNICIPIO DE EL ROSARIO - NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$ 7.411.022.194
SGR-AIR 60%



ALCANCE

2.00 kilómetros de
pavimento rígido, Ancho de
calzada de 6.00 metros,
Alcantarillas, Muro de
contención

EJECUTOR
INTY-QUILLA



BENEFICIARIOS
31.564



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

Taminango - El Rosario



VALOR OBRA

\$ 6.929.843.314



VALOR INTV

\$ 481.178.880



MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA Terciaria EL ROSARIO - EL REMOLINO, ETAPA 6. MUNICIPIO DE EL ROSARIO - NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$ 6.929.843.314
No Contrato: No 017-2025
Contratista: UNION TEMPORAL VIAS
DEL NORTE



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 481.178.880
No Contrato: No 016-2025
Contratista: PROVEA SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION S.A.S



OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto en ejecución normal de conformidad con el cronograma.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

14 /07/2025



AVANCE FÍSICO

14,04%



AVANCE FINANCIERO

24,68% (Anticipo)



TIEMPO DE EJECUCIÓN

8 Meses



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA Terciaria EL ROSARIO - EL REMOLINO, ETAPA 6. MUNICIPIO DE EL ROSARIO - NARIÑO

Registro Fotográfico de avance de obra





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE UN TRAMO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA ALTO LLANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL

\$4.319.551.967,62

AIR 60% (\$4.179.551.967,62)



MUNICIPIO (\$140.000.000)



ALCANCE

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 KILOMETROS DE PLACA HUELLA DE UN TRAMO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA ALTO LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EJECUTOR
SAN PABLO



BENEFICIARIOS

3.985 personas



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

SAN PABLO



VALOR OBRA

\$ 4.140.858.592,62



VALOR INTV

\$ 178.693.375,00



MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE UN TRAMO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA ALTO LLANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$ 4.130.223.437,06
No Contrato: LP-001-2025
Contratista: CONSORICO JJ PLACA HUELLA SAN PABLO



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 178.693.375,00
No Contrato: CM 001-2025
Contratista: REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES



OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto presenta un avance físico y financiero acorde a la programación oficial, sin retrasos significativos ni inconsistencias técnicas, administrativas o contractuales.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

11/08/2025



AVANCE FÍSICO

16,38%



AVANCE FINANCIERO

50% (Anticipo)



TIEMPO DE EJECUCIÓN

10 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE UN TRAMO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA ALTO LLANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Registro Fotográfico de avance de obra





CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VIA CARTAGO – SAN BERNARDO, SECTOR QUEBRADA YANANGONA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL

\$ 2.684.242.790

\$ 2.634.242.790 AIR 60%

\$ 50.000.000 AIL



EJECUTOR
SAN PEDRO DE
CARTAGO



BENEFICIARIOS

16.811



ALCANCE

1 Puente construido en vía
terciaria



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

CARTAGO – SAN BERNARDO



VALOR OBRA

\$ 2.461.332.466



VALOR INTV

\$ 222.910.324



CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VIA CARTAGO – SAN BERNARDO, SECTOR QUEBRADA YANANGONA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$ 2.461.332.466
No Contrato: U.M-2025040048
Contratista: Unión Temporal Agencia
Constructora



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 222.910.324
No Contrato: CM 001 2025
Contratista: GERMAN ALFREDO CASTRO
DELGADO



OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto en ejecución normal. Esta estipulada la entrega final para la segunda semana del mes de noviembre de 2025.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

23/04/2025



AVANCE FÍSICO

68,47%



AVANCE FINANCIERO

65,46% (Incluye
anticipo del 40%)



TIEMPO DE EJECUCIÓN

7 Meses



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VIA CARTAGO – SAN BERNARDO, SECTOR QUEBRADA YANANGONA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

📷 Registro Fotográfico del avance de obra





MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DE CHURUPAMBA, SAN ANTONIO, CAJABAMBA, EL CUCHO Y EL TEJAR CON LA VÍA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ – RUTA 2501B, CEBADAL, YACUANQUER - CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$6.771.403.939,61



AIR 60% (\$6,071 mill)
AIL (\$700 mill)



ALCANCE

Pavimentación en concreto rígido de 1,03 kilómetros, con un ancho de vía de 6 m (variable), incluyendo la construcción de obras de drenaje y estructuras de contención.

EJECUTOR



**Fundación Universidad
del Valle**



BENEFICIARIOS

24.788



MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

CONSACÁ - YACUANQUER



VALOR OBRA

\$ 6.262.193.419,61



VALOR INTV

\$ 509.210.520,00








MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DE CHURUPAMBA, SAN ANTONIO, CAJABAMBA, EL CUCHO Y EL TEJAR CON LA VÍA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ – RUTA 2501B, CEBADAL, YACUANQUER - CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

 CONTRATO OBRA	Valor: \$ 6.262.059.206,61 No Contrato: FUV.SGR.013.2025 Contratista: Consorcio Pavimento Consacá
 CONTRATO INTERVENTORÍA	Valor: \$ 509.116.272 No Contrato: FUV.SGR.015.2025 Contratista: Andrés Libardo Riascos

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	30/07/2025
 AVANCE FÍSICO	6,84%
 AVANCE FINANCIERO	32,37% (Anticipo)
 TIEMPO DE EJECUCION	12 Meses

 OBSERVACIÓN GENERAL	El contrato se encuentra en estado normal de ejecución con avance físico acorde a la programación.
--	--




Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DE CHURUPAMBA, SAN ANTONIO, CAJABAMBA, EL CUCHO Y EL TEJAR CON LA VÍA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ – RUTA 2501B, CEBADAL, YACUANQUER - CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 Registro Fotográfico de avance de obra

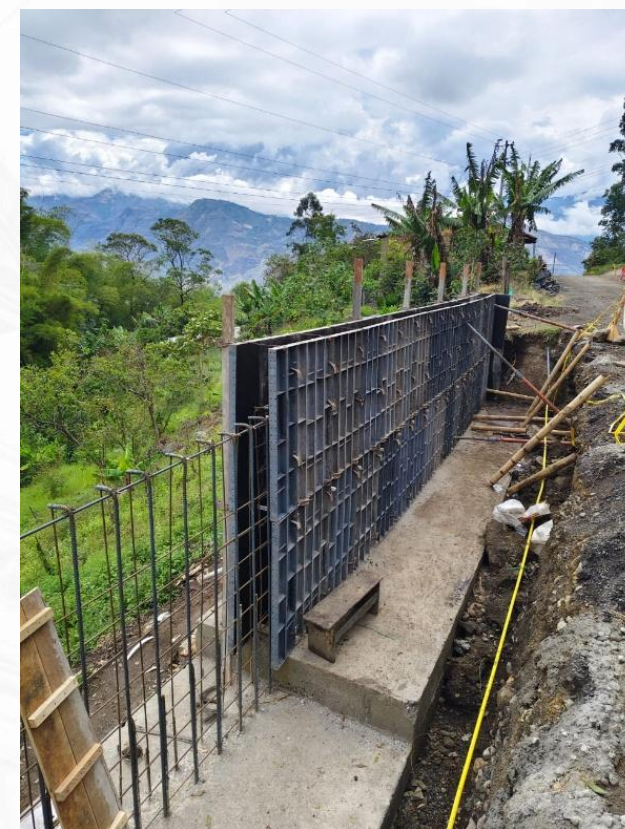



MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL MUNICIPIO DE CORDOBA Y POTOSÍ EN EL SECTOR PUENTE CHIGUACOS-LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$9.999.649.576,96

AIR 60% (\$9,499 mill)
AIL (\$500 mill)



ALCANCE

Pavimentación en concreto rígido de 2,35 kilómetros, con un ancho de vía de 6 metros, incluyendo la construcción de obras de drenaje y estructuras de contención.

EJECUTOR
INTYQUILLA



BENEFICIARIOS
16.338



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

Córdoba, Potosí



VALOR OBRA

\$ 9.313.655.013,16




VALOR INTV

\$ 685.994.563,80




MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL MUNICIPIO DE CORDOBA Y POTOSÍ EN EL SECTOR PUENTE CHIGUACOS-LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO





CONTRATOS

	CONTRATO OBRA	Valor: \$9.313.655.013,16 No Contrato: 012-2025 Contratista: Consorcio Córdoba 2025
---	--------------------------	---

	CONTRATO INTERVENTORÍA	Valor: \$685.994.563,80 No Contrato: 011 - 2025 Contratista: Consorcio Interventoría El Puente
---	-----------------------------------	---

	OBSERVACIÓN GENERAL	El contrato se encuentra en estado normal de ejecución, no presenta retrasos.
---	--------------------------------	---

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	FECHA ACTA DE INICIO	06/06/2025
	AVANCE FÍSICO	16,54%
	AVANCE FINANCIERO	50% (Anticipo)
	TIEMPO DE EJECUCION	16 Meses



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE EL MUNICIPIO DE CORDOBA Y POTOSÍ EN EL SECTOR PUENTE CHIGUACOS-LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 Registro Fotográfico de avance de obra





CONSOLIDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

**SECTOR
CULTURA**



VALOR TOTAL
\$9.080.383.429,53
SGR-AIR 60%



ALCANCE

Restauración integral del templo Nuestra Señora de la Visitación de Ancuya



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

Ancuya y Comunidad Religiosa y Cultural



VALOR OBRA

\$8,458,741,713,53



VALOR INTV

\$621,641,716,00

EJECUTOR



**SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO S.A.S.**



BENEFICIARIOS
1.663.674




CONSOLIDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO





CONTRATOS

	CONTRATO OBRA	Valor: \$8.455.793.198,95 No Contrato: 017-2025 Contratista: Unión Temporal Templo Ancuya 2025
---	--------------------------	---

	CONTRATO INTERVENTORÍA	Valor: \$619,095,552,18 No Contrato: 018-2025 Contratista: Consorcio interventoría Ancuya JMCC
---	-----------------------------------	---

	OBSERVACIÓN GENERAL	El avance físico acumulado del 11,69% es consistente con la programación, sin presentar retrasos, y refleja un desarrollo técnico controlado y progresivo.
---	--------------------------------	--

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	FECHA ACTA DE INICIO	16/05/2025
	AVANCE FÍSICO	11,69%
	AVANCE FINANCIERO	52,12% (Incluye anticipo del 50%)
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

CONSOLIDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 Registro Fotográfico de avance de obra





MEJORAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y TURISTICA DEL SECTOR EL BAJITO, DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR

VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO



VALOR TOTAL

\$ 16.999.266.865,04

\$ 15.999.266.865,04 AIR

\$ 1.00.000.00 AD MPIO

\$ 900.000.00 AIL



ALCANCE

12.892 m2 de espacio
público mejorado con vías,
ciclorrutas, zonas
recreodeportivas



MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

DISTRITO DE TUMACO



EJECUTOR

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD DEL
VALLE



BENEFICIARIOS

258.089



VALOR OBRA

\$ 15.780.961.049,04



VALOR INTV

\$ 1.218.305.816,00



MEJORAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y TURISTICA DEL SECTOR EL BAJITO, DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$ 14.871.392.505,32
No Contrato: FUV.SGR.011.2025
Contratista: UNION TEMPORAL
MALECON BAJITO 2025



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 1.272.787.706
No Contrato: FUV.SGR.009.2025
Contratista: CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA LUZ A&J
S.A.S.



OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto presenta atraso en su ejecución, respecto al cronograma, correspondiente al 2%. Proyecto en ejecución de actividades preliminares sobre área de jurisdicción del municipio. En paralelo se trabaja en la ampliación de la concesión existente para poder intervenir el área donde la Dimar tiene jurisdicción.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

25/07/2025



AVANCE FÍSICO

2,76%



AVANCE FINANCIERO

34,33% (Anticipo)



TIEMPO DE EJECUCIÓN

14 Meses




Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA ZONA URBANA Y TURISTICA DEL SECTOR EL BAJITO, DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico del Proyecto

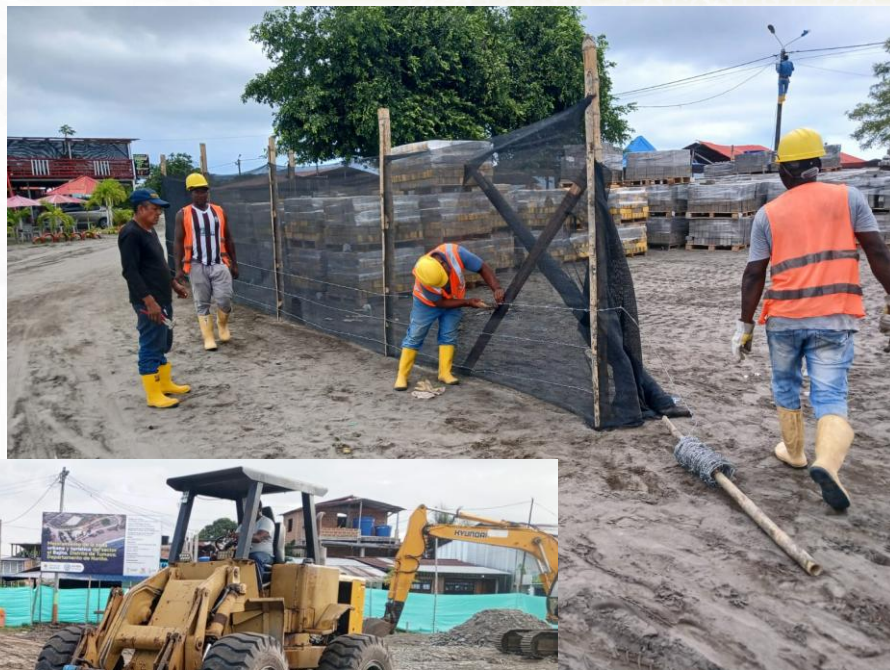



ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR TRANSPORTE



VALOR TOTAL

\$ 4.051.152.557,00

AIR Cau- \$2.025.576.279,00



AIR Nar- \$2.025.576.278,00



ALCANCE

Se realiza: levantamiento topográfico, estudio de tránsito, estudio geotécnico y de suelos, estudio hidrológico e hidráulico, estudio ambiental

EJECUTOR FONER



BENEFICIARIOS

43.684



MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

GUAPI
SANTA BARBARA



VALOR CONSULTORÍA

\$3.539.027.584



VALOR INTV

\$587.443.500



ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO





CONTRATOS

 CONTRATO OBRA	Valor: \$3.539.027.584 No Contrato: 11-CS-2025 Contratista R.LEGA INGENERIA S.A.S
 CONTRATO INTERVENTORÍA	Valor: \$512.124.973 No Contrato: 023-IN-2025 Contratista: FUNDECON

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante el periodo evaluado, se ha mantenido el desarrollo progresivo de las actividades programadas conforme al cronograma establecido, con énfasis en la consolidación de entregables técnicos y sociales. Adicionalmente, se destaca un avance financiero relevante correspondiente al pago del Acta No. 1, lo cual refleja el cumplimiento de hitos contractuales y fortalece la trazabilidad presupuestal del proyecto.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	14/07/2025
 AVANCE FÍSICO	25,35%
 AVANCE FINANCIERO	61,40% (Incluye anticipo del 50%)
 TIEMPO DE EJECUCION	14 meses




Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico

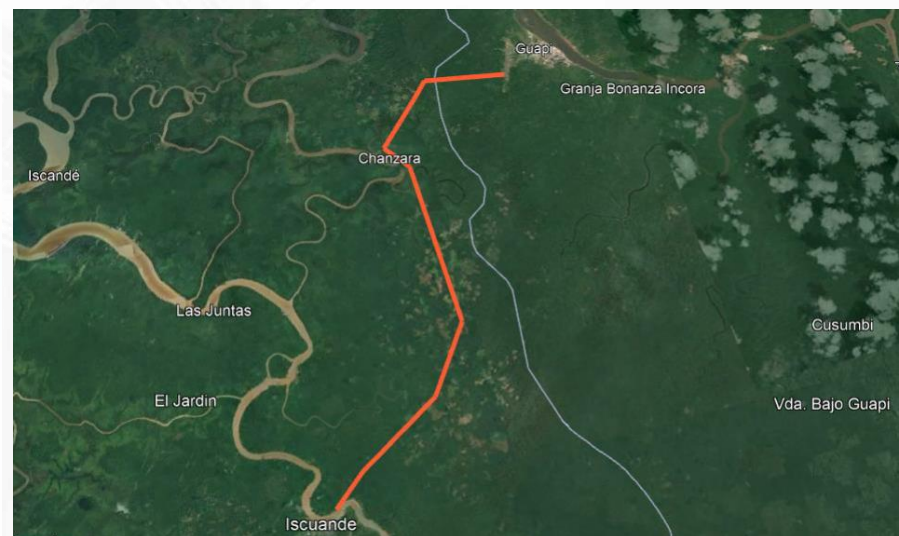



IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES COMO ALTERNATIVA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CUMBITARA, EL ROSARIO, LOS ANDES Y POLICARPA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
Agricultura y
Desarrollo
Rural



VALOR TOTAL
\$4.990.809.726
SGR-AIR 60%



EJECUTOR
LOS ANDES



BENEFICIARIOS
200



ALCANCE

200 BENEFICIARIOS CON PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA APOYADOS. 50 BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

CUMBITARA - EL ROSARIO -
LOS ANDES - POLICARPA



VALOR OBRA

\$ 4.730.625.333,00



VALOR INTV

\$ 260.184.393,00



IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES COMO ALTERNATIVA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CUMBITARA, EL ROSARIO, LOS ANDES Y POLICARPA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$ 4.730.625.333,00
No Contrato: LP-001-2025
Contratista: Corporación Asesorías Y Servicios De Ingeniería - A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 260.184.393,00
No Contrato: CMA-002-2025
Contratista: FUNDACION ONIX AVC

OBSERVACIÓN GENERAL

Por parte de las alcaldías se solicita cambio de beneficiarios por tanto para la segunda semana de octubre se suspenden las socializaciones del proyecto.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FECHA ACTA DE INICIO

16/06/2025

AVANCE FÍSICO

0,12%

AVANCE FINANCIERO

50% (Anticipo)

TIEMPO DE EJECUCIÓN

18 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES COMO ALTERNATIVA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CUMBITARA, EL ROSARIO, LOS ANDES Y POLICARPA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico





DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RED VIAL TERCIARIA Y URBANA MEJORADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR TRANSPORTE



VALOR TOTAL

\$8.544.940.699,63



AIR 60% (\$7.690.446.629,67)

Mpio (\$854.494.069,69)



ALCANCE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
EN CONCRETO ARTICULADO DE
UNA LONGITUD DE 4.14 KM EN
EL MUNICIPIO DE YACUANQUER
NARIÑO

EJECUTOR YACUANQUER



BENEFICIARIOS

11.496 personas



MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

YACUANQUER



VALOR OBRA

\$ 8.184.374.469,46



VALOR INTV

\$ 360.566.230,00



DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RED VIAL TERCIARIA Y URBANA MEJORADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$8.182.604.745,00
No Contrato: BR005-2025
Contratista: UNION TEMPORAL
RED VIAL 2025



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$360.566.230,17
No Contrato: SS172-2025
Contratista: CONSORCIO
DESARROLLO VIAL
2025



OBSERVACIÓN GENERAL

Durante el periodo comprendido entre el 20 y el 26 de octubre de 2025, se avala la información reportada, verificándose un avance físico acumulado del 26,35% frente a un 26,59% programado, lo que refleja un cumplimiento acorde con el cronograma establecido.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

24/07/2025



AVANCE FÍSICO

26,35%



AVANCE FINANCIERO

40% (ANTICIPO)



TIEMPO DE EJECUCIÓN

8 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RED VIAL TERCIARIA Y URBANA MEJORADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico de avance de obra





CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
EDUCACIÓN



VALOR TOTAL

\$ 29.195.394.017
SGR-AIR 60%



ALCANCE

1 Sedes de instituciones de educación superior con construcción y dotación



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

MUNICIPIOS DEL SUR DE
NARIÑO



VALOR OBRA

\$ 28.161.213.375,00



VALOR INTV

\$ 1.034.180.642,00

EJECUTOR
**FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD DEL
VALLE**



BENEFICIARIOS
1.053



CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$ 27.980.164.076
No Contrato: FUV.SGR.007.2025
Contratista: UNIÓN TEMPORAL UDENAR
FUTURO. RL FRANCISCO
MORA CASTRO.


CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 1.034.180.642
No Contrato: FUV.SGR.010.2025
Contratista: CAMILO ANDRES MEZA
ACOSTA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizan actividades relacionadas en el capítulo de preliminares para continuar con las excavaciones para zapatas del Bloque A en concordancia a las observaciones generadas desde la ampliación del estudio de suelos e informe geotécnico, por las patologías halladas en los predios colindantes del costado occidental (Centro Vida y Condominio Ciudadela). Se reporta un retraso del 1%, respecto al porcentaje programado, teniendo en cuenta las fuertes lluvias presentadas en el sector afectando las actividades de movimiento de tierras dada la colmatación de agua del terreno.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	15/07/2025
 AVANCE FÍSICO	2,49%
 AVANCE FINANCIERO	39,57% (Anticipo)
 TIEMPO DE EJECUCIÓN	14 Meses



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico





IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN 58 MUNICIPIOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
EDUCACIÓN



VALOR TOTAL
\$59.761.468.916,80
SGR-AIR 40%



EJECUTOR
DEPARTAMENTO
DE NARIÑO



BENEFICIARIOS
139.742



ALCANCE

Suministro de 15.843.233 raciones alimentarias en el marco de la implementación del programa de alimentación escolar, en 58 municipios focalizados Nariño



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

57 no certificados y Pasto



VALOR

Total: \$59.761.468.917



TIEMPO DE
EJECUCION

6 Meses



IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN 58 MUNICIPIOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



CONTRATO

1

Valor: \$12.007.319.420
No Contrato: 3094-2025
Contratista: Consejo Comunitario Integración del Telembí



CONTRATO 2

Pasto

Valor: \$17.237.688.832
No Contrato: 3472-2025
Contratista: Consorcio Nutriendo Corazones2025-2



CONTRATO 3

Mayoritario

Valor: \$28.951.500.753,8
No Contrato: 3398-2025
Contratista: Consorcio Alimentos Para la Niñez



FECHA ACTA DE INICIO

27/06/2025



AVANCE FÍSICO

50%



AVANCE FINANCIERO

0%



OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se ejecuta teniendo en cuenta los calendarios escolares propios de cada territorio.




Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

Implementación del programa de alimentación escolar PAE en 58 municipios focalizados del Departamento de Nariño



Registro Fotográfico de avance

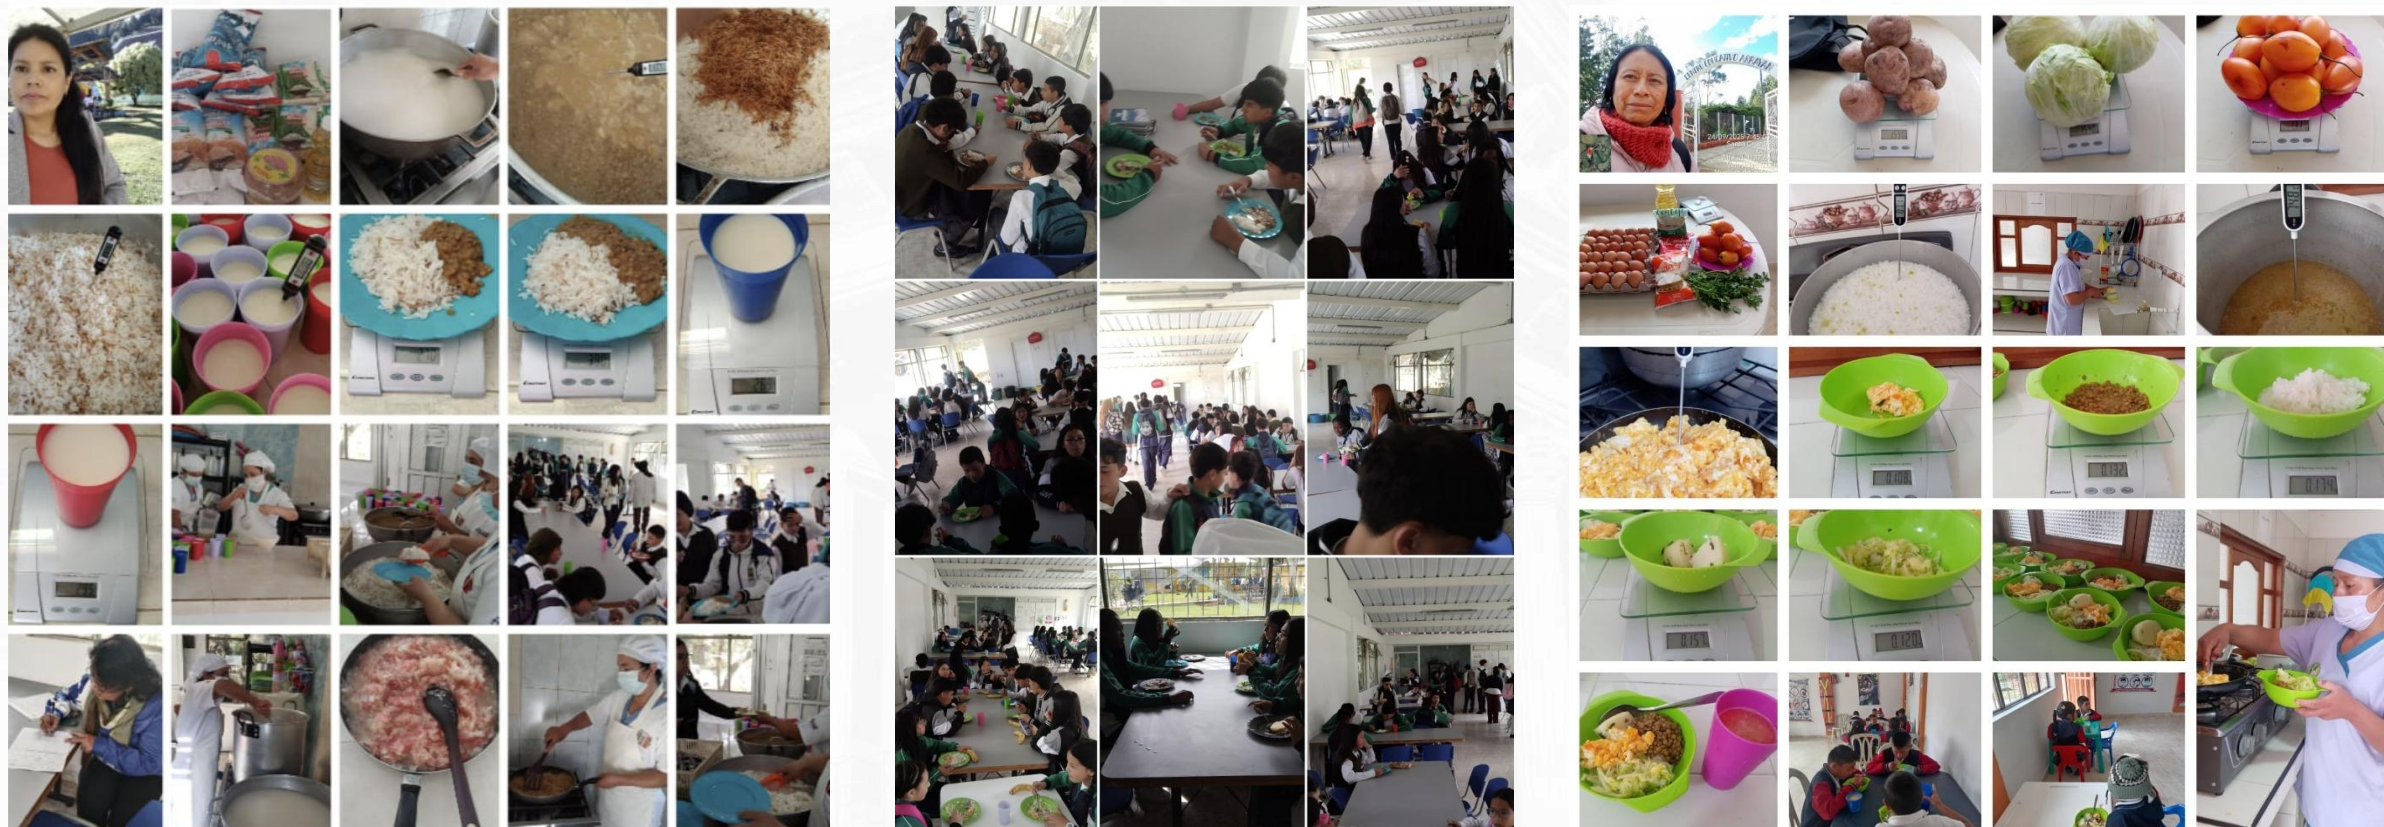



MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - ETAPA 2 DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
DEPORTE Y
RECREACIÓN



EJECUTOR
OLAYA HERRERA



VALOR TOTAL
\$5.930.693.424,34

AIR 60% (\$5,730 mill)
AIL (\$ 200 mill)



BENEFICIARIOS
120.000



ALCANCE

Mejoramiento del polideportivo municipal. Construcción de cubierta, mejoramiento de 2 canchas multifuncionales, zonas comunes.



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Olaya Herrera, La Tola,
Mosquera, El Charco, Santa
Barbara



VALOR OBRA

\$ 5.338.663.274,16



VALOR INTV

\$ 592.030.150,28



MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - ETAPA 2 DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$5.338.597.373,42
No Contrato: LP001-2025
Contratista: Consorcio
Polideportivo
Etapa 2 GAMJ



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$592.030.150
No Contrato: 006-2025
Contratista: Consorcio
Interventores
Olaya Herrera



OBSERVACIÓN GENERAL

Durante la semana el contratista realizó actividades preliminares dando cumplimiento al cronograma de obra. No se presentan atrasos.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

20/08/2025



AVANCE FÍSICO

6,01%



AVANCE FINANCIERO

25% (Anticipo)



TIEMPO DE EJECUCION

13 Meses



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - ETAPA 2 DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Registro Fotográfico de avance





MEJORAMIENTO DE LA VIA CON CÓDIGO 02002, QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS Y MAGUI PAYÁN, SECTOR “EL FERRI” EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL

\$ 19.990.635.960,20

AIR 60% (\$19,990 mill)



EJECUTOR
BARBACOAS



BENEFICIARIOS

82.448



ALCANCE

Pavimentación en concreto rígido de 2.00 km, con un ancho de vía de 6.60 metros, incluyendo la construcción de obras de drenaje, estructuras de contención y estabilizaciones



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

Barbacoas, Magüi Payan



VALOR OBRA

\$ 18.981.373.160,20



VALOR INTV

\$ 1.009.262.800



MEJORAMIENTO DE LA VIA CON CÓDIGO 02002, QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS Y MAGUI PAYÁN, SECTOR “EL FERRI” EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

	CONTRATO OBRA	Valor: \$18.958.467.061,00 No Contrato: LP-003-2025 Contratista: Consorcio Vía El Ferri.
--	----------------------	---

	CONTRATO INTERVENTORÍA	Valor: \$1.007.097.628 No Contrato: CM 006 - 2025 Contratista: Consorcio Intervial CIPA INARCONST
--	-------------------------------	--

	OBSERVACIÓN GENERAL	Durante el período comprendido, entre el 6 al 18 de octubre, se prosiguió con las operaciones de corte y conformación de taludes, la ampliación de la sección vial y el transporte y acopio de material granular tipo rajón.
--	----------------------------	--

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	FECHA ACTA DE INICIO	12/09/2025
	AVANCE FÍSICO	20,5%
	AVANCE FINANCIERO	0%
	TIEMPO DE EJECUCION	18 Meses



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON CÓDIGO 02002, QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS Y MAGUI PAYÁN, SECTOR “EL FERRI” EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Registro Fotográfico de avance





MEJORAMIENTO DEL ESPACIO CULTURAL Y DE INTEGRACIÓN MEDIANTE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE CUEVAS LEIVA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO

SECTOR

VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO



VALOR TOTAL

\$6.626.675.092,40

6.526.675.092,40 AIR

\$ 100.000.000 AIL



ALCANCE

Mejorar 4.700 m2 de espacio público y sus vías perimetrales, para el desarrollo de actividades de integración cultural, sana convivencia y entrega de zonas recreativas y turísticas en el parque principal del Municipio

EJECUTOR

LA UNION



BENEFICIARIOS

13426



MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

LA UNION



VALOR OBRA

\$ 5.944.308.862,40



VALOR INTV

\$ 682.366.230,0



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO CULTURAL Y DE INTEGRACIÓN MEDIANTE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE CUEVAS LEIVA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$ 5.695.583.791,86
No Contrato: 487-2025
Contratista: CONSORCIO PARQUE LA UNIÓN





CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 682.366.230
No Contrato: CM-001-2025
Contratista: CONSORCIO INTERVENTORES G&L

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante la semana del 20 al 25 de octubre, se desarrollaron actividades de excavación y tala de árboles conforme a los planos y permisos ambientales del proyecto. Se garantizó la disposición final del material en el botadero autorizado y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. A pesar de las lluvias que afectaron parcialmente el rendimiento, se implementaron acciones de mitigación como el manejo de aguas superficiales y la estabilización de accesos.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	FECHA ACTA DE INICIO	01/09/2025
	AVANCE FÍSICO	3,00%
	AVANCE FINANCIERO	34,38% (Anticipo)
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	10 Meses



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO CULTURAL Y DE INTEGRACIÓN MEDIANTE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE CUEVAS LEIVA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN



Registro Fotográfico de avance





FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE JÓVENES EMPRENDEDORES EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
INDUSTRIA
COMERCIO Y
TURISMO



VALOR TOTAL
\$12.038.396.716,10
SGR-AIR 60%



ALCANCE

FORTALECIMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE JÓVENES
EMPRENDEDORES EN EL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

64 municipios del
Departamento de Nariño



VALOR OBRA

\$ 10.708.199.732,00



VALOR SUP

\$ 1.330.196.984,10

EJECUTOR



**Fundación Universidad
del Valle**



BENEFICIARIOS


728 personas




FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE JÓVENES EMPRENDEDORES EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO





CONTRATOS

	CONTRATO OBRA	Valor: \$10.708.199.732 No Contrato: FUV.SGR.018.2025 Contratista: CONSORCIO PRIMERO NARIÑO
---	----------------------	--

	APOYO A LA SUPERVISIÓN	Valor: \$560.000.000 Contratista: Contratos OPS FUV
---	-------------------------------	--

	OBSERVACIÓN GENERAL	La convocatoria finalizó con 2.400 inscripciones en la plataforma de las cuales 1.166 fueron efectivas (terminadas) y se encuentra en proceso de evaluación para la selección de los 728 beneficiarios definitivos.
---	----------------------------	---

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	FECHA ACTA DE INICIO	29/08/2025
	AVANCE FÍSICO	4,16%
	AVANCE FINANCIERO	35,00% (Anticipo)
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE JÓVENES EMPRENDEDORES EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico de avance





MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA ROSA- MUNICIPIO DE CUMBITARA

SECTOR
EDUCACION



VALOR TOTAL
\$7.996.057.046,68
SGR-AIR 60%



ALCANCE

Construcción de un auditorio, cuatro aulas, oficinas rectoría y coordinación, sala de profesores, cancha multifuncional con gradería y cubierta, rampa de acceso para discapacidad

EJECUTOR



Servicios
Integrales del
Estado SAS



BENEFICIARIOS
1.200



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

CUMBITARA
POLICARPA



VALOR OBRA

\$7.488.299.087,28



VALOR INTV

\$507.757.959,40



MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA ROSA- MUNICIPIO DE CUMBITARA

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$7.485.449.520
No Contrato: 039-2025
Contratista: UNION TEMPORAL
COLEGIO SANTA ROSA
2025



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$507.099.714
No Contrato: 040-2025
Contratista: SGD INGENERIA
S.A.S



OBSERVACIÓN GENERAL

En cumplimiento de las labores de seguimiento técnico y administrativo al contrato de obra, se evidencia que durante el periodo evaluado el contratista avanza en la ejecución de las actividades de excavación con maquinaria para la cimentación del muro de contención, así como en el transporte y disposición del material sobrante en el sitio autorizado.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

12/09/2025



AVANCE FÍSICO

0,46%



AVANCE FINANCIERO

50% (Anticipo)



TIEMPO DE EJECUCION

12 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA ROSA- MUNICIPIO DE CUMBITARA



Registro Fotográfico de avance





MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO PIZARRO, MOSQUERA Y TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL



VALOR TOTAL

\$4.994.890.247

AIR 60% (\$4,994 Mill)



ALCANCE

Mejorar los conocimientos técnicos y tecnológicos para el manejo de sistemas agropecuarios, se atenderán con asistencia técnica, pecuaria y ambiental a productores.

EJECUTOR



Servicios Integrales
del Estado S.A.S



BENEFICIARIOS

275



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Francisco Pizarro,
Mosquera, San Andrés De
Tumaco



VALOR OBRA

\$ 4.756.173.450,00



VALOR INTV

\$ 238.716.797,00



OBSERVACIÓN
GENERAL

Se encuentra adjudicado de acuerdo al cronograma, pendiente publicación.



MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO PIZARRO, MOSQUERA Y TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$4.753.327.771,37
No Contrato: 051-2025
Contratista: FUNDACION CAMINOS
DEL FUTURO
NIT. 900.550.757-0



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$238.716.797,00
No Contrato: 052-2025
Contratista: SAYDA MILENA TEPUD
ORTIZ



OBSERVACIÓN GENERAL

Durante la quinta semana de ejecución, comprendida entre el 13 y el 19 de octubre, la interventoría reporta la toma de 61 muestras de suelo en los terrenos de las familias beneficiarias, con el fin de realizar el análisis físico-químico básico y elaborar los respectivos planes de fertilización para los predios a intervenir dentro del proyecto. Esta actividad representa un avance físico acumulado del 0,68%, frente a un porcentaje programado acumulado del 0,85% para la quinta semana, evidenciándose así un atraso del 0,17%.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

15/09/2025



AVANCE FÍSICO

0,68%



AVANCE FINANCIERO

50% (Anticipo)



TIEMPO DE EJECUCION

10 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO PIZARRO, MOSQUERA Y TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Registro Fotográfico





**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LAS SUBREGIONES
COORDILLERA Y GUAMBUYACO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL
25NR03-5 PUERTO RICO – POLICARPA, EN EL MUNICIPIO DE POLICARPA, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO**

**SECTOR
TRANSPORTE**



VALOR TOTAL

\$15.829.169.707,0

AIR 60% (\$15,702 mill)



AIL (\$ 127 mill)



ALCANCE

Mejoramiento de 11,37 km, construcción de obras de contención, pavimentación de 2,3 km y la construcción de obras de drenaje

**EJECUTOR
POLICARPA**



BENEFICIARIOS

18.162



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

El Peñol - Policarpa



VALOR OBRA

\$ 14.990.362.507,00



VALOR INTV

\$ 838.807.200,00



MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LAS SUBREGIONES COORDILLERA Y GUAMBUYACO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL 25NR03-5 PUERTO RICO – POLICARPA, EN EL MUNICIPIO DE POLICARPA, DEPARTAMENTO DE

CONTRATOS NARIÑO

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO OBRA

Valor: \$14.987.364.429,50
No Contrato: 003 DE 2025
Contratista: Consorcio
Policarpa Vial
2025

CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 838.807.200,00
No Contrato: 006-2025
Contratista: Consorcio
Policarpa Anda
Vías

OBSERVACIÓN GENERAL

El contratista se encuentra en campo realizando la actividad de localización y replanteo en donde a la fecha cuenta con un kilometro tramo a intervenir definidos los puntos como eje vial, chaflanes y borde de vía.

FECHA ACTA DE INICIO

30/09/2025

AVANCE FÍSICO

0,09%

AVANCE FINANCIERO

0%

TIEMPO DE EJECUCION

18 Meses



CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL

\$ 8.501.938.617,53

AIR 60% (\$8,001 mill)



AIL (\$500 mill)



ALCANCE

Construcción de una
glorieta para el acceso al
terminal de transportes de
Túquerres

EJECUTOR
TUQUERRES



BENEFICIARIOS

81.858



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

Sapuyes, Ospina, Guaitarilla,
Imués, Túquerres



VALOR OBRA

\$ 8.105.646.721,53



VALOR INTV

\$ 396.291.896,00



CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA DE ACCESO AL TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$8.075.202.745,9
No Contrato: LP-001-2025
Contratista: Unión Temporal
Contruobra HGC

CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$392.961.800,00
No Contrato: CMA-004 - 2025
Contratista: Consorcio IBY

OBSERVACIÓN GENERAL

Se inició el proceso de gestión predial, que comprendió la identificación, delimitación y verificación topográfica de los terrenos, la revisión de información catastral y jurídica, y la socialización inicial con los propietarios y/o poseedores de las áreas involucradas. Se efectuaron visitas técnicas conjuntas y reuniones de coordinación institucional orientadas a consolidar la información necesaria para garantizar la disponibilidad de los predios, asegurando que todas las actuaciones se desarrollaran conforme a la normativa vigente y a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	2/10/2025
---	-----------

 AVANCE FÍSICO	1,09%
--	-------

 AVANCE FINANCIERO	30%
--	-----

 TIEMPO DE EJECUCION	8 Meses
---	---------



MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25NR01-5 PLAZUELAS - BELÉN, SECTOR PLAZUELAS CAMPO DE MARIA ALTO ETAPA II, MUNICIPIO DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$8.379.637.059
SGR-AIR 60%



EJECUTOR
MUNICIPIO DE
BELÉN



BENEFICIARIOS
29519



ALCANCE

Mejoramiento de la infraestructura vial en 1.57 km, con un ancho promedio de 6m, con estructuras de pavimento en concreto rígido y articulado.



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Belén
Colón Génova



VALOR OBRA

\$ 8.070.223.731



VALOR INTV

\$ 309.413.328



MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25NR01-5 PLAZUELAS - BELÉN, SECTOR PLAZUELAS CAMPO DE MARIA ALTO ETAPA II, MUNICIPIO DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$ 8.030.837.974
No Contrato: No. LP 002-2025
Contratista: CONSORCIO VIAL
PLAZUELAS ETAPA
II



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$309.413.328,00
No Contrato: CM 001-2025
Contratista: SANDRA YANNETH
DIAZ MORILLO



OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó la actividad de desmonte y limpieza en zonas no boscosas. En la zona se presenta una temporada de lluvias intensas, lo cual impide realizar los trabajos programados de excavaciones y cortes en talud, debido al riesgo que representa realizar movimiento de tierras en estas condiciones.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

14/10/2025



AVANCE FÍSICO

0,03%



AVANCE FINANCIERO

0%



TIEMPO DE EJECUCION

10 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25NR01-5 PLAZUELAS - BELÉN, SECTOR PLAZUELAS CAMPO DE MARIA ALTO ETAPA II, MUNICIPIO DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico



24 oct 2025 10:31:45 a.m.
Altitud: 2764.0msnm
Velocidad: 0.0km/h
consorcio vial Marialto



MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA SECTOR CUMBAL - EL VOLCAN, MUNICIPIO DE CUMBAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

**SECTOR
TRANSPORTE**



VALOR TOTAL

\$12,669,091,636,69



AIR (\$12,519Mill)

AIL (\$150Mill)

**EJECUTOR
CUMBAL**



BENEFICIARIOS

39,794



ALCANCE

3,122 km de pavimento
rígido, mejorando 3,454
metros de vía,
Alcantarillas, Muros de
contención, señalización



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

CUMBAL- CUASPUD



VALOR OBRA

\$11.840.305.569,49



VALOR INTV

\$828.786.067,20



MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA SECTOR CUMBAL - EL VOLCAN, MUNICIPIO DE CUMBAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$11.548.100.716,90
No Contrato: LP 001-2025
Contratista: CONSORCIO
HORIZONTE VIAL



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$826.790.675,2
No Contrato: CM 002-2025
Contratista: CONSORCIO
INTERVÍAS CUMBAL



OBSERVACIÓN GENERAL

La obra se encuentra en ejecución normal, con un porcentaje de avance del 0,15% frente a un porcentaje programado del 0,075%.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

20/10/2025



AVANCE FÍSICO

0,15%



AVANCE FINANCIERO

0%



TIEMPO DE EJECUCION

16 MESES



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA SECTOR CUMBAL - EL VOLCAN, MUNICIPIO DE CUMBAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO



Registro Fotográfico





4 Proyectos Contratados por Iniciar

Secretaría de Planeación



APROVECHAMIENTO DE LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL PUERTO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$3.391.063.984,00
SGR-AIR 60%



ALCANCE

Potencializar la vocación productiva del puerto de Tumaco en relación con su entorno y las oportunidades de mercado nacional e internacional mediante un Documento de planeación estratégica para el desarrollo de la vocación productiva del puerto de Tumaco, Nariño

EJECUTOR



**Fundación Universidad
del Valle**



BENEFICIARIOS

257.052 personas



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

San Andrés de Tumaco



VALOR OBRA

\$ 2.827.083.952,00



VALOR INTV

\$ 563.980.032,00



APROVECHAMIENTO DE LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL PUERTO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$ 2.827.083.952
No Contrato: Está en proceso
Contratista: UNIÓN TEMPORAL
TUMACO PUERTO
INTELIGENTE



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 563.980.032
No Contrato: FUV.SGR.016.2025
Contratista: PABLO ALBERTO
CAICEDO PABÓN



OBSERVACIÓN GENERAL

La UT se encuentra en trámite de expedir un RUT de persona extranjera sin domicilio en Colombia para poder actualizar el RUT de la UT .

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

N/A



AVANCE FÍSICO

N/A



AVANCE FINANCIERO

N/A



TIEMPO DE EJECUCIÓN

12 MESES



MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL TAMINANGO - EL ROSARIO - POLICARPA - CUMBITARA, EN EL SECTOR DEL TRAMO EL CRUCE- PUENTE RIO PATÍA, EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$8.231.580.975
SGR-AIR 60%



EJECUTOR
TAMINANGO



BENEFICIARIOS
48.138



ALCANCE

1,78 kilómetros de
pavimento rígido, Ancho de
calzada de 6.00 metros,
Alcantarillas, Muro de
contención



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**

Taminango - El
Rosario - Policarpa -
Cumbitara



VALOR OBRA

\$ 7.773.278.655



VALOR INTV

\$ 458.302.320



MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL TAMINANGO - EL ROSARIO - POLICARPA - CUMBITARA, EN EL SECTOR DEL TRAMO EL CRUCE- PUENTE RIO PATÍA, EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$ 7.742.805.115
No Contrato: LP 001-2025
Contratista: CONSORCIO CORREDOR
GRUPO VIAL

CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$ 458.302.320
No Contrato: CMA-001 DE 2025
Contratista: Consorcio vial
Taminango 2025

OBSERVACIÓN GENERAL

Pendiente firma de acta de inicio por tramites de legalización de contrato de interventoría. Se informa que la fecha probable de inicio esta proyectada para el 4 de noviembre de 2025.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	N/A
 AVANCE FÍSICO	N/A
 AVANCE FINANCIERO	N/A
 TIEMPO DE EJECUCIÓN	11 Meses



MEJORAMIENTO DE LA VIA CASA BLANCA (CRUCE RUTA 25ANR01) - TAJUMBINA CODIGO 25ANR01-03, MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL

\$ 10.376.639.276
AGR-AIR 60%



ALCANCE

Mejoramiento de 3.141 Km en Placa Huella, construcción de obras de drenaje y muros de contención

EJECUTOR
La Cruz



BENEFICIARIOS
35.469



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

La Cruz, San Pablo



VALOR OBRA

\$ 9.726.182.125



VALOR INTV

\$ 650.457.151



MEJORAMIENTO DE LA VIA CASA BLANCA (CRUCE RUTA 25ANR01) - TAJUMBINA CODIGO 25ANR01-03, MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS

CONTRATO OBRA

Valor: \$
No Contrato: 9.714.440.375,00
Contratista: LP-003-2025
Consortio Entre
Vias Casa Blanca





CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$650,457,151,00
No Contrato: C.M. 001- 2025
Contratista: CONSORCIO
TAJUMBINA 2025

OBSERVACIÓN GENERAL

Por parte del contratista de obra ya se constituyeron pólizas, a la espera que el municipio apruebe. Para el contrato de Interventoría se encuentra en proceso la expedición del registro presupuestal.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 FECHA ACTA DE INICIO	N/A
 AVANCE FÍSICO	N/A
 AVANCE FINANCIERO	N/A
 TIEMPO DE EJECUCION	14 Meses



FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA FAMILIAR CON EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARÁNDANOS EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SECTOR
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL



VALOR TOTAL
\$2.707.081.050,00

AIR 60% (\$2,707 mill)



ALCANCE

El proyecto busca beneficiar a 30 familias rurales productoras mediante el establecimiento de 600 m² de cultivo de arándanos tecnificado, para un total de 1,8 hectáreas

EJECUTOR



Servicios Integrales
del Estado S.A.S



BENEFICIARIOS

120



MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Guachucal, Cumbal, Cuaspud
Carlosama



VALOR OBRA

\$ 2.505.625.950,00



VALOR INTV

\$ 201.455.100,00

OBSERVACIÓN
GENERAL



FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA FAMILIAR CON EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARÁNDANOS EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATOS



CONTRATO OBRA

Valor: \$2.504.083.071,00
No Contrato: 054-2025
Contratista: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL,
LA INNOVACION, MEDIO
AMBIENTE Y LA PAZ -
FUNDIMPAZ



CONTRATO INTERVENTORÍA

Valor: \$201.455.100,00
No Contrato: 055-2025
Contratista: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO
SOCIAL Y SOSTENIBLE
TERRITORIAL



OBSERVACIÓN GENERAL

Según lo informado por el supervisor, se encuentra pendiente la entrega de la documentación requerida por parte del contratista y del interventor del proyecto.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FECHA ACTA DE INICIO

N/A



AVANCE FÍSICO

N/A



AVANCE FINANCIERO

N/A



Gobernación de
NARIÑO



1 Proyecto aprobado, en proceso de
estructuración de estudios previos para
contratación

Secretaría de Planeación



MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL DISTRITO DE TUMACO (SECTOR LA GUAYACANA) Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN (VIA A SAN JOSÉ) MEDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERTS EN EL DISTRITO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE

NARIÑO

SECTOR
TRANSPORTE



VALOR TOTAL
\$5.678.475.781,00



AIR 60%



ALCANCE

Construcción de 11 Box Cullverts distribuidos en la vía que comunica el distrito de Tumaco (Sector La Guayacana) y el municipio de Roberto Payán (Vía San José) en el distrito de Tumaco Roberto Payán y San Andrés de Tumaco

EJECUTOR



**Servicios Integrales
del Estado S.A.S**



BENEFICIARIOS

28170



**MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS**



VALOR OBRA

\$ 5.232.948.587,00



VALOR INTV

\$ 445.527.194,00

OBSERVACION
GENERAL

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación



CICLO DE PROYECTOS



GESPROY SGR - SEGUIMIENTO

- Plataforma tecnológica de seguimiento creada DNP
- Entidades ejecutoras: Consolidan y registrar información en tiempo real.
- Perfiles:
 - Elabora y revisa (supervisor)
 - Aprueba y envía (Representante Legal)



Aceptación – reporte de información



me permito manifestar que como entidad ejecutora garantiremos la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) del DNP.



MICROGERENCIA DE PROYECTOS SGR





Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación

PROYECT NAR



Gobernación de
NARIÑO



Proyectos
Gobernación
de Nariño

ProjectNar Carlos López Cipagauta

Administrar proyectos

[Inicio](#) / [proyectos](#)

Módulo detalles del proyecto: 2024003520027.

Localización del proyecto

Municipio	Subregión	Zona	Latitud	Longitud
Cumbitara	Cordillera	Rural	1.6477455	-77.5807284

El municipio es PDET?
☐ Si ☒ No

Valor proyecto: 4,990,809,726.00

Municipios beneficiados

Valor inversión en:Cumbitara	Población beneficiada	Nro empleos	Valor inversión en:El Rosario	Población beneficiada	Nro empleos
1,247,702,431.50	50	5	1,247,702,431.50	50	5
Valor inversión en:Los Andes Sotomayor	Población beneficiada	Nro empleos	Valor inversión en:Polcarpa	Población beneficiada	Nro empleos
1,247,702,431.50	50	5	1,247,702,431.50	50	5
Valor inversión en:Los Andes Sotomayor	Población beneficiada	Nro empleos	Valor inversión en:Polcarpa	Población beneficiada	Nro empleos
1,247,702,431.50	50	5	1,247,702,431.50	50	5

[Incluir más municipios](#)

Link: <https://projectnar.narino.gov.co/>

Gracias



Gobernación de
NARIÑO

Secretaría
de Planeación
