

SPD-PDA-G-1050-02

San Juan de Pasto, 11 de julio de 2025

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO
E.S.D

Asunto: Informe de acciones en atención a orden judicial - Plan para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de Nariño

Radicación: 52001-23-33-2017-0639-00

Medio de control: Acción popular

Despacho de Conocimiento: Tribunal Administrativo de Nariño

Demandante: Omar Armando Benavides Cerón

Demandado: Municipios de Ipiales – (N) – Empobando E.S.P. Corponariño (CAR) – Gobernación de Nariño, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible – Ministerio de hacienda y CréditoPúblico – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otros.

Periodo: Mayo y junio de 2025

Cordial saludo.

En atención a las ordenes establecidas en los distintos comités de verificación realizados en atención a la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño el día 20 de noviembre de 2023, dentro del proceso de acción popular No 2017-0639, la Subsecretaría de Economía regional y Agua Potable PDA Nariño se permite presentar el siguiente informe de avances en lo que corresponde a sus competencias y en atención a las órdenes judiciales impartidas para los meses de mayo y junio de 2025:

1. Proyectos de pre-inversión e inversión asociados a Plantas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR en municipios condenados bajo la sentencia de primera instancia en la acción popular No 2017-0639

Se precisa que, teniendo en cuenta que el PDA Nariño, de conformidad con el Decreto 1425 de 2019 “*Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento*”, es considerado una herramienta Departamental que **coadyuva** estratégicamente en la implementación de proyectos interdisciplinarios dentro del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en los **municipios vinculados a este esquema**.

De ésta manera, en el marco del PDA NARIÑO, tal como se reporto en el informe con corte a diciembre de 2024, se registra el siguiente avance en los proyectos aprobados que benefician los siguientes municipios condenados en el fallo de la acción constitucional antes descrita:

MUNICIPIO	PROYECTO	AVANCE
TANGUA	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE.	Consultoría contratada por el Municipio y en ejecución. Interventoría contratada por el Departamento. Inició su ejecución el 26 de mayo de 2025.
CUASPUD	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA MACAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUASPUD DEPARTAMENTO DE NARIÑO, Y CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DISEÑOS TÉCNICOS, HIDRAULICOS, Y ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO DE MACAS DEL MUNICIPIO DE CUASPUD	Proyecto en ejecución, con avance del 83%



TÚQUERRES	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PTAR- DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	El municipio adjudicó la consultoría a través de Concurso de Méritos Abiertos CMA 002-2025 Por su parte el Departamento publicó el proceso a la plataforma del SECOP II, identificado como “Invitación de mínima cuantía IMC 017-2025”, no obstante, el mismo fue declarado desierto mediante Resolución 038 de 4 de junio de 2025. A la fecha, el proceso se encuentra nuevamente en trámite por parte de la Gobernación de Nariño, a través del Departamento Administrativo de Contratación
TÚQUERRES	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PTAR- DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE YASCUAL EN EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	El municipio adjudicó la consultoría a través de Concurso de Méritos Abiertos CMA 003-2025. Por su parte el Departamento publicó el proceso a la plataforma del SECOP II, identificado como “Invitación de mínima cuantía IMC 022-2025”, no obstante, el mismo fue declarado desierto mediante Resolución 040 de 6 de junio de 2025. A la fecha, el proceso se encuentra nuevamente en trámite por parte de la Gobernación de Nariño, a través del Departamento Administrativo de Contratación
TÚQUERRES	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PTAR- EN EL CORREGIMIENTO DE CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	El municipio adjudicó la consultoría a través de Concurso de Méritos Abiertos CMA 001-2025. Por su parte el Departamento publicó el proceso a la plataforma del SECOP II, identificado como “Invitación de mínima cuantía IMC 019-2025”, no obstante, el mismo fue declarado desierto mediante Resolución 044 de 10 de junio de 2025. A la fecha, el proceso se encuentra nuevamente en trámite por parte de la Gobernación de Nariño, a través del Departamento Administrativo de Contratación
YACUANQUER	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER	El Municipio adjudicó la consultoría mediante proceso No BR006-2025. Por su parte el Departamento se encuentra adelantando la documentación para la contratación de la interventoría a dicho proyecto.
TÚQUERRES – SANTACRUZ – SAMANIEGO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL TRAYECTO VIAL TÚQUERRES – SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	Proyecto en ejecución, con avance del 78%
CUMBAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO CUMBAL - NARIÑO	El Municipio adjudicó la consultoría, mediante proceso No CM001-2025 Por su parte el Departamento publicó el proceso a la plataforma del SECOP II, identificado como “Concurso de Méritos CM008-2025
SANDONÁ	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Proyecto en ejecución, con avance del 30%



PROVIDENCIA	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) PARA EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Proyecto en ejecución, con avance del 30%
ALDANA	OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN LUIS FASE I DEL MUNICIPIO DE ALDANA (NARIÑO)	El proyecto, se encuentra en ejecución con un avance del 90%, resaltando que las obras en la parte rural culminaron y se está trabajando en el centro poblado de la vereda San Luis.
OSPINA	CONSTRUCCIÓN PTARs DOMÉSTICAS PARA EL SECTOR DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE OSPINA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	El Municipio adjudicó la obra mediante proceso No LP002-2025 Por su parte el Departamento se encuentra adelantando la documentación para la contratación de la interventoría a dicho proyecto.

Por otra parte, los municipios de Imués y Potosí han priorizado las siguientes iniciativas:

MUNICIPIO	PROYECTO	AVANCE
POTOSÍ	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA CÁRDENAS, MUNICIPIO DE POTOSÍ DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Revisión por parte del Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos - Ventanilla Única Nariño.
IMUÉS	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO PILCUAN LA RECTA, MUNICIPIO DE IMUÉS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Emisión de Concepto favorable por parte del Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos - Ventanilla Única Nariño. Cumplido este requisito, el proyecto se presentará en el próximo Comité Directivo del PDA Nariño para su correspondiente aprobación y asignación.

2. Reuniones interinstitucionales


La Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable- PDA Nariño-, continuó con la participación activa por parte del personal de nuestra dependencia en la mesa del Consejo Territorial de Salud Ambiental (COTSA), de 9 de mayo de 2025.

Se reitera que estas mesas cuentan en general con la participación del IDSN, Corponariño, Empoobando, el Plan Departamental de Agua (PDA), la Secretaría de Salud del Municipio de Ipiales y otras entidades competentes, en las cuales se discute desde las perspectivas y responsabilidades de cada entidad la problemática que motivó la acción popular objeto de seguimiento, entre otros temas. (se adjunta acta de la reunión antes citada)

Sin otro particular,



ANDRES DARIO RIASCOS ARAUJO
Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable
Gestor PDA Nariño (E)



Proyectó aspectos legales:
Ingrid Rodríguez Narvárez
P.U. Componente jurídico
PDA Nariño



Revisó: Wilton Javier Erazo Dulce
Apoyo Coordinación
PDA Nariño



	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 7

Nombre de la Reunión		Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°									
		Día	Mes	Año												
MESA TECNICA DE AGUAS – COTSA – CONTAMINACION RIO BLANCO.		09	05	2025	09:00	12:30	1									
LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECCION IDSN																
Asistentes																
N°	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa		Firma											
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA																
Orden del día																
N°	Temática					Responsable										
1	Saludo de bienvenida a cargo de la Dirección del IDSN o su delegado					IDSN										
2	Llamado de lista y verificación de Quorum					IDSN										
3	Verificación cumplimiento compromisos reunión 21/03/2025					IDSN										
5	Proposiciones y varios (Solicitud de informes acciones integrantes de la mesa)					IDSN										
Desarrollo																
Se da inicio a la reunión por parte de la Ingeniera Luisa Córdoba Profesional Universitario del IDSN, con el llamado a lista para verificación de quorum y posterior seguimiento de compromisos del 21 de marzo de 2025. En primera medida se da lectura del oficio enviado por CORPONARIÑO a los integrantes de la mesa, en aclaración a los compromisos adquiridos en la reunión del 21 de marzo, mencionando en el oficio que los representantes de Corponariño, allí presentes, hicieron hincapié en que no tenían la potestad de comprometer a la entidad en cuanto a complementar el estudio de monitoreo del Rio Blanco y sus afluentes con un estudio de modelación donde se logre determinar un escenario real teniendo en cuenta los vertimientos generados a la fuente y las condiciones actuales y futuras del cuerpo hídrico. Sin embargo, mencionan que en aras de coadyuvar en encontrar una solución a la problemática de contaminación del cuerpo hídrico por parte de la Corporación se ha realizado un análisis profundo para implementar un modelo de calidad del agua correspondiente a un escenario base o actual, que refleje las condiciones reales del río Blanco a partir de datos observados de caudal, información teórica relacionada con caracterizaciones de los vertimientos del casco urbano del municipio de Cumbal y de Cuaspud Carlosama y los resultados obtenidos durante las jornadas de monitoreo realizadas los días 2, 3, 4, 5 y 10 de diciembre. (Se adjunta oficio). En cuanto a los compromisos, se realiza el respectivo seguimiento del cumplimiento; Por parte de EMPOBANDO. Presentar informe del proceso de liquidación del proyecto del empate del cribado en captación, construcción de desarenador en bocatoma y ampliación de esta estructura, representante de EMPOBANDO da a conocer el convenio 012/24 cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, económicos y logísticos entre el municipio de Ipiales y EMPOBANDO para la construcción del cana de cribado de bocatoma" y el que tenía como objetivo desarrollar un cribado mecánico, dada la revisión técnica de la nueva administración de EMPOBANDO, se llega a la conclusión por parte del área jurídica y técnica de dar liquidación al convenio. Como alternativa de este proyecto se esta evaluando la alternativa de construir una unidad paralela a las existentes de los desarenadores en zona de bocatoma con la implementación de un cribado																

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 2 de 7

mecánico el cual ya está en fase 1 (formulación del proyecto), se han realizado levantamientos topográficos, prediseños estructurales y gestión de recursos.

Del compromiso; Presentar informe del avance del proceso de acercamiento con comunidad indígena y con CORPONARIÑO para la viabilidad del proyecto de captación punto Carchi- río Blanco y la instalación de las mesas de trabajo y respuesta del requerimiento realizado al Ministerio en cuanto al proceso de consulta previa. Se informa que el proyecto 065/2024 del punto de captación Río Carchi se encuentra suspendido, en cuanto a la ejecución del proyecto se tiene un avance del 70 al 80% en la parte estructural, hidráulica, eléctrica por parte de la consultoría. En cuanto a la solicitud con el Ministerio del Interior; aún no se cuenta con la respuesta del Ministerio, sobre la concertación o consulta previa. Se encuentran en conversación con la mesa mayor del cabildo para reunión con la comunidad para la socialización del proyecto. CORPONARIÑO informa que para el trámite de concesión de aguas, se solicitó gestionar la socialización del proyecto con la comunidad de lo cual ya se presentaron los avances del proceso, por lo cual ya se surtió el trámite de concesión y ya se cuenta con este permiso, en cuanto al trámite de ocupación de cauce, se encuentra suspendido debido a que la comunidad indígena no permitió realizar la visita de inspección en el sitio, por lo cual se debe buscar la concertación de esta visita.

Continuando con el seguimiento se tiene, Adelantar trámite de autorización sanitaria con el IDSN y el trámite de legalización con CORPONARIÑO del punto de captación de agua para consumo humano "Puente nuevo". y remitir la resolución de ampliación de declaratoria de emergencia. Por parte del IDSN ya se cuenta con la viabilidad mediante la autorización sanitaria de agua para consumo humano, se radico en CORPONARIÑO la solicitud de concesión de aguas, el uso que se viene dando de este punto es complementar el agua necesaria para el abastecimiento del municipio de Ipiales, bombeando agua hacia los carrotanques la cual se traslada a los tanques de EMPOBANDO, se realizan análisis de calidad, dosificación de cloro y distribución a la comunidad, informa que el 84% de la ciudad cuenta con abastecimiento de agua con suministro de la red de distribución del acueducto, la cobertura restante que corresponde al sector alto de la ciudad sigue abasteciéndose de agua por carrotanques. Presenta también el Decreto 021/2025, la cual prórroga la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Ipiales, desde el 17 de enero de 2025 hasta el 16 de julio del 2025.

En cuanto a, informar sobre las medidas que se han tomado en cuanto a las conexiones ilegales en la red de distribución, se presenta informe de las conexiones ilegales que se conectan en la red de distribución del acueducto (se anexa informe). Por parte de INVIMA, se solicita que se publique el informe, con el fin que la comunidad conozca que esta situación se esta presentando y sobre las acciones que viene adelantando EMPOBANDO para prevenir y minimizar este escenario y de igual manera dar a conocer las sanciones que se pueden presentar. Sobre el compromiso de informar el resultado de los análisis de la calidad del agua para el Pozo Versalles, del cual se está captando agua para consumo, pero no se ha realizado la legalización del punto ni con el IDSN ni con CORPONARIÑO. Se da a conocer los resultados de los análisis de calidad de agua de diferentes laboratorios respecto a la lista de parámetros objeto de la visita de inspección ocular que se adelantó por IDSN, los cuales se presentaron al IDSN para el trámite de Autorización Sanitaria con lo cual se emite la AS No. 070/2025 donde se concede concepto favorable para el uso de agua para consumo humano previo tratamiento de potabilización propuesto dentro del concepto técnico y que se establece en el numeral 5 de la respectiva autorización para este caso la propuesta de tratamiento contempla pretratamiento, coagulación, sedimentación, filtración rápida, desinfección y estabilización. CORPONARIÑO solicita tramitar el trámite de concesión de aguas, actualmente se están realizando pruebas de bombeo los cuales han sido satisfactorios, el proceso que se viene realizando en las pruebas de bombeo consiste en bombear un caudal aproximado de 5 l/s que está generando el pozo, el agua se está dirigiendo al tanque de balcones de la frontera y de ahí se suministra a los diferentes barrios.

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 3 de 7

La ingeniera Luisa Córdoba del IDSN, informa que el día 24 de abril se realizó la suspensión del bombeo del punto de Versalles al tanque balcones de la frontera debido a que en las muestras que se tomaron se reportaba presencia de coliformes totales en ese tramo de la red y por ser reiterativo esta no conformidad se determinó suspender el bombeo, de igual manera se dio informe a personería de Ipiales, se informa también que los resultados presentados por EMPOBANDO presentan incoherencia con los de vigilancia del IDSN ya que en estos resultados los valores de coliformes son de 0 y las muestras del IDSN presentan valores de 7.5 en tanque balcones y patinódromo de 2.0 con fecha del 20 de abril. Se informa también que se desconoce la razón por la cual se reactivaron las pruebas de bombeo sin autorización del IDSN, toda vez que cuando se suspendieron los bombeos se solicitó a EMPOBANDO presentar el plan de acción frente a esta situación, son 8 muestras en diferentes días y en diferentes puntos que han presentado no conformidades.

En reunión previa de EMPOBANDO y el IDSN se manifestó la inconformidad de la suspensión de estas pruebas de bombeo, con lo cual el IDSN realizara un nuevo muestreo para verificar la eficiencia del tratamiento las cuales se podrían tomar el miércoles 14 de mayo, IDSN solicita a EMPOBANDO tomar muestras microbiológicas a este punto desde el 9 de mayo hasta el 16 de mayo de la red proveniente de tanque balcones, en el laboratorio autorizado de EMPOBANDO y se reporten los resultados preliminares de manera inmediata al IDSN en próxima reunión se dará informe sobre este muestreo y de igual manera presentar informe donde se describan las acciones que se van a realizar en el tanque de balcones, red distribución y cronograma de purgas. Por otra parte, el personero de Ipiales, se informa que se recibió la notificación de la suspensión de los bombeos, e informa también que en diferentes escenarios a puesto en conocimiento a la administración de Ipiales y a EMPOBANDO las consecuencias de poner en operación este pozo, sin tener certeza de la eficiencia del tratamiento. Se deja en claro que el pozo se encuentra en periodo de pruebas, no se puede suministrar agua de este pozo a la comunidad, se permite el uso de la red de distribución única y exclusivamente para mirar el funcionamiento hidráulico y realizar las pruebas. Se solicita por parte del IDSN, de manera urgente realizar comunicados por perifoneo en los barrios afectados sobre las pruebas que se están realizando en diferentes horarios, para que se realicen tratamiento intradomiciliario. (verificar en campo por funcionarios del IDSN).

En relación a los avances del proyecto de la captación en el punto de la Verbena. Por parte de EMPOBANDO se socializan las razones que se tiene para tomar como un punto de captación La Verbena, ya que se encuentra en jurisdicción del municipio de Ipiales, se cuenta con un proceso de consultoría No. 035 de 2025, el avance que se tiene es una caracterización de agua cruda realizada por EMPOPASTO, donde se encuentra que el punto presenta mejores condiciones fisicoquímicas y microbiológicas que el punto de captación donde actualmente esta ubicada la bocatoma de EMPOBANDO, el punto La Verbena se encuentra a una distancia de 11 km aprox. aguas debajo de la bocatoma, por parte de la administración municipal se están consiguiendo los recursos para el proyecto, Se debe adelantar los tramites de autorización sanitaria y concesión de agua para legalizar el punto de captación de la Verbena en el Rio Blanco.

Sobre el informe detallado del avance de las acciones establecidas por EMPOBANDO a fin de cumplir con las recomendaciones realizadas por EMPOPASTO en la visita técnica y las pendientes de la visita de inspección sanitaria realizada por el IDSN. El informe se presentará en próxima reunión incluir mejora de tratamiento para no tener que suspender el suministro de agua a la población.

Por parte de secretaría de ambiente y de agricultura departamental. Presentar avances de la evaluación de información de los predios donde se va a realizar los proyectos de protección y restauración en los municipios de Cumbal y Carlosama e informar los resultados de las visitas técnicas a estos predios y presentar avances del proyecto. Se informa por parte de representantes de la secretaria de ambiente, que la cobertura de los predios es pequeña, el número de hectáreas que se recibió información no cumple con las características de



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 4 de 7

representatividad para la ejecución del proyecto por lo cual se tuvo que liquidar, se recibió información de los predios de los municipios de Cumbal y Carlosama, pero los predios son privados, no se puede realizar inversión, estos predios no pueden ser incluidos dentro del convenio, Ipiales y Aldana enviaron información de predios, pero estos no se pueden incluir en el convenio que estaba vigente, este se tiene que liquidar, los nuevos predios están en estudio para un nuevo proyecto. Cumbal está dentro de un proyecto de Pago por Servicios Ambientales de conservación con 89 hectáreas. Se está analizando formular un nuevo proyecto para inversión de recursos. Se espera que el número de hectáreas de intervención sea suficiente para continuar con el proyecto. Pendiente revisión de la información de los predios del municipio de Ipiales, informar cuales y de qué municipios se van a incluir en la formulación del nuevo proyecto de restauración.

Por parte del municipio de Ipiales. Reportar a la Secretaría de Ambiente Departamental la información sobre los predios priorizados para proyectos de restauración y protección de cuenca, los cuales deben tener influencia directa en las cuencas de Río Blanco y Río Chiquito hasta el 7 de marzo. Se reporta que ya se envió la información, y que se encuentra en evaluación por parte de la secretaria.

Por parte del municipio de Cumbal. Remitir a la secretaria de ambiente Departamental la información de los 79 usuarios que están recibiendo los pagos por servicios ambientales, para realizar el seguimiento desde la secretaria. La información fue enviada por la secretaria al municipio de Cumbal.

Presentar informe en la próxima mesa de las acciones realizadas en el marco de seguimiento y control de las medidas sanitarias a los expendios de cárnicos. Se presenta informe de las acciones realizadas por la Inspección de policía a los expendios, donde menciona que se están llevando a cabo operativos de control en acompañamiento de la dirección de carabineros de la Policía Nacional donde se han realizado decomisos y el levantamiento de las medidas de control, en las visitas algunos se evidencia que algunos establecimientos realizaron el desmantelamiento total del local porque definitivamente van a suspender actividades y en otros se evidencia que se han venido cumpliendo los requerimientos sanitarios, de lo cual los representantes manifiestan que necesitan se realice las visitas de seguimiento para el levantamiento de las medidas por parte del IDSN, de lo cual se les informa que se debe realizar la solicitud oficial al IDSN para programar la visita y realizar el levantamiento de la medida si da lugar, se comenta también que actualmente no se a podido llevar a cabo nuevos operativos en acompañamiento de policía, debido a problemas de orden público, por parte de representantes de policía informan que a la fecha no se tiene autorización de adelantar operativos, queda pendiente el operativo de control en la plaza de mercado. Se enviarán nuevas solicitudes para la respuesta afirmativa desde la dirección de carabineros.

En cuanto a presentar un informe detallado sobre las medidas de manejo y operación que se han venido realizando en la PTAR del sector Cuace. Se realizo una disposición adecuada de los lodos de la PTAR, se da a conocer el funcionamiento mediante pozos o isotanques para el manejo de lodos, con la incorporación de material filtrante grava y arena, mediante un sistema de drenaje y tubería de presión para la salida del agua tratada, se inició operación a finales del mes de abril, está pendiente que CORPONARIÑO, realice la visita de seguimiento y el reporte en las próximas mesas de los procesos operativos por parte de la Alcaldía de Cumbal. Y en cuanto la consultoría del plan maestro de alcantarillado se debe presentar en la próxima mesa el equipo consultor que se eligió para este proceso.

Por parte de CORPONARIÑO. Complementar el estudio de monitoreo del Rio Blanco y sus afluentes con un estudio de modelación donde se logre determinar un escenario real teniendo en cuenta los vertimientos generados a la fuente y las condiciones actuales y futuras del cuerpo hídrico, dentro del oficio que se envió por parte de CORPONARIÑO, se da claridad al alcance de este compromiso y la posición de la Corporación

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 5 de 7

frente a este estudio. En cuanto a presentar el plan de monitoreo donde se identifique puntos de monitoreo priorizados, metodología de muestreo y cronograma, se presenta la planeación del monitoreo para las fuentes Chiquito, Cauce y Blanco, con muestreo compuesto y los puntos de descargas de aguas residuales compuesto de 10 horas.

Por último, se solicita a los representantes de la procuraduría, informar sobre las acciones que se han venido adelantando como entes de control, dentro de sus competencias, desde la compulsión de copias para adelantar los respectivos procesos, por parte de la procuraduría provincial de Ipiales, informa que se han adelantado 2 procesos tendientes a mejorar la calidad del recurso hídrico y al seguimiento del cumplimiento de las acciones y compromisos que se han asumido en las diferentes sesiones, dentro del contexto disciplinario no se han aperturado procesos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se propone mesa de seguimiento para el día 18 de julio en la ciudad de Pasto.

Nota: Adjunto listado de asistencia y actos administrativos de delegación y demás documentos de evidencias.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha			Observaciones
		Día	Mes	Año	
Por parte de EMPOBANDO, Adelantar tramite de legalización de concesión de aguas del pozo Versailles. Toma de muestras microbiológicas al pozo Versailles desde el 9 de mayo hasta el 16 de mayo de la red proveniente de tanque balcones, en el laboratorio autorizado de EMPOOBANDO y reportar los resultados preliminares de manera inmediata al IDSN. Presentar informe del plan de acción que se va a implementa en el tanque de balcones de la frontera red distribución y cronograma de purgas. Realizar comunicados por perifoneo en los barrios afectados sobre las pruebas de bombeo que se están realizando en diferentes horarios, para que se realicen	EMPOBANDO				

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 6 de 7

tratamiento intradomiciliario al agua. (verificar en campo por funcionarios del IDSN).					
Presentar informe detallado del avance de las acciones establecidas por EMPOOBANDO a fin de cumplir con las recomendaciones realizadas por EMPOPASTO en la visita técnica y las pendientes de la visita de inspección sanitaria realizada por el IDSN. El informe se presentará en la próxima reunión y también incluir mejora de tratamiento para no tener que suspender el suministro de agua a la población.					
Por parte de secretaria de ambiente y de agricultura departamental. Presentar informe sobre la revisión de la información de los predios del municipio de Ipiales, informar cuales y de qué municipios se van a incluir en la formulación del nuevo proyecto de restauración.	SECRETARIA DE AMBIENTE Y SECRETARIA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL.				
Por parte del municipio de Cumbal. reporte en las próximas mesas de los procesos operativos por parte de la Alcaldía de Cumbal. Presentar el equipo consultor que se eligió para el proceso del plan maestro de alcantarillado.	MUNICIPIO DE CUMBAL				
Por parte de CORPONARIÑO. Realizar la visita de seguimiento a la planta de tratamiento de Aguas residuales del sector Cuace.	CORPONARIÑO				



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 7 de 7

Convocatoria Próxima reunión

	Lugar: IDSN	Hora Inicio: 09:00 AM	Fecha:	Día	Mes	Año
				17	07	2025
Responsable Elaboración		Firma		Fecha		
JHONNY TOBAR VALLEJO Programa vigilancia de calidad de agua				Día	Mes	Año

SEGUIMIENTO

Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	
Responsable de realizar el Seguimiento:					
Firma:					

Calle 15 No. 18

REGISTRO DE ASISTENCIA TECNICA A EVENTOS EXTERNOS																							
CODIGO: F-PATSSP01-03				VERSION: 02										FECHA: 22-09-2017									
Nombre del evento: COTSA - RIO BLANCO				CARACTERIZACION POBLACIONAL (por favor marque con una X)										Facilitador (a):		Lugar: INVINA		N° Horas:					
Documento de identificación	Nombre completo del participante (Letra legible)	Institución	Municipio	GENERO		EDAD				Grupo étnico				Discapacidad		Victima de conflicto		LGBTI		Cargo	Teléfono o Celular	Correo Electrónico	Día: 09/05/2025
				F	M	0-12	13-27	28-65	65 y mayor	Ninguno	Afro	Indígena	ROM	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
5005006	Lito Ortiz M.	Corporación	Pasto	✓				✓		✓				✓		✓		✓		Prof. Univer	321662204	rhidric@comail.com	
108526137	Jhon Usman	PGM	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	3113734108	Jhon-Usman@comail.com	
108532635	Buben Enriquez	Ponal	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	320301103	Buben-Enr@comail.com	
108527260	Darlin Andrade	Corporación	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	321374123	darling@comail.com	
108532763	Jean Paz	Corporación	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	318689467	Seixos@comail.com	
27254231	Ana Botera	Corporación	Ipiales	X			X							X		X		X		Perseu@comail.com	315582467		
108527214	Jhon Casanova	Corporación	Ipiales	X			X	X						X		X		X		P. Universidad	313722362	Jhonncas@comail.com	
100941169	David A Ruiz	Corporación	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	313690000	ruizdavid@comail.com	
108510748	Angie C. Mora	Corporación	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	3182031269	mora@comail.com	
108532933	Yesica Eraso	Corporación	Pasto	X			X	X						X						Contratista	3116162626	eraso@comail.com	
108526363	Diego Muñoz V.	Corporación	Pasto	X			X	X						X	X			X		Contratista	318424049	munozdiego@comail.com	
108547780	Luis Carlos	PDA	Pasto	X			X	X						X	X			✓		Contratista	3137828711	luis@comail.com	
108589411	Ricardo Rivas	SSA	Ipiales	X			X	X						X		X		X		Contratista	315417666	ricardo@comail.com	
37001694	Martha Narvaiz	Procuraduría	Pasto				X													Procuraduría	3006106435	martha@comail.com	
1306393	María Corral	PGN	Ipiales	X			X	X						X		X		X		Procuraduría	3152414008	maria@comail.com	
108525619	Ricardo Alvarado	P.G.N.	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	301290201	alvarado@comail.com	
108531205	Diego Alvarado	SAOS	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	321944441	diego@comail.com	
108531211	David Benavides	SAOS	Cusapal	X			X							X		X		X		Contratista	316344412	benavides@comail.com	
108531211	Juan Alexander	OAGRO	Pasto	X			X	X						X		X		X		Contratista	317863444	alexander@comail.com	
108531211	Diego Alvarado	OAGRO	Pasto	✓			✓	✓						✓		✓		✓		Contratista	3132266450	diego@comail.com	

REGISTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA A EVENTOS EXTERNOS																										
CODIGO: F-PATSSP01-03										VERSIÓN: 02					FECHA: 22-09-2017											
Tema del evento:				CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL (por favor marque con una X)										Facilitador (a):		Lugar:		N° Horas:								
Documento Identificación	Nombre completo del participante (Letra legible)	Institución	Municipio	GÉNERO		EDAD					Grupo étnico				Discapacidad		Victima de conflicto		LGBTI		Cargo	Teléfono o Celular	Correo Electrónico	Día:	Firma por Jornada	
				F	M	0-12	13-27	28-65	mayor	Ninguno	afro	Indígena	ROM	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Mañana					Tarde	
168859169	Carlos Ayala	Cooperativa	Cumbal		X		X					X			X		X				Ambarlat	3114152133	Carlos Ayala	09/09/2017		
5922651	Diana Montano	IPSA	Ipiales	X			X		X						X		X				3106277839	dianamontano				
108897992	Leidy Ceron	IPSA	Pasto	X			X		X												3122497921	leidyceeron				
2709121	Angela Villota	SAES	Pasto	X			X		X					X		X		X			3218152688	angvillota				
1307321	Christian Arce	IPSA	Ipiales																		3126497926	carce				
59176929	Ligia Valenzuela	Cooperativa	Cumbal	X			X				X			X		X		X			3147602897	ligiavalenzuela				
11309818	Heider Suarez Pizarro	Superando	Ipiales	X			X	X						X		X		X			3172768203	heider4630				
103897283	John Albal	Cumbal	Cumbal	X			X							X		X		X			32064458	johnalbal				

Responsable del evento:		Cargo:										Subdirección u Oficina:										Firma:	
-------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--


COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE

Cumbal

Inspección De Policía




Información de establecimientos expendidos de carne con medida sanitaria de seguridad.



NOMBRE DELESTABELCIMENTO: FAMA DON PEDROCL 18 # 18 00




NOMBRE DELESTABLECIMIENTO: FAMA LA SABANA CR 11 CL 18

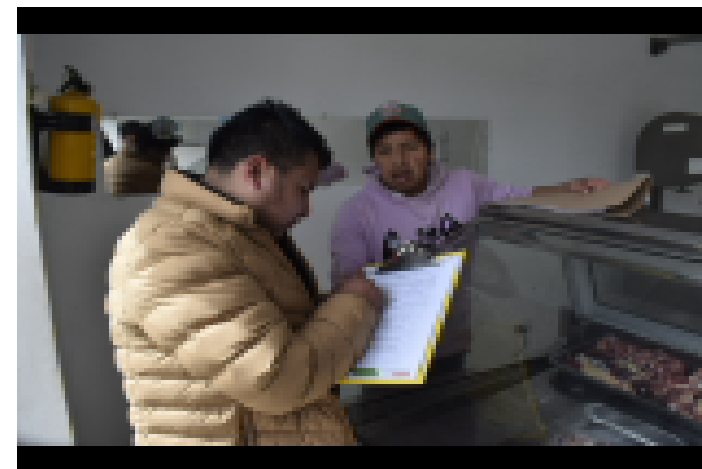




NOMBRE DELESTABLAMIENTO: FAMA LA OCTAVA CR 8 # 17 25



NOMBRE DELESTABELCIMENTO: SURTICARNEFAMA BR. LLORENTE

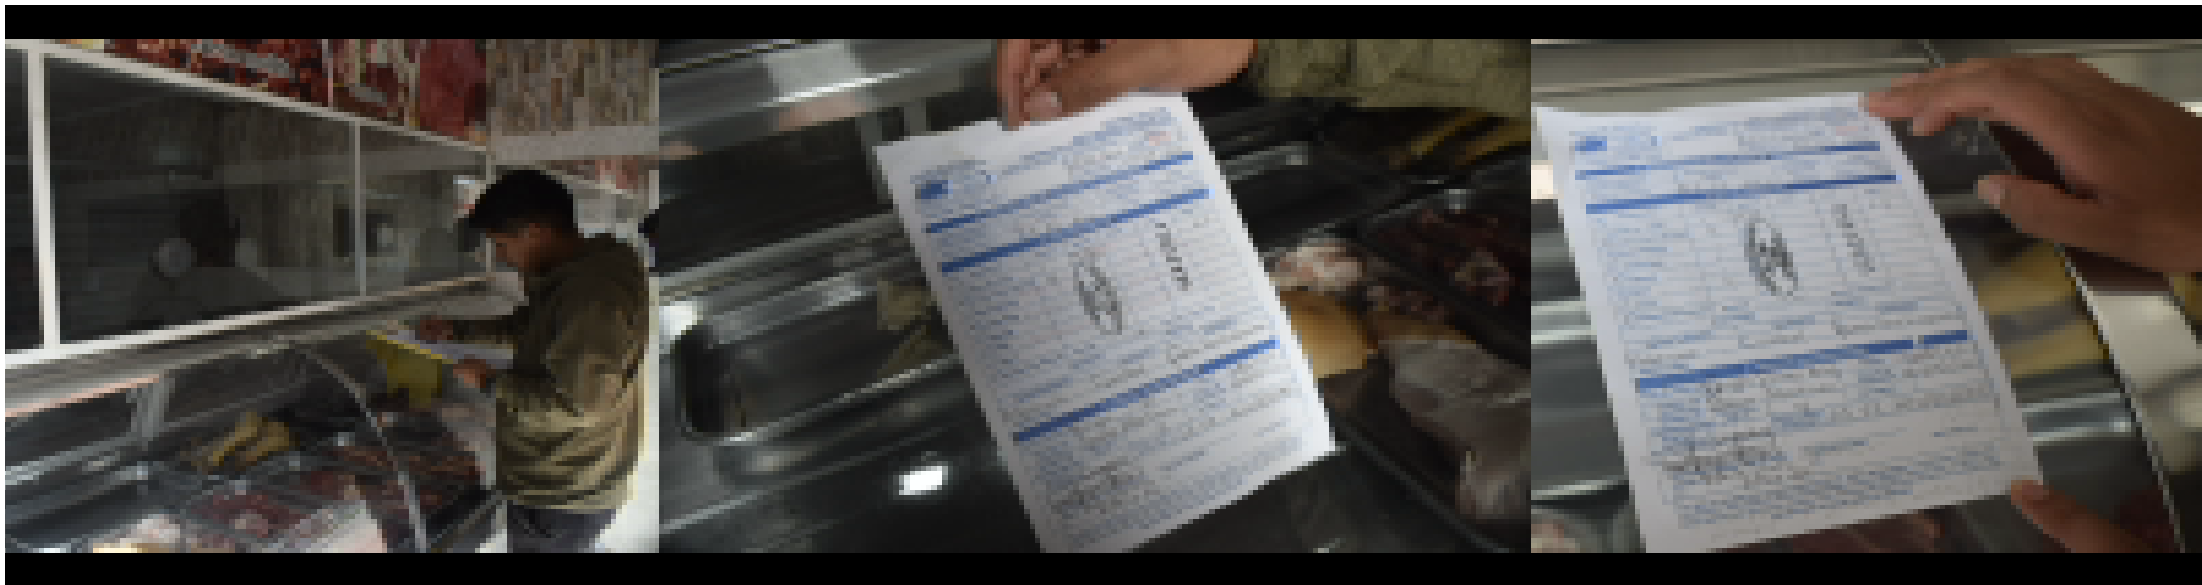

NOMBRE DELESTABLECIMIENTO: SEVILLANERA. BR. BR LOS PRADOS

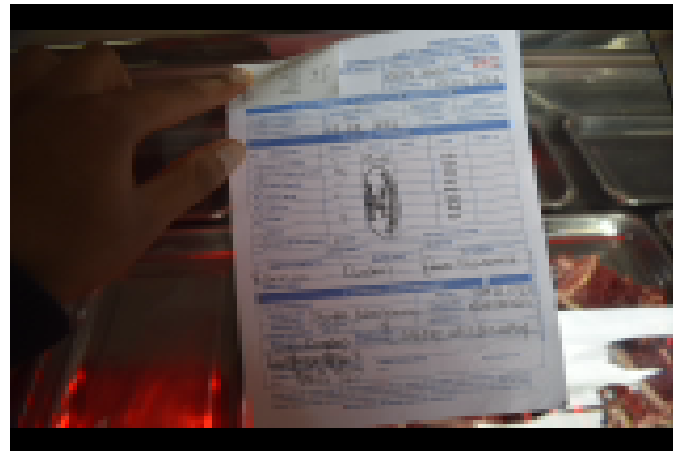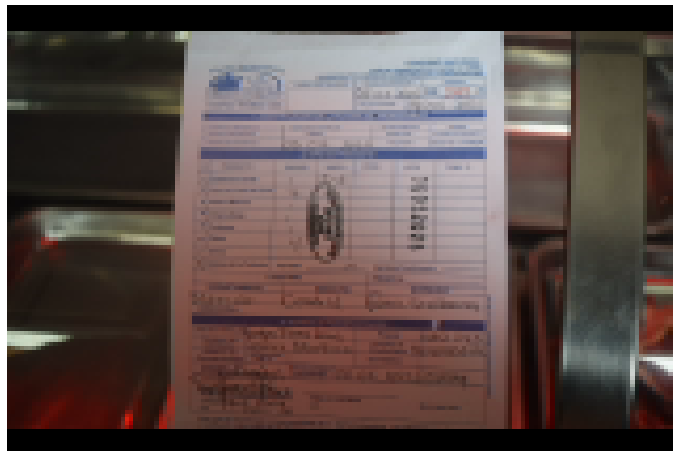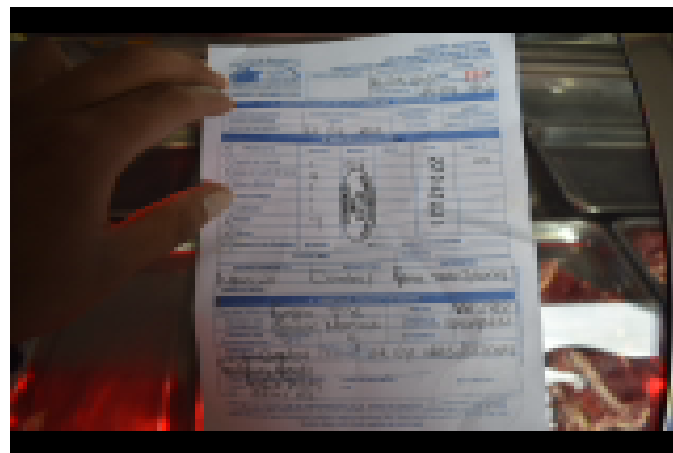

NOMBRE DELESTABLECIMIENTO: TERCENA SANANTONIO. VÍA CEMENTERIO





ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Cumbal



República de Colombia
Departamento de Nariño
Municipio de Cumbal
Nit: 800099066-3



CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO PARA EL VERTIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO GUAN CARRETERA DEL MUNICIPIO DE CUMBAL

Proceso constructivo



Ilustración 1. Formación de plan



Ilustración 2. Instalación de cubierta



Ilustración 3. Instalación polietileno negro



Ilustración 4. Instalación de 10 isotanques



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Cumbal



República de Colombia
Departamento de Nariño
Municipio de Cumbal
Nit: 800099066-3

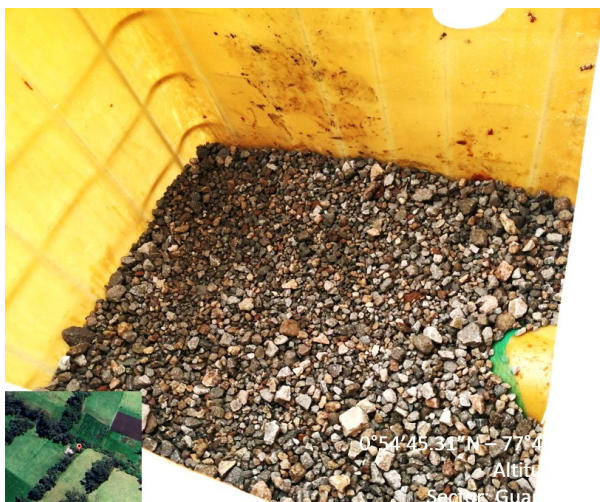


Ilustración 5. Instalación de material filtrante



Ilustración 6. Instalación de geotextil



Ilustración 7. Instalación de tubería de drenaje y bomba de impulsión de lodos





ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Cumbal



República de Colombia
Departamento de Nariño
Municipio de Cumbal
Nit: 800099066-3



Inicio de limpieza y operación



Ilustración 8. Limpieza de la Ptar 26 de abril del 2025



Ilustración 9. Lechos de secado operativos a fecha 26 de abril 2024





CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA 2025

Cronograma de limpieza Ptar Cauce	Cronograma de limpieza para el año 2025												
	26- abr	17- may	7- jun	28- jun	19- jul	9- ago	30- ago	20- sep	11- oct	1- nov	22- nov	13- dic	27- dic
1 limpieza y retiro de lodos													
2 limpieza y retiro de lodos													
3 limpieza y retiro de lodos													
4 limpieza y retiro de lodos													
5 limpieza y retiro de lodos													
6 limpieza y retiro de lodos													
7 limpieza y retiro de lodos													
8 limpieza y retiro de lodos													
9 limpieza y retiro de lodos													
10 limpieza y retiro de lodos													
11 limpieza y retiro de lodos													
12 limpieza y retiro de lodos													
13 limpieza y retiro de lodos													

110

San Juan de Pasto, 07 de mayo de 2025

Señores:

MESA TECNICA DE AGUAS – CONTAMINACIÓN RÍO BLANCO

Comité Territorial de Salud Ambiental – COTSA

luisafernandacordoba@idsn.gov.co

Ref: Aclaración de compromisos adquiridos en la mesa técnica de aguas – contaminación de río Blanco llevada a cabo el día 21 de marzo de 2025.

Respetados integrantes de la Mesa Técnica de Aguas.

Desde la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental (SUBCEA) de CORPONARIÑO, solicito respetuosamente que se aclaren los compromisos plasmados en el acta de reunión del día 21 de marzo de 2025, esto teniendo en cuenta que los representantes de Corponariño, allí presentes, hicieron hincapié en que no tenían la potestad de comprometer a la entidad.

Sin embargo, en el marco de la colaboración interinstitucional, que en este caso persigue coadyuvar en la solución de la problemática ambiental tratada en esta mesa, la corporación ha realizado un análisis profundo y ha determinado aunar esfuerzos para implementar un modelo de calidad del agua correspondiente a un escenario base o actual, que refleje las condiciones reales del río Blanco a partir de datos observados de caudal, información teórica relacionada con caracterizaciones de los vertimientos del casco urbano del municipio de Cumbal y de Cuaspud Carlosama y los resultados obtenidos durante las jornadas de monitoreo realizadas los días 2, 3, 4, 5 y 10 de diciembre. Cabe resaltar que, hasta la fecha el análisis de la calidad del agua en el río Blanco se ha desarrollado únicamente a partir de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos en las jornadas de monitoreo que se realizaron en la fuente hídrica, sin abordajes complementarios como el monitoreo a las principales descargas de aguas residuales domésticas y no domésticas que se requieren para establecer escenarios múltiples. Por tal motivo, el modelo se enfocará en este escenario base, el cual será calibrado y validado técnicamente, y servirá como línea base para futuros análisis o simulaciones bajo distintas condiciones ambientales o de carga contaminante. El tiempo para el desarrollo de esta actividad se estima en aproximadamente tres meses.

Adicionalmente, en cuanto al compromiso de realizar una mesa técnica conjunta con la participación de EMPOBANDO, el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) y demás entidades involucradas para revisar las condiciones del agua cruda en el punto de captación de EMPOBANDO y el proyecto de monitoreo 2025, nos permitimos aclarar

que, por una parte EMPOBANDO solicitó una mesa técnica para discutir el plan de monitoreo de CORPONARIÑO y por otra parte, que no es competencia de esta mesa técnica, revisar el proyecto de monitoreo de la Autoridad Ambiental de Nariño – CORPONARIÑO; aun así, el pasado 21 de abril del presente año, el equipo técnico de monitoreo de la oficina de Recurso Hídrico adscrito a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, socializó con EMPOBANDO el plan de monitoreo de la red hídrica de Río Blanco 2025 y adicionalmente será presentado en la próxima mesa técnica, programada para el día 9 de mayo.

Agradezco su atención y colaboración y quedo atento a la modificación de la mencionada acta.

Cordialmente,



GERMAN BASTIDAS

Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental (E)

SUBCEA

CORPONARIÑO

Proyecto: David R.

Reviso: Lucia O.

Aprobó: Lucia O.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: MESA TECNICA DE AGUAS - COTSA

1ª Copia: SUBCEA

2ª Copia: Archivo Central
